

IMPLEMENTATIEPLAN FLEXIBELE PREMIEREGELING



Datum: 3 maart 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Inleiding	6
2 Projectgovernance en besluitvorming	7
2.1 Betrokken gremia inzake besluitvorming rondom de Wtp	7
2.1.1 Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF)	7
2.1.2 Deelnemersvereniging Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (DPF).....	7
2.1.3 Verantwoordingsorgaan (VO).....	7
2.1.4 Intern toezicht: visitatiecommissie (VC).....	8
2.1.5 Sleutelfunctiehouders (SFH's)	8
2.2 Projectorganisatie	9
2.2.1 SPF	9
2.2.2 Achmea Pensioenservices	9
2.2.3 Achmea Investment Management	11
2.3 Voorbereidings- en besluitvormingsproces	12
2.3.1 Gerealiseerde mijlpalen.....	12
2.3.2 Vervolgstappen tot aan de transitie.....	13
2.4 Oordelen en adviezen van betrokken gremia inzake besluitvorming rondom de Wtp	15
2.4.1 Verantwoordingsorgaan (VO).....	15
2.4.2 Visitatiecommissie (VC)	16
2.4.3 Sleutelfunctiehouders (SFH's)	17
2.5 Besluitvormingsproces vaststelling implementatieplan	18
3 Risico's en beheersmaatregelen	20
3.1 Periodieke risicoanalyses als onderdeel van het integraal risicomanagement	20
3.1.1 Toelichting risicoscores	20
3.1.2 Proces totstandkoming risicoanalyse NPC	20
3.1.3 Risicoanalyse NPC als onderdeel van het integraal risicomanagement van SPF.....	20
3.2 Operationele, financiële, uitbestedings- en IT-risico's.....	22
3.2.1 Overschrijding van het budget (risico 6a risicoanalyse NPC)	22
3.2.2 Doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering en informatie voorziening (risico 6b risicoanalyse NPC)	23
3.2.3 Migratie naar het nieuwe IT-platform bij Achmea Pensioenservices (APS) (risico 9 risicoanalyse NPC)	23
3.2.4 De pensioenaanspraken en -rechten kunnen niet of worden niet correct toebedeeld aan de deelnemer (risico 10 risicoanalyse NPC)	25

3.2.5	Key person risk: Capaciteit ondersteuning (intern / extern) (risico 5 risicoanalyse NPC)	25
3.2.6	Fluctuaties in de financiële situatie van SPF en/of de rente leiden tot nieuwe berekeningen (risico 14 risicoanalyse NPC)	26
3.3	Omgevingsrisico's en reputatie risico's	27
3.3.1	Draagvlak bij de achterban komt zwaar onder druk (risico 1 risicoanalyse NPC)	27
3.3.2	Communicatie aan deelnemers is niet adequaat (risico 2 risicoanalyse NPC)	28
3.3.3	Langere doorlooptijd van het wetgevingstraject en/of tussentijdse inhoudelijke veranderingen in de voorgenomen wetgeving (risico 3 in risicoanalyse NPC)	29
3.3.4	Onvoldoende doorlooptijd of een niet volledig besluitvormingsproces voor DPF, fondsorganen en sleutelfunctiehouders (risico 4 in risicoanalyse NPC)	29
3.3.5	Het risico dat de afstemming over de transitie met de toezichthouders stroef verloopt (risico 13 risicoanalyse NPC)	30
3.4	Juridische en privacy risico's	30
3.4.1	De deelnemer start een juridische procedure in verband met de overgang naar de nieuwe pensioenregeling (risico 7 risicoanalyse NPC)	31
3.4.2	Tijdens de procedure op weg naar het nieuwe pensioencontract is sprake van onzorgvuldige besluitvorming (risico 8 in risicoanalyse NPC)	31
3.5	Vermogensbeheer risico's	32
3.5.1	Het beleggingsbeleid wordt niet goed en/of tijdig omgezet naar de eisen van de nieuwe pensioenregeling (risico 11 in risicoanalyse NPC)	32
3.5.2	Het risico dat de administratie van de portefeuilles en het beheer van de portefeuilles niet correct gebeurt en de rapportages niet correct zijn (risico 12 risicoanalyse NPC)	33
3.6	Periodiek oordeel bestuur, sleutelfunctiehouder risicobeheer en intern toezicht	34
4	Oordeel op technische uitvoerbaarheid	35
4.1	Wijziging uitvoering	35
4.1.1	Belangrijkste wijzigingen in de taken en verantwoordelijkheden van de pensioenuitvoerder en partijen in de vermogensbeheerketen	35
4.1.2	Continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening	39
4.1.3	Wijzigingen in de belangrijkste bedrijfsprocessen van APS	41
4.1.4	Wijzigingen in de governance	41
4.1.5	Wijzigingen in de kostenstructuur	41
4.2	Haalbaarheidsanalyse	43
4.2.1	Haalbaarheid uitvoerbaarheid regeling DPF	44
4.2.2	Haalbaarheidscriteria technische uitvoerbaarheid van de regeling door APS	49
4.2.3	Haalbaarheidscriteria technische uitvoerbaarheid van de regeling door Achmea IM	53
4.3	Conclusie bestuur naar aanleiding van de haalbaarheidsanalyse	56
4.4	Kritieke uitbestedingen en onderuitbestedingsrelaties	56
5	Datakwaliteit	58

5.1	Fase 1 - Opzet datakwaliteit	58
5.2	Fase 2 - Risico-inventarisatie en -beoordeling	59
5.3	Fase 3 - Data-analyses en deelwaarnemingen & Fase 4 – Rapportage en beoordeling	61
5.4	Fase 4 - Rapportage	62
5.5	Fase 5 - Verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden door de externe accountant/externe IT-auditor	63
5.6	Beschikbaarheid van data	63
5.7	Definitieve besluitvorming	63
5.8	Stay clean maatregelen datakwaliteit	64
5.9	Kader Datakwaliteit – Toetsmoment 1 en 2	65
6	Invaren	66
6.1	Tijdelijk geruisloos invaren	66
6.2	Standaardmethode met spreidingsperiode 10 jaar	66
6.3	Het invaarproces	67
6.3.1	Het invaarproces in de pensioenadministratie	67
6.3.2	Invaarberekeningen in ACE	69
6.4	Minimaal eigen vermogen, operationele reserve en risicodelingsreserve	69
6.4.1	Minimaal vereist eigen vermogen	69
6.4.2	Operationele reserve	70
6.4.3	Risicodelingsreserve	70
6.5	Premievrije voortzetting en nabestaandenpensioen	71
6.5.1	Premievrije voortzetting bij invaliditeit (PVI)	71
6.5.2	Nabestaandenpensioen	71
6.5.3	Wezenpensioen	71
6.6	Uitgangspunten overgang naar het nieuwe stelsel	72
6.7	Doelstellingen, maatstaven en bandbreedtes	72
6.7.1	Doelstellingen	73
6.7.2	Maatstaven	74
6.7.3	Bandbreedtes	76
6.8	Evenwichtigheidskader	79
6.9	Conclusie met betrekking tot de totale evenwichtigheid van de transitie	81
6.10	Transitie FTK	82
7	Transitieplan	83
7.1	Besluitvormingsproces transitieplan	83
7.2	Projectierendement	83
7.3	Collectief Variabel Pensioen	83

7.4	Spreidingsperiode en hoogte risicodelingsreserve	84
7.5	Invaren.....	85
7.6	Wijze van vaststelling evenwichtigheid transitieplan	86
7.7	Wijze van vaststelling uitvoerbaarheid transitieplan	86
7.8	Financiële grenzen transitieplan	86

1 Inleiding

Dit document betreft het Implementatieplan zoals bedoeld in artikel 150i van de Wet toekomst pensioenen. In dit plan legt Stichting Pensioenfonds Fysiotherapeuten (SPF) vast op welke wijze SPF:

1. de voorbereidingen heeft getroffen voor de uitvoering van de gewijzigde pensioenovereenkomst;
2. invulling geeft aan de uitvoering van de gewijzigde pensioenovereenkomst;
3. zal omgaan met opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten.

SPF kent twee regelingen: de basisregeling en de basisplusregeling. Omdat beide regelingen behoren tot één financieel geheel strekt dit implementatieplan zich uit tot beide regelingen.

Dit plan moet in samenhang met het transitieplan van Deelnemersvereniging Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (DPF) zoals bedoeld in artikel 145c Wvb worden gelezen. Onderstaand figuur geeft aan hoe SPF de samenhang ziet tussen het Implementatieplan en overige plannen die worden opgesteld in het kader van de transitie naar de Wet toekomst pensioenen (Wtp):

Samenhang tussen de plannen

Het Migratieplan APS, Vermogenstransitieplan AIM, Transitieplan DNB, Implementatieplan DNB en Communicatieplan AFM



Figuur 1

2 Projectgovernance en besluitvorming

2.1 Betrokken gremia inzake besluitvorming rondom de Wtp

Het bestuur is het hoogste orgaan binnen het pensioenfonds. Het bestuur van SPF neemt besluiten en bepaalt het (toekomstig) beleid. Onderstaand licht SPF toe welke organen een rol hebben gespeeld in het besluitvormingsproces.

2.1.1 Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF)

SPF is een beroepspensioenfonds dat vanuit de beroepsgroep zelf is ontstaan en is opgericht op 9 oktober 1973 en is aangesloten bij de Pensioenfederatie. SPF voert de pensioenregeling uit die op verzoek van de beroepsvereniging DPF door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht is gesteld. De taken en verantwoordelijkheden van (het bestuur van) SPF zijn vastgelegd in de statuten van SPF en de uitvoering van de regeling is vastgelegd in reglementen.

Het pensioenfonds SPF:

- is uitvoerder van de regeling;
- besluit over de opdrachtaanvaarding;
- bepaalt de risicohouding;
- stelt beleidsuitgangspunten vast;
- stelt het beleggingsbeleid vast;
- stelt het communicatiebeleid vast en
- stelt het implementatieplan op.

2.1.2 Deelnemersvereniging Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (DPF)

Sinds eind 2006 is er ook een beroepspensioenvereniging, DPF. Dit is géén orgaan van SPF, maar een zelfstandige stichting. De taken van DPF betreffen:

1. verantwoordelijkheid dragen voor het aanvragen van de verplichtstelling van de beroepspensioenregeling bij het ministerie van Sociale Zaken (dit impliceert draagvlak onder de deelnemers creëren voor de verplichtstelling van de pensioenregeling);
2. de inhoud van de pensioenregeling vaststellen;
3. formeel opdracht geven aan SPF om de pensioenregeling uit te voeren.

DPF bepaalt dus de hoofdlijnen van de pensioenregeling en wie deze regeling uitvoert. DPF heeft in aanloop naar het nieuwe stelsel in 2021 bepaald dat SPF ook in het nieuwe stelsel de pensioenregeling uitvoert.

De beroepspensioenvereniging DPF:

- is eigenaar van de regeling;
- is opdrachtgever;
- bepaalt de hoofdlijnen van een regeling;
- bepaalt het ambitieniveau;
- doet het verzoek tot invaren (indien van toepassing) en
- stelt het transitieplan op.

2.1.3 Verantwoordingsorgaan (VO)

Het VO is een gremium van SPF. Het VO heeft enkele adviesrechten met betrekking tot de transitie naar het nieuwe stelsel:

1. adviesrecht over de voorgenomen collectieve waardeoverdracht met inbegrip van het aanwenden van het vermogen van het pensioenfonds bij de collectieve waardeoverdracht;

2. adviesrecht ten aanzien van het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
3. bij besluit om gebruik te maken van transitie-FTK, een (jaarlijks terugkerend) adviesrecht ten aanzien van het overbruggingsplan;
4. overleg inzake de resultaten van het risicobereidheidsonderzoek;
5. overleg inzake vaststelling van doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding;
6. optioneel: Informatie, indien er geen verzoek tot invaren aan het pensioenfonds wordt gedaan;
7. optioneel: Adviesrecht bij invaren met een dekkingsgraad lager dan 105%, waarbij 5% van het vermogen wordt aangewend voor de initiële vulling van een solidariteitsreserve of risicodelingsreserve of de compensatie.

Gezien de genomen besluiten zijn adviesrecht 3, 6 en 7 niet van toepassing.

Het VO wordt sinds mei 2022 begeleid door een eigen adviseur, de heer R. Kruijff AAG. Het VO is doorlopend in staat gesteld om vragen te stellen aan het bestuur en ook om de antwoorden daarop te laten wege door de eigen adviseur.

De besturen van SPF en DPF en het VO zijn vanaf 2021 samen opgetrokken in het proces, met respect voor eenieders rollen. Het doel daarvan was om ervoor te zorgen dat ieders kennis op voldoende niveau was om hun rol uit te kunnen oefenen en voldoende countervailing power te kunnen bieden.

2.1.4 Intern toezicht: visitatiecommissie (VC)

Het intern toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. SPF heeft het intern toezicht ingericht middels een visitatiecommissie (VC). Bij het uitoefenen van de bestaande bevoegdheid om toezicht te houden op evenwichtige belangenafweging moet de VC, uitdrukkelijk en gemotiveerd een oordeel vellen over de besluitvorming en evenwichtige belangenafweging door het pensioenfondsbestuur bij de transitie. Ook houdt de VC toezicht op de voorgenomen interne collectieve waardeoverdracht met inbegrip van het aanwenden van het vermogen en legt hierover verantwoording af in het bestuursverslag.

2.1.5 Sleutelfunctiehouders (SFH's)

De rol van sleutelfunctiehouders is vastgelegd in artikel 138a en artikel 46b eerste lid, sub a van de Wvb en in artikel 18 Besluit Ftk dat gaat over beheerste bedrijfsvoering en artikel 22c Besluit Ftk dat gaat over de uitgangspunten van sleutelfuncties.

De sleutelfunctiehouder risicobeheer (SFH RB) monitort de risico's gedurende het gehele traject, zowel het besluitvormings- als het implementatietraject en schrijft opinies bij de belangrijkste mijlpalen van de transitie. De SFH RB woont de bestuursvergaderingen bij. Waar nodig heeft hij ter tafel zijn bevindingen aangegeven. De SFH risicobeheer heeft in zijn kwartaalrapportages ook de risico's rondom de transitie meegenomen. De periodieke update van de haalbaarheidsanalyse is in bestuursvergaderingen besproken waarbij hij zijn mening heeft gegeven.

De sleutelfunctiehouder internal audit (SFH IA) geeft een oordeel over het datakwaliteitsbeleid en het onderzoek daarnaar en over de risicoanalyse. De SFH IA is bij de meeste bestuursvergaderingen aanwezig.

De sleutelfunctiehouder actuariel (SFH AC) geeft een oordeel over de risicohouding, over het evenwichtigheidskader, over de plausibiliteit van de invaarberekeningen en over het invaarproces, alsmede de uitkomsten daarvan. De SFH AC krijgt alle benodigde informatie en woont waar nodig bestuursvergaderingen bij.

2.2 Projectorganisatie

2.2.1 SPF

SPF heeft een projectorganisatie ingericht, bestaande uit een stuurgroep met daaronder een aantal werkgroepen. De coördinatie en regie wordt gevoerd door Doreth van den Heuvel, voorzitter SPF, samen met Karen Castelijns, bestuursadviseur.

De stuurgroep bepaalt op hoofdlijnen de inhoud voor de verschillende stappen in het project. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

1. Doreth van den Heuvel, voorzitter SPF;
2. Jan Poen, voorzitter DPF;
3. Peter Harts, bestuursadviseur van DPF, werkzaam bij APS;
4. Karen Castelijns / Bert Pol, bestuursadviseurs SPF, werkzaam bij APS;

Daarbij maakt de stuurgroep gebruik van de ondersteuning van de volgende adviseurs:

5. Rob Schilder / Jelle de Bruijn, actuarissen, werkzaam bij WTW;
6. Agnes Joseph / Lieke Werner / Sven Klijnhout, actuarissen, werkzaam bij APS.

De stuurgroep stuurt drie werkgroepen aan:

1. *Werkgroep Regeling*

Deze bestaat uit het Dagelijks Bestuur van SPF (Doreth van den Heuvel en Ben de Berg), aangevuld met Josine Stammen (bestuurslid van SPF en lid van de communicatiecommissie), de leden onder 4 van de stuurgroep en de adviseurs van de stuurgroep onder 6 en waar nodig de adviseurs van de stuurgroep onder 5. De Werkgroep Regeling heeft als taak de voorbereiding van de besluitvorming op hoofdlijnen rondom de opzet van de nieuwe regeling. Besluitvorming daarvan ligt te allen tijde bij het bestuur. De uitwerking van de uitvoering is gemandateerd aan de Werkgroep Regeling.

2. *Werkgroep Beleggingen*

Deze bestaat uit de leden van de Beleggingsadviescommissie (BAC) en de externe voorzitter van de BAC. Deze werkgroep wordt waar nodig ondersteund door deskundigen van Achmea Investment Management (Achmea IM) en de adviseurs van de stuurgroep onder 5 en 6. De Werkgroep Beleggingen heeft tot taak de voorbereiding van het vermogensbeheer na de transitie in aansluiting bij het RBO en het voorbereiden van besluitvorming over het vermogensbeheer in aanloop naar en tijdens de transitie.

3. *Werkgroep Risico*

Deze bestaat uit de leden en de toehoorder van de Governance, Risk en Compliance commissie (GRC), de SFH risicobeheer en een bestuursadviseur van APS. De Werkgroep Risico heeft als taak het bewaken en monitoren van de risico's voor, tijdens en na de transitie.

2.2.2 Achmea Pensioenservices

APS heeft een eigen projectorganisatie ingericht. Deze projectorganisatie wordt beschreven in het Migratieplan van APS en bestaat uit een stuurgroep en vijf werkstromen. In de werkstromen van het APS Wtp programma vinden activiteiten plaats voor het realiseren van de vastgestelde mijlpalen. De Transitimanagers APS, onderdeel van het Project Management Office (PMO) sturen de werkstromen aan op een tijdige realisatie van de benodigde producten voor SPF uit de diverse

werkstromen. Dit wordt geregistreerd op basis van het Migratiedraaiboek waarin de uit te voeren activiteiten staan beschreven en gepland om tot een succesvolle Transitie te komen voor SPF.

Overlegstructuur

De afstemming tussen APS en SPF vindt plaats middels maandelijkse stuurgroep c.q. transitieoverleg. In deze overleggen zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

- SPF via het Dagelijkse Bestuur: Doreth van den Heuvel, Ben de Berg. Hiernaast zijn de bestuursadviseurs Bert Pol en Karen Castelijns aanwezig.
- APS via Ivo Brand, Transitie manager APS en Helma den Biggelaar, Accountmanager SPF vanuit APS.

Afhankelijk van het onderwerp worden indien nodig andere experts en stakeholders uitgenodigd voor het overleg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risicomanagers, pensioenjuristen of specialisten van APS. Besluiten worden aangenomen op basis van unanimité waarbij de stem van SPF en APS even zwaar weegt. Dit is dus onafhankelijk van het aantal aanwezige vertegenwoordigers van SPF en APS in de stuurgroep. Het eerste overleg vond plaats op 8 december 2022.

Verantwoording

Op drie niveaus wordt de voortgang gerapporteerd:

1. APS Wtp programma overall (klant overstijgend)
2. Fonds specifiek
3. Eraneos

APS Wtp programma overall (klant overstijgend)

Maandelijks wordt een pakket met de voortgang gestuurd aan alle fondsen waarvan bovenstaande overall rapportage een onderdeel is.

De klant overstijgende voortgang op het niveau van het APS Wtp programma wordt elk kwartaal uitgebreid met een nadere toelichting en diepgang op inhoudelijke ontwikkelingen en bevat de volgende elementen:

- Roadmap
- Tijdelijk ook implementatie AllVida als basisplatform onderdeel
- Status en voortgang mijlpalen in de overall transitie
- Belangrijkste risico thema's uitgelicht inclusief resultaten van mitigerende maatregelen

Fondsspecifiek

De fonds specifieke voortgang wordt elke maand vastgelegd in een fondsspecifieke voortgangsrapportage. Deze rapportage bevat voor de specifieke Transitie van SPF:

- De belangrijkste mijlpalen
- Status vorige- en huidige periode
- Issues en risico's

Deze rapportage wordt maandelijks door Transitie manager APS toegelicht aan SPF in de stuurgroep vergadering. Ook geeft de Transitie manager APS een toelichting in de bestuursvergaderingen van SPF.

Enkele maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke Transitie zal een verdiepende fondsspecifieke rapportage wordt opgesteld en zal de frequentie van rapporteren toenemen. Dit wordt nog nader geconcretiseerd.

In de stuurgroep wordt de voortgang van de Transitie besproken aan de hand van de voortgangsrapportages. Aan de hand van de voortgangsrapportages wordt SPF in staat gesteld om de voortgang te monitoren en beoordelen ten opzichte van de oorspronkelijke tijdslijnen van de

mijlpalen zoals beschreven in dit Migratieplan. Na afloop wordt een samenvatting met besluiten en actiepunten in de vorm van notulen verstuurd door de Transitie-manager APS.

Eraneos

De klanten van APS hebben besloten om in gezamenlijkheid een externe partij (Eraneos) te benoemen die de voortgang van de transitie naar het nieuwe administratiesysteem van APS zal monitoren ten behoeve van de klanten van APS. Deze partij heeft APS begeleid bij de keuze voor het nieuwe administratiesysteem, waardoor deze partij al een ruime kennis heeft met het nieuwe administratiesysteem. De externe partij zal zorgdragen voor quality assurance ten aanzien van het transitieproces van APS. De focus zal voornamelijk gericht zijn op de transitie naar het nieuwe IT-platform. Eraneos monitort de voortgang van APS middels een maandelijkse rapportage. Maandelijks wordt deze rapportage door het DB besproken met Eraneos. Hierbij haakt ook een directielid van APS aan.

Transitie-manager APS is de linking pin tussen SPF en APS

Een cruciale rol bij dit Project is weggelegd voor de Transitie-manager APS. De Transitie-manager APS is verantwoordelijk voor de Transitie van SPF naar de Wtp en de Nieuwe IT-keten, monitort de voortgang op de met SPF gemaakte afspraken en borgt de samenhang van de verschillende werkstromen vanuit de Transitie. De Transitie-manager APS voert binnen APS de regie over de totale change van SPF en is daarvoor het aanspreekpunt voor SPF.

- De Transitie-manager APS werkt gedurende de gehele Transitie nauw samen met de APS accountmanager voor SPF. De Transitie-manager APS is de regievoerder voor SPF voor de uitvoering van het Migratieplan en het aanspreekpunt voor afspraken rondom de Projectovereenkomst en het Migratieplan.
- De APS accountmanager is verantwoordelijk voor overall regievoering voor de klant binnen APS. Ook verzorgt de accountmanager de interne communicatie over de Migratie naar het huidige klantteam.

Escalatie

Indien binnen de bovengenoemde governance geen – voor SPF – bevredigende oplossing wordt gevonden, kan het Dagelijks Bestuur van SPF, bestaande uit Doreth van den Heuvel en Ben de Berg, zich wenden tot APS Senior Manager Wtp Transitie Robin de Keijzer. Indien dit evenmin leidt tot een bevredigende oplossing wendt het Dagelijks Bestuur van SPF zich tot APS Directeur Mirjam Breeckelmans.

2.2.3 Achmea Investment Management

Achmea IM heeft een eigen projectorganisatie ingericht. Deze projectorganisatie wordt uitgebreid beschreven in het Vermogenstransitieplan.

Binnen Achmea IM is er een groot implementatietraject “Implementatie Pensioen Akkoord” opgezet om al haar klanten voor 1 januari 2028 te migreren naar de nieuwe pensioenregeling. Binnen dit implementatietraject zijn er een drietal werkgroepen opgezet die individueel rapporteren naar een “Kernteam”. Dit Kernteam wordt gevormd door een overkoepelende programma manager en de project leads vanuit de onderliggende werkstromen. Het Kernteam rapporteert, via het programma management, de algehele voortgang aan de stuurgroep waar de directieleden van Achmea IM in participeren.

De volgende drie werkstromen zijn binnen Achmea IM opgericht:

1. Werkstroom Bedieningsmodel
2. Werkstroom Administratie & Rapportage
3. Werkstroom Klantregie & Transitie

Daarnaast bestaat er een werkgroep die zich richt op de communicatie.

De definitieve aanpassingen in de administratie en de daadwerkelijke omvorming van de portefeuille wordt uitgevoerd binnen de werkstroom Klantregie & Transitie. Per klant wordt er een separaat transitieteam opgestart dat onder leiding staat van een transitie manager.

De transitie manager rapporteert de klant specifieke voortgang richting de werkstroom Klantregie & Transitie en de accountmanager.

De aansturing van dit transitieteam is belegd bij Jeroen Buijs, transitie manager binnen Achmea IM die verantwoordelijk is voor het opstellen en implementeren van het Vermogenstransitieplan. De transitie manager heeft als taak het bewaken en laten uitvoeren van de gedefinieerde activiteiten voor Achmea IM die zijn opgenomen in de opgestelde planning. Daarnaast zorgt de transitie manager voor het begeleiden van de wekelijkse project calls met betrokken externe partijen.

De eindverantwoordelijkheid voor de sturing en het management van de transitie ligt bij de werkstroom Klantregie & Transities.

Overlegstructuur

Om te borgen dat de transitie op een goede en beheerste wijze verloopt zijn de volgende vaste en incidentele overlegstructuren ingericht:

- Eens per twee weken vindt een intern Achmea IM transitie overleg plaats waarbij meerdere disciplines worden betrokken (transitieteam).
- Periodiek overleg met de opdrachtgever vanuit Achmea IM, Accountmanager
- Periodiek overleg met de werkgroep “Implementatie Pensioenakkoord” vanuit SPF. De Accountmanager en Fiduciair adviseur vanuit Achmea IM zijn onderdeel van dit overleg.
- Periodiek overleg met de PUO (transitie manager vanuit APS)
- Incidentele benodigde overleggen met de custodian van SPF
- Incidentele benodigde overleggen met de door SPF aangestelde externe vermogensbeheerders en/of beheerders van beleggingsinstellingen
- Eens per 2 weken vindt een transitieoverleg plaats. Daarbij zijn namens Achmea IM Jeroen Buijs, Jeroen Redeker en Kees de Vaan vertegenwoordigd. Namens SPF zijn Doreth van den Heuvel, Ben de Berg, Marcel Roberts en Karen Castelijns vertegenwoordigd.

2.3 Voorbereidings- en besluitvormingsproces

Het Transitieplan bevat een aantal hoofdstukken waarin de rol van en de samenwerking tussen de verschillende betrokken gremia in het Wtp-traject worden beschreven:

- De vroege voorbereidingen in het kader van de transitie zijn beschreven in hoofdstuk 3 van het Transitieplan.
- De aansluiting met de leden van DPF en de deelnemers in de pensioenregeling is beschreven in hoofdstuk 2 van het Transitieplan.

2.3.1 Gerealiseerde mijlpalen

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste gerealiseerde mijlpalen uit het transitietraject opgenomen. De mijlpalen in de besluitvorming zijn grofweg in twee delen te vatten: eerste gezamenlijke besluitvormingstraject met het VO en DPF, waarna het eerste invaarverzoek op 29 september 2023 is ingediend bij DNB. Daarna hebben nog aanpassingen plaatsgevonden. Daarover heeft opnieuw besluitvorming plaatsgevonden met het VO en DPF, waarna op verzoek van DNB een nieuw tweede invaarverzoek op 21 februari 2025 naar DNB is gestuurd.

Datum	Mijlpaal
15-12-2021	Vaststelling bouwstenen door bestuur DPF en bestuur SPF
02-11-2022	- Vaststelling beleggingsbeleid in FPR door bestuur SPF - Vaststelling evenwichtigheidskader door bestuur SPF
25-01-2023	- Vaststelling Collectieve variant uitkeringsfase (collectief variabel pensioen) door bestuur SPF - Besluit standaardmethode als methode van invaren door bestuur SPF
22-03-2023	Besluit tijdelijk geruisloos invaren door bestuur SPF
17-05-2023	Vaststelling evenwichtigheidskader door bestuur SPF
14-06-2023	Vaststelling risicohouding door bestuur SPF
20-06-2023	Positief advies VO op: - Keuze voor de flexibele regeling - Risicohouding - Beleggingsbeleid - Projectierendement - Hoogte en spreidingsperiode risicodelingsreserve - Invaren en methode van invaren - Evenwichtigheidskader
20-09-2023	Opdrachtbrief ontvangen van DPF
27-09-2023	- Opdrachtbevestiging aan DPF vastgesteld door bestuur SPF - Voorgenomen invaarbesluit genomen door bestuur SPF en implementatieplan en invaarsjabloon vastgesteld - Besluit tot afdekken aandelenrisico tot invaarmoment door bestuur SPF
15-05-2024	Vaststelling beleggingsbeleid voor MVEV en operationele reserve door bestuur SPF
02-06-2024	Positief addendum op advies VO in verband met gewijzigd evenwichtigheidskader en document doelstellingen, bandbreedtes en maatstaven
03-06-2024	Inrichting module opzet beleggingsportefeuille
03-07-2024	- Vaststelling aangepast evenwichtigheidskader door bestuur SPF - Vaststelling document doelstellingen bandbreedtes en maatstaven door bestuur SPF
30-10-2024	Vaststelling beleggingsmodules door bestuur SPF
27-01-2025	Goedkeuring invaren van visitatiecommissie
30-01-2025	Aangepaste opdrachtbrief ontvangen van DPF
17-02-2025	Opinie SFH risicobeheer bij vaststelling implementatieplan en transitiebesluit
19-02-2025	- Opdrachtbevestiging aan DPF vastgesteld door bestuur SPF - Voorgenomen invaarbesluit genomen door bestuur SPF en implementatieplan en invaarsjabloon vastgesteld - Opinie SFH actuarieel over plausibiliteit transitieberekeningen
20-02-2025	Opinie SFH Interne Audit over risicoanalyse bij implementatieplan WTP

2.3.2 Vervolgstappen tot aan de transitie

Na het afronden van de besluitvormingsfase, met het melden van het voornemen tot invaren aan DNB, komt de focus op de resterende activiteiten van de realisatiefase, waarna de nazorg/hypercare fase volgt.

PUO koppeling

De koppeling tussen de pensioenadministratie en vermogensbeheer moet volledig gebouwd en getest zijn op 1 april 2025. Daarnaast moeten de afspraken hierover tussen APS en Achmea IM zijn vastgelegd in een fondsspecifiek Operating Manual op 1 mei 2025.

Ontwikkeling Allvida

De bouw en het testen van het nieuwe IT-landschap en het nieuwe administratiesysteem Allvida moet verder worden afgerond. De mijlpalen en de deliverables hierbij zijn vastgelegd in het migratieplan. SPF heeft hierover concrete afspraken gemaakt, waardoor SPF goed kan monitoren of de juiste voortgang wordt gerealiseerd. APS levert tweewekelijkse voortgangsrapportages, waardoor de voortgang kan worden gemonitord. Hierbij laat SPF zich ondersteunen door Eraneos.

Een deel van de processen zal op transitiedatum volledig geautomatiseerd, dus af en getest zijn, een deel daarvan niet. Daar waar de processen niet volledig geautomatiseerd, af en getest zijn wordt gewerkt met tijdelijke processen. Een aangepaste planning hiervoor wordt nog uitgewerkt. Hiervoor worden met APS concrete afspraken met betrekking tot de assurance en de nazorgfase gemaakt.

Afsluiten nieuwe overeenkomsten uitvoeringsorganisaties

Met Achmea Pensioenservices, Achmea Investment Management en met A.S.R. moeten nieuwe beheerovereenkomsten worden gesloten, inclusief nieuwe SLA afspraken. De planning is dat deze op respectievelijk 1 mei en 30 juni 2025 zijn afgesloten.

Er is een directe uitbestedingsrelatie van SPF met APS als uitvoeringsorganisatie en met Achmea IM als vermogensbeheerder. APS en Achmea IM werken ook met onderuitbestedingspartijen. APS en Achmea IM voeren de afspraken die SPF met APS en Achmea IM hebben gemaakt door in de keten van (onder)uitbestedingen. Dit door met de partijen die voor het pensioenfonds als onderuitbesteding worden gezien o.a. afspraken te maken over de verwerking van gegevens (verwerkingsovereenkomst), de beveiliging van de IT omgeving (security agreement) en afspraken over beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid via service levels (service level agreement).

Invaren

Het invaren moeten worden voorbereid, uitgevoerd en er moet nazorg geleverd worden. De afspraken over het invaren en de controles daarop worden verder geconcretiseerd met APS, Achmea IM en de certificerend actuaire/sleutelfunctiehouder actuarieel en de certificerend accountant. Hiervoor wordt gewerkt met een invaarblauwdruk en een invaaropdracht. Ook wordt de wijze waarop de conversiefactoren worden vastgesteld met hen afgestemd, de wijze en moment waarop vastgestelde persoonlijke vermogens en uitkeringen worden gecontroleerd, de wijze en het moment waarop het vermogen per 30 juni 2025 wordt vastgesteld, de wijze en het moment waarop de definitieve persoonlijke pensioenvermogens worden bepaald, de vaststelling van de freeze-periode (periode waarin geen mutaties worden uitgevoerd), de wijze waarop de tijdens de freeze-periode uitgestelde mutaties worden verwerkt, de wijze waarop overige mutaties TWK in de toekomst zullen worden verwerkt, het moment waarop de eindstanden onder het Ftk worden vastgesteld, de wijze waarop correcties binnen het fonds financieel worden verrekend (o.a. rol van de Operationele Reserve), de wijze en moment waarop doorgevoerde correcties op eerder vastgestelde persoonlijke vermogens en uitkeringen worden verrekend (en gecommuniceerd) met deelnemers. Een deel van de bovenstaande activiteiten wordt als nazorgwerkzaamheden beschouwd.

Voor het invaren zijn 3 proefmigraties gepland: brons, zilver en goud. De certificerend actuaire/sleutelfunctiehouder actuarieel en de certificerend accountant worden bij de opzet en beoordeling van de proefmigraties meegenomen. Dit helpt onder meer om na het feitelijke invaren beter inzicht te krijgen in de validiteit van de uitkomsten.

Communicatie ingeregeld

De transitiecommunicatie wordt nu, conform het Wtp communicatieplan opgestart. Belangrijk daarin is het tijdig verzenden van de prognosebrief oftewel transitieopgave met het verwachte pensioen voor en na de transitie. Deze worden verstuurd in mei 2025, daarvoor vindt een go/no go moment plaats.

Fondsdocumenten vastgesteld

Een aantal fondsdocumenten moet voor de transitie opnieuw worden vastgesteld. De belangrijkste documenten die moeten worden aangepast zijn:

- Pensioenreglement per 1 juli 2025
- Abtn per 1 juli 2025
- Beleggingsbeleid en beleggingsplan per 1 juli 2025
- Statuten
- Reglement Verantwoordingsorgaan
- Financieel risicoraamwerk

Wijziging beleggingsportefeuille

Voor de omzetting van de portefeuille is een vermogenstransitieplan opgesteld. SPF zal geen gebruikmaken van de Transitie FTK regeling. Ter voorbereiding op invaren kan worden besloten om het huidige (FTK) beleggingsbeleid bij te sturen naar de doelportefeuille onder FPR.

Om dit te kunnen uitvoeren zal APS, vanaf maart 2025, op maandbasis proefberekeningen ten behoeve van de invaarstanden FPR gaan opstellen. Deze maandelijkse proefberekeningen zal APS opleveren aan SPF en Achmea IM.

Op basis van deze proefberekeningen voert Achmea IM een vergelijking uit tussen de verwachte allocatie onder FPR versus huidige FTK allocatie. De uitkomsten van deze analyse worden ter bespreking aangeboden aan de BAC van SPF. Met een positief advies van de BAC kan in het bestuur worden besloten om een bijsturing van de asset allocatie naar de FPR doelportefeuille, vooruitlopend op invaren, uit te voeren. Eventuele keuzes t.b.v. bijsturing van het beleggingsbeleid voorafgaand aan invaren zullen vastgelegd worden in vernieuwde Beleggingsrichtlijnen. Op basis van deze nieuwe Beleggingsrichtlijnen zal Achmea IM de bijsturing in de portefeuilles uitvoeren. In de voorbereiding van deze bijsturing zal er nadrukkelijk worden gekeken in welk tijdspad deze bijsturing (kosten) efficiënt uitgevoerd kan worden.

2.4 Oordelen en adviezen van betrokken gremia inzake besluitvorming rondom de Wtp

In het besluitvormingsproces heeft het bestuur van SPF adviezen en opinies gevraagd en ontvangen van het VO, de VC en de SFH's.

2.4.1 Verantwoordingsorgaan (VO)

Het VO van SPF is direct betrokken geweest bij het transitietraject van SPF met DPF. Tijdens de vergaderingen inzake het Pensioenakkoord waarin de besturen van SPF en DPF door de (actuariële) adviseurs van SPF over deelonderwerpen van de transitie werden geïnformeerd, zijn het VO en zijn eigen externe adviseur daarom ook altijd aanwezig geweest.

Op 20 januari 2023 heeft het VO (op basis van het bouwstenendocument en alle door het bestuur verschaft informatie) een voorlopig oordeel gegeven over de door het bestuur van SPF genomen besluiten in het kader van de transitie (Voorlopig oordeel VO op basis van de bouwstenen).

Het VO sprak hierin een (voorlopig) positief oordeel uit over:

- de contractkeuze;
- de keuze voor APS als PUO;
- het beleggingsbeleid in de opbouw- en uitkeringsfase;
- de beoogde transitiedatum;
- de keuze om in te varen, de methode van invaren en de daarbij te hanteren voorrangsregels.

Ook op de formele adviesaanvraag op 19 mei 2023 heeft het VO unaniem een positief oordeel gegeven over de volgende zaken:

- de flexibele pensioenregeling als de nieuwe pensioenregeling voor fysiotherapeuten;
- het voortzetten van de relatie met APS als uitvoerder van de pensioenadministratie en het pensioenbeheer;
- de vertaling van de risicobereidheid en risicodraagkracht onder de deelnemers naar de (beleggings)risicohouding per leeftijdscohort van het pensioenfonds;
- de gemaakte keuzes voor wat betreft het beleggingsbeleid in de opbouwfase en het (collectieve) beleggingsbeleid in de uitkeringsfase;
- het bij de jaarlijkse vaststelling van de uitkeringen hanteren van een projectierendement op basis van de door DNB te publiceren rentetermijnstructuur (RTS);
- het hanteren van een risicodelingsreserve van 3% van het fondsvermogen in de collectieve uitkeringsfase, inclusief het voorgestelde beleid ten aanzien van het vullen en aanwenden van deze reserve;
- het in combinatie met deze risicodelingsreserve van 3% hanteren van een spreidingsperiode van 3 jaar in de collectieve uitkeringsfase;
- de argumenten en de conclusie van het bestuur van SPF om zo snel mogelijk over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel, met als uitgangspunt een transitie per 1 januari 2025.

Naast dit oordeel heeft het VO een positief advies gegeven over de volgende zaken:

1. Het invaren van de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenrechten op de transitiedatum in de flexibele premieregeling en de methode waarop wordt ingevaren;
2. De evenwichtigheid van de door het bestuur van SPF beoogde toedeling van het op de transitiedatum aanwezige pensioenvermogen aan de deelnemers, slapers en pensioengerechtigden enerzijds en aan een aantal wettelijk verplichte, dan wel in het kader van de evenwichtigheid gewenste reserves anderzijds.

Omdat SPF als beroepspensioenfonds geen separate uitvoeringsovereenkomst heeft, legt het bestuur in overleg met het VO de relevante passages uit het pensioenreglement voor advies voor.

Na dit advies hebben nog aanpassingen plaatsgevonden. Daarom heeft SPF opnieuw advies gevraagd aan het VO. Het VO heeft begin januari 2025 en medio februari 2025 in addenda bij het eerdere oordeel opnieuw positieve adviezen afgegeven aangaande de overwegingen van het bestuur bij het vaststellen van de risicohouding en de evenwichtigheid van de transitie.

Op 26 juni 2023 heeft het VO een positief advies uitgebracht over het communicatieplan. Ook bij het hernieuwde communicatieplan heeft het VO in februari 2025 een positief advies gegeven.

2.4.2 Visitatiecommissie (VC)

Het intern toezicht, in de vorm van de visitatiecommissie (VC) van SPF, is vroeg in het proces (2021) aangehaakt bij het besluitvormingsproces. De VC heeft het bestuur gechallenged op het gevoerde proces en de besluitvorming. Het bestuur van SPF heeft daarbij de VC de concrete vraag gesteld om te onderzoeken of mogelijk sprake was van tunnelvisie bij het bestuur in het besluitvormingsproces. Dat was volgens de VC niet het geval, aangezien SPF duidelijke uitgangspunten had geformuleerd. De VC neemt de beoordeling van de Wtp transitie mee in haar jaarrapport. Daarnaast heeft de VC in

2021, 2023, 2024 en 2025 enkele specifieke rapporten opgesteld over de Wtp transitie. De belangrijkste conclusies zijn dat:

- het bestuur van SPF het gehele proces van de invoering van de WTP zorgvuldig heeft voorbereid en ingericht;
- DPF en het VO zijn stap voor stap meegenomen. Het VO heeft zijn eigen adviseur aangesteld. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het VO zelfstandig zijn oordeel heeft kunnen vormen.
- ook de verschillende rollen van de sleutelfunctiehouders (SFH's) zijn zorgvuldig ingevuld. De SFH's hebben hun eigen rol goed ingevuld en ook zij hebben het bestuur uitgedaagd en uit de gesprekken met de SFH's en hun opinies komt naar voren dat hun onafhankelijkheid niet onder druk is komen te staan;
- de adviseurs van APS, AIM, Montae, WTW hebben zorgvuldig werk afgeleverd en hebben waar gewenst ter vergadering inhoudelijke toelichting gegeven;
- de besluitvorming heeft via de BOB-methode plaatsgevonden en de evenwichtigheidsvraagstukken zijn in de besluitvorming altijd meegewogen;
- de VC spreekt uit dat sprake is van een beheerste en integere bedrijfsvoering en dat een (zeer) zorgvuldig proces is doorlopen en geeft daarmee de goedkeuring aan het invaarverzoek, mits de IT-administratie aan alle vereisten voldoet en goedgekeurd is door het bestuur.

De rapportages van de VC hebben niet geleid tot vervolgacties voor het bestuur.

2.4.3 Sleutelfunctiehouders (SFH's)

Het bestuur heeft de SFH's gedurende het transitieproces zo goed en zo compleet mogelijk aangehaakt, geïnformeerd en voorzien van documenten met betrekking tot het bestuurlijke besluitvormingsproces. Zoals eerder benoemd zijn met name de SFH's risicobeheer en interne audit zeer nauw betrokken geweest bij het bestuurlijke proces; voor de SFH actuarieel geldt dat in mindere mate.

De drie SFH's hebben allen een opinie geschreven in het kader van de datakwaliteit (zie hoofdstuk 5). Het bestuur heeft deze opinies beoordeeld en vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 13 september 2023.

De SFH interne audit heeft daarnaast een oordeel gegeven over de door het bestuur opgestelde risicoanalyses en beheersmaatregelen betreffende het transitieproces naar de Wtp. Daarin concludeert de SFH interne audit:

- De opzet van de RSA NPC is conform de gebruikte relevante delen van het DNB referentiekader Integraal Risicomanagement (risico-identificatie, risico-inschatting en het bepalen van beheersmaatregelen).
- Door SPF is voldoende tijd genomen om de RSA NPC op te stellen en regelmatig te voorzien van een update.
- De risico's en beheersmaatregelen zoals opgenomen in de RSA NPC zijn, behoudens enkele details, opgenomen in Hoofdstuk 3 van het implementatieplan, met dien verstande dat gekozen is voor een meer beschrijvende weergave van de risico's en beheersmaatregelen. Dit vergroot de leesbaarheid van dit onderdeel van het implementatieplan;
- De onderdelen betreffende risicoanalyse en beheersmaatregelen zoals genoemd in de DNB "Good Practice/Inhoudsopgave implementatieplan pensioenfondsen" en de DNB Factsheet "Inhoud Implementatieplan pensioenfondsen", zijn opgenomen in het implementatieplan.

De SFH AC heeft een opinie geschreven over de risicohouding. De SFH AC heeft enkele aandachtspunten aangedragen die tot aanscherping van de vastgestelde risicohouding leidde. De SFH AC heeft enkele vragen gesteld die het bestuur heeft beantwoord. Het bestuur heeft mede op basis

van de opinie van de SFH vastgesteld dat het voldoende comfort heeft bij de eerder vastgestelde risicohouding.

Daarnaast heeft de SFH AC een opinie geschreven over de plausibiliteit van de invaarberekeningen. De SFH AC concludeert dat:

- Hij geen reden heeft om aan te nemen dat de gegevens die worden gebruikt ter bepaling van de nettoprofijt percentages in het basisscenario niet plausibel zijn.
- Naast de nettoprofijtuikkomsten in het basisscenario, de nettoprofijtuikkomsten bij een hoge / lage dekkingsgraad en bij een hoge / lage rente zijn opgenomen en dat in het document “Doelstellingen, maatstaven en voorrangsregels Wtp-transitie” één en ander nader is toegelicht met betrekking tot de gevoeligheidsanalyses.
- Op basis van globale toetsing heeft hij geen reden om aan te nemen dat de gegevens die worden gebruikt ter bepaling van de pensioenverwachtingen in het basisscenario niet plausibel zijn.
- Naast de pensioenverwachtingen in het basisscenario, zijn de pensioenverwachtingen bij een hoge / lage dekkingsgraad en bij een hoge / lage rente opgenomen en dat in het document “Doelstellingen, maatstaven en voorrangsregels Wtp-transitie” één en ander nader is toegelicht met betrekking tot de gevoeligheidsanalyses.

De SFH AC heeft geen bevindingen. De opmerkingen en vragen van de SFH worden geadresseerd.

De SFH RB heeft een opinie geschreven over de totstandkoming van c.q. de inhoud van de opdrachtaanvaarding, het invaarbesluit en het implementatieplan. Het oordeel van de SFH RB is positief, met daarbij enkele aandachtspunten, waaronder de IT-infrastructuur, waar het bestuur zich van bewust is. Op basis van het doorlopen proces en door het bestuur uitgevoerde analyses ziet de SFH RB geen compliance risico's voor het vaststellen van het implementatieplan, de opdrachtaanvaarding en het transitieplan.

2.5 Besluitvormingsproces vaststelling implementatieplan

Met betrekking tot het implementatieplan is het onderstaande proces gevolgd:

- Het concept implementatieplan is opgesteld door de Werkgroep Regeling;
- Deze conceptversie is voorgelegd aan het bestuur, zodat de bestuursleden de mogelijkheid hadden om tekstuele en inhoudelijke verbeteringen aan te brengen;
- Vervolgens is aan de SFH risicobeheer gevraagd om een opinie uit brengen over het implementatieplan;
- De opinie van de SFH RB en SFH IA is op 13 september 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur;
- Het bestuur heeft geconcludeerd dat de opinies van de SFH's niet leiden tot belemmeringen voor een te nemen invaarbesluit. Wel onderschrijft het bestuur de opmerking van SFH risicobeheer, dat de tijdige gereedheid van de nieuwe IT-infrastructuur als het grootste risico op weg naar de transitiedatum geldt;
- Het implementatieplan is op 27 september 2023 ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur;
- Na vaststelling van het implementatieplan door het bestuur is het implementatieplan ter kennisgeving aan DPF, het VO en de VC gestuurd en op de website geplaatst.

Vervolgens is het traject met DNB gestart, wat heeft geleid tot aanpassing van het implementatieplan. Daarbij is het volgende proces gevolgd:

- Het concept implementatieplan is opgesteld door de Werkgroep Regeling.
- Deze conceptversie is voorgelegd aan het bestuur, zodat de bestuursleden de mogelijkheid hadden om tekstuele en inhoudelijke verbeteringen aan te brengen.
- Vervolgens is aan de SFH RB gevraagd om een opinie uit brengen over het implementatieplan; de SFH IA is gevraagd om een opinie uit te brengen over de risicoanalyse in het implementatieplan

en de SFH AC is gevraagd om een opinie uit te brengen over de plausibiliteit van de invaarberekeningen.

- De opinie van de SFH RB en van de SFH AC is op 19 februari 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.
- Het implementatieplan is op 19 februari 2025 ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. Daarbij heeft het bestuur geoordeeld dat het bestuur nog steeds achter de transitie staat en de financiële effecten die met de transitie gepaard gaan, omdat alle deelnemers zich evenwichtig vertegenwoordigd kunnen voelen. De effecten op alle deelnemersgroepen en alle leeftijdscohorten zijn meegewogen. In de doelstellingen en voorrangsregels is niet iedere groep apart benoemd, maar elke groep kan zich wel vertegenwoordigd voelen. Daarbij zijn alle deelnemersgroepen vertegenwoordigd in de verenigingsraad en het bestuur van DPF. Daarnaast zijn er geen deelnemersgroepen die een onevenwichtig nadeel ondervinden van de transitie. De mogelijke (relatieve) effecten van verschillende scenario's zijn goed onderzocht. Deze effecten zijn verklaard en geaccepteerd. Daarmee vindt het bestuur de transitie naar de nieuwe regeling en het invaren evenwichtig.
- Na vaststelling van het implementatieplan door het bestuur is het implementatieplan ter kennisgeving aan DPF, het VO en de VC gestuurd en op de website geplaatst.

3 Risico's en beheersmaatregelen

3.1 Periodieke risicoanalyses als onderdeel van het integraal risicomanagement

In het kader van de transitie naar de flexibele premieregeling onder de Wtp onderkent SPF verschillende risico's. Voor al deze risico's heeft het fonds beheersmaatregelen getroffen. Indien bestaande beheersmaatregelen niet adequaat zijn, worden deze aangevuld, aangescherpt en/of bewust geaccepteerd door het bestuur. In dit hoofdstuk worden risico's beschreven, op waarde geschat (bruto risico) en worden beheersingsmaatregelen benoemd. De na beheersing resterende (netto) risico's worden afgezet tegen de risicobereidheid van SPF om vast te stellen of aanvullende maatregelen gewenst zijn. Dit hoofdstuk van het implementatieplan moet in samenhang gelezen worden met de laatste versie van de risicoanalyse nieuw pensioencontract (risicoanalyse NPC).

3.1.1 Toelichting risicoscores

Bij een lage of beperkte risicoscore (1 tot en met 3) is het bestuur van mening dat er geen directe actie noodzakelijk is. Het beleid en de processen rondom dit risico worden beoordeeld binnen het reguliere onderhouden van het beleid. Bij een midden risicoscore (4 tot en met 7) zijn directe acties niet noodzakelijk. Eventueel kunnen er tijdelijke maatregelen worden getroffen. Deze risico's dienen wel structureel te worden teruggebracht naar een lage risicoscore. Bij een aanzienlijke of hoge risicoscore (8 tot en met 16) zijn volgens het bestuur van SPF directe acties nodig. Er worden (tijdelijke) beheersmaatregelen getroffen die binnen daarvoor vastgestelde periode effectief moeten blijken (of moeten werken) in het verlagen van het risico. Daarnaast wordt er zo snel mogelijk naar een structurele oplossing gezocht door het bestuur waardoor de risicoscore naar beneden kan worden bijgesteld.

3.1.2 Proces totstandkoming risicoanalyse NPC

Ten minste eens per kwartaal stelt het bestuur een nieuwe versie van de risicoanalyse NPC vast. In deze risicoanalyse zijn het oordeel van het bestuur en de sleutelfunctiehouder risicobeheer meegewogen en heeft het intern toezicht de uitkomsten van de analyses kunnen bespreken. De risicoanalyse NPC betreft een levend document. Tijdens de bestuursvergadering van 5 februari 2025 heeft het bestuur de laatste versie van de risicoanalyse NPC vastgesteld.

3.1.3 Risicoanalyse NPC als onderdeel van het integraal risicomanagement van SPF

SPF maakt gebruik van risicomanagementcycli die zijn gebaseerd op het COSO Enterprise Risk Management (ERM) model. Het COSO ERM-model omvat acht processtappen. Als eerste wordt elke vier jaar de missie, visie, strategie en risicohouding van SPF vastgesteld. Vervolgens worden de doelstellingen en risicobereidheid geformuleerd inclusief de risicotolerantie van het fonds. Binnen de risicomanagementcycli worden risico's benoemd en geïdentificeerd. Daarnaast worden risico's gewogen en beoordeeld. Beheersmaatregelen en het netto risico worden benoemd en vastgesteld. De implementatie van risicobeheersing binnen SPF staat centraal inclusief beheersingsactiviteiten en de beheersomgeving. Rapportage, informatie-uitwisseling en communicatie over het proces vinden plaats tussen verschillende fondsgremia, taken en functies binnen SPF. Ten slotte wordt het risicomanagement gemonitord en geëvalueerd om een lerende organisatie te creëren waarbij de uitkomsten worden meegenomen in de start van de nieuwe cyclus.

SPF kent drie risicomanagementcycli: de strategische, operationele en thematische cyclus. Alle cycli kennen dezelfde systematiek waarin structureel de acht processtappen van de COSO/ERM-model worden doorlopen. Iedere cyclus kent een eigen periodiciteit en wordt als zodanig structureel doorlopen. De cycli kennen ook een relatie tot elkaar.

Het strategisch risicomanagement richt zich op de risicostrategie (het normenkader in het risicoprofiel) en de strategische risico's. Strategische risico's vormen de belangrijkste risico's met het

oog op het bestaansrecht van SPF in de komende 2 tot 5 jaar. Het operationele risicomanagement vindt elk kwartaal plaats en richt zich op de meer dagelijkse risico's. Voorbeelden hiervan zijn de korte termijn risico's die ontstaan als gevolg van het falen of tekortschieten van interne processen, menselijke en technische tekortkomingen en onverwachte externe gebeurtenissen. Bij thematische risico's die meerdere facetten raken waardoor deze thematische risico's lastig onder te brengen zijn bij financieel of niet-financieel risico, vindt via een 'deep-dive' een thematische risicoanalyse plaats. Thematische risico's worden op basis van de aard, omvang en complexiteit van het betreffende project of onderwerp specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot die cyclus. De transitie naar de flexibele premiereregeling valt binnen de thematische cyclus van het integraal risicomanagementbeleid van SPF.

SPF heeft een integrale benadering bij het managen van risico's. Adequaat risicomanagement maakt integraal onderdeel uit van de (be)sturing van de organisatie (bij SPF en diens uitbestedingspartners). Daarnaast heeft SPF de verschillende taken en rollen binnen het risicomanagement zo ingericht dat alle actoren verantwoordelijkheid kunnen nemen, op basis van hun mandaat. De inrichting hiervan is afgeleid van het 'three lines model'. SPF hanteert de uitgangspunten van dit model op haar eigen en proportionele wijze bij de inrichting van het risicomanagement. SPF onderscheidt hierin op hoofdlijnen de volgende rollen/functies: risico-eigenaar, risicobeheerfunctie en de auditfunctie. De risicogovernance wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur van SPF om vast te stellen in hoeverre deze doelmatig is bij het realiseren van de strategische doelstellingen van SPF.

De risico-eigenaar (de betreffende bestuurscommissie) is verantwoordelijk voor het identificeren, beoordelen en beheersen van een specifiek risico. De risico-eigenaar verzorgt de rapportage daarover en stimuleert het risicobewustzijn ten aanzien van dit risico binnen de organisatie. De risico-eigenaar stelt beheersmaatregelen op en beoordeelt de werking hiervan door middel van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). De risicobeheerfunctie challengeert en faciliteert richting de risico-eigenaar. Daarnaast is de risicobeheerfunctie (de commissie GRC en sleutelfunctiehouder risicobeheer) verantwoordelijk voor de integrale monitoring van het risicomanagement, bewaken van het risicoprofiel van SPF en de rapportages daarover aan het bestuur. De risicobeheerfunctie moet deze taak op een objectieve, eerlijke en onafhankelijke manier kunnen uitvoeren en moet toegang hebben tot alle informatie die noodzakelijk is om de functie te kunnen uitoefenen. De controle-/auditfunctie verschaft met een onafhankelijke (dat wil zeggen onafhankelijk van de risico-eigenaar en risicobeheerfunctie) toets zekerheid (assurance) over de kwaliteit van sturing en beheersing en is daarmee het sluitstuk van de PDCA-cyclus. De auditfunctie onderzoekt in hoeverre er aantoonbaar conform beleid en procedures wordt gewerkt. Het bestuur is kaderstellend, besluitvormend en eindverantwoordelijk voor het gehele integraal risicomanagement. De IAF heeft in 2024 een interne audit naar het integraal risicomanagement (IRM) van SPF uitgevoerd. De IAF komt daarbij tot het oordeel dat het IRM van SPF, volgens de normen van DNB, adequaat is ingericht en wordt uitgevoerd. Op basis van de individuele bevindingen en de weging daarvan in totaliteit (laag, midden en hoog) is het eindoordeel van de IAF: voldoende.

Bij het identificeren, beoordelen, beheersen, monitoren en evalueren van de risico's met de transitie naar het nieuwe pensioencontract heeft SPF gebruik gemaakt van het reguliere risicomanagementproces zoals hierboven is beschreven. De beheersmaatregelen die worden ingesteld om risico's te minimaliseren, voorkomen of mitigeren worden minimaal elk kwartaal gemonitord en aan de hand van de bevindingen wordt er beoordeeld of de beheersmaatregelen effectief zijn en naar behoren functioneren. Indien nodig worden de beheersmaatregelen aangepast, aangescherpt en/of bewust geaccepteerd.

3.2 Operationele, financiële, uitbestedings- en IT-risico's

Het bestuur van SPF heeft vastgesteld dat de volgende operationele, financiële, uitbestedings- en IT-risico's zich voor, tijdens en/of na de transitie kunnen voordoen:

- Overschrijding van het budget
- Doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering en informatie voorziening
- Migratie naar de nieuwe doelketen van APS
- De pensioenaanspraken en -rechten kunnen niet of worden niet correct toebedeeld aan de deelnemer
- Key person risk: Capaciteit ondersteuning (intern / extern)
- Fluctuaties in de financiële situatie van SPF en/of de rente leiden tot nieuwe berekeningen

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op deze risico's.

3.2.1 Overschrijding van het budget (risico 6a risicoanalyse NPC¹)

Risico omschrijving:

Er vindt geen evenwichtige besluitvorming plaats bij het opstellen van een begroting en het maken van kosten ten aanzien van het project. Er vindt geen ex ante verantwoording van de kosten plaats. Er is onvoldoende controle op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Doordat SPF een early mover is, was het vooraf moeilijk in te schatten wat de werkzaamheden en daarmee de kosten zouden zijn, waardoor het onmogelijk was om een totaal budget vast te stellen. Ook de adviseurs wisten niet op voorhand welke werkzaamheden nodig waren. Waar dat mogelijk was, zijn op onderdelen offertes opgevraagd en is over de prijs onderhandeld. Waar nodig is het uitbestedingsbeleid gevolgd.

Kans	Impact	Bruto risico
3	3	9

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Met adviseurs en uitbestedingspartners vooraf zo duidelijk mogelijke afspraken maken over begroting, kostenoverschrijding en verantwoordelijkheid daarvoor.
2. Korte lijnen met de adviseurs over de uit te voeren werkzaamheden en kosten;
3. Elk kwartaal rapporteren over realisatie.
4. Matchen projectbegroting met reguliere jaarbegroting SPF.
5. Bij werkzaamheden wordt goed gekeken hoe deze zo kostenefficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
6. Er is ervoor gekozen om geen transitie-manager in te schakelen.
7. In het kader van de projectovereenkomst moet overleg plaatsvinden over compensatie van de extra kosten die SPF maakt als gevolg van de extra overleggen.
8. Overleg met APS over mogelijke (extra) compensatie.

Kans	Impact	Netto risico
3	3	9

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico buiten de risicobereidheid valt van het fonds ondanks de aanwezige beheersmaatregelen. Het verkrijgen van verdere grip op kosten blijkt een uitdaging te zijn vanwege het extra werk dat gepaard gaat bij een beheerste en integere transitie bij de uitbestedingspartijen en in het traject met DNB. Het bestuur blijft echter kritisch op de (extra) aanvullende werkzaamheden en de kosten die daarvoor worden gemaakt. De verwachting is dat

¹ Analyse datum 29 januari 2025.

deze extra kosten van tijdelijke aard zijn en deze op termijn afnemen na de transitie. Om deze reden heeft het bestuur besloten het restrisico te accepteren.

3.2.2 Doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering en informatie voorziening (risico 6b risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

Dit betreft het risico dat medewerkers bij de uitvoeringsorganisatie niet goed genoeg zijn geschoold en/of geëquipeerd ten aanzien van keuzebegeleiding en de reguliere werkzaamheden na implementatie van de nieuwe pensioenregeling. Denk hierbij aan de juiste actuariële berekeningen, juridische zaken vragen en begeleiding bij de keuze mogelijkheden met betrekking tot de nieuwe regeling/reglement. In de nieuwe situatie worden het IT-systeem AllVida en de kennis en procedures als de twee meest cruciale bedrijfsprocessen gezien.

Kans	Impact	Bruto risico
3	4	12

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Coproductie nieuwe regeling. APS (vanuit actuaariaat en BO/BA) en vaste adviseurs als WTW zijn betrokken bij gehele transitie. Daardoor al goed op de hoogte van ins en outs nieuwe regeling.
2. Zo veel als mogelijk eenvoud in de regeling.
3. Juiste afspraken maken met APS en adviseurs over eigenaarschap en verantwoordelijkheden.
4. Plannen van sessies met het Klant Contact Center van APS i.s.m. de communicatie commissie om onder andere de vragen te beantwoorden: Wat en hoe wil SPF communicatie/voorlichting inrichten? Waar ligt de grens voor SPF?
5. Sessie met de commissie GRC en JZ. Verifiëren wat zij doen.
6. APS vragen om in bestuursvergadering nadere toelichting te geven over de stand van zaken ten aanzien van de transitie.
7. Meenemen ervaringen door fonds(en), bv. APF die al premierregeling uitvoeren en ervaringen opgedaan hebben met begeleiding bij keuze mogelijkheden.
8. Het gevraagde kwaliteitsniveau expliciet in het nieuwe contract met APS opnemen.
9. SPF heeft op het KCC meer FTE afgenomen. Daarnaast is de bezetting beter op- en afschaalbaar.
10. Opstellen readinessplan Wtp KCC door APS.
11. Opstellen calamiteitenplan KCC door APS.
12. APS moet een nieuwe detailplanning opleveren vanwege het uitstel van de transitiedatum naar 1 juli 2025.

Kans	Impact	Netto risico
2	3	6

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico binnen de risicobereidheid valt van het fonds en accepteert het restrisico. Uiteraard blijft er aandacht voor de opvolging en monitoring van de beheersmaatregelen.

3.2.3 Migratie naar het nieuwe IT-platform bij Achmea Pensioenservices (APS) (risico 9 risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

APS heeft gekozen voor een nieuw administratiesysteem: AllVida. De implementatie van dit systeem vindt door APS plaats (APS wijzigt op dit moment de governance waarbij de transitie in de lijn zal

worden belegd). SPF is de launching customer op het AllVida-systeem voor de Wtp-regeling. SPF loopt het risico dat het systeem, inclusief aanpalende systemen, niet tijdig beschikbaar is of onvoldoende goed functioneert. Hiermee bestaat tevens het risico op een 'dubbele' transitie (een transitie naar het nieuwe systeem en een transitie naar de Wtp) met alle operationele, communicatieve en reputatie risico's die daarmee samenhangen. Daarnaast loopt SPF een ketenrisico als Achmea IM niet op IT-platform van APS kan aansluiten.

Tot slot bestaat ook het risico dat geen of laat overeenstemming wordt bereikt inzake de inhoud van de overeenkomst tussen SPF en APS, waardoor het transitie project vertraging oploopt.

Kans	Impact	Bruto risico
4	4	16

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Korte lijnen met APS houden voor de voortgang en voorrang van SPF met betrekking tot de transitie naar de Wtp en de overgang naar het AllVida-platform.
2. Vastleggen afspraken met APS inzake overstapdatum, kritieke paden en benodigde capaciteit en financiële prikkel.
3. Stakeholders tijdig informeren over voortgang en gevolgen.
4. Plan B: als AllVida niet gereed dan in MAIA voor kosten APS.
5. Het opzetten van een Quality Assurance-traject door Eraneos.
6. Het zorgvuldig doorlopen van het nieuwe proces voor het betalen van de pensioenpremie met DPF. Daarnaast zijn er externe juristen bij dit proces betrokken.
7. Tijdige en duidelijke communicatie met de deelnemers over de wijzigingen en het aanbieden van geschikte alternatieven.
8. Het 'No Go'-besluit van SPF voor de transitie op 1 januari 2025.
9. APS moet een nieuwe detailplanning opleveren voor 1 september 2024 vanwege het uitstel van de transitiedatum naar 1 juli 2025.
10. Het voeren van een stevig gesprek tussen het DB en de directie van APS over de nieuwe detailplanning en de nieuwe transitiedatum.
11. Het opstellen van nieuwe fallback-opties als een transitie per 1 juli 2025 niet mogelijk is.

De klanten van APS hebben besloten om in gezamenlijkheid een externe partij (Eraneos) te benoemen die de voortgang van de transitie naar het nieuwe administratiesysteem van APS zal monitoren ten behoeve van de klanten van APS. Deze partij heeft APS begeleid bij de keuze voor het nieuwe administratiesysteem, waardoor deze partij al een ruime kennis heeft met het nieuwe administratiesysteem. De externe partij zal zorgdragen voor quality assurance ten aanzien van het transitieproces van APS. De focus zal voornamelijk gericht zijn op de transitie naar het nieuwe IT-platform. Eraneos monitort namens een aantal klanten van APS de voortgang van APS middels een maandelijkse rapportage. Maandelijks wordt deze rapportage door het DB besproken met Eraneos. Hierbij haakt ook een directielid van APS aan.

Kans	Impact	Netto risico
4	4	16

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico buiten de risicobereidheid valt van het fonds ondanks de aanwezige beheersmaatregelen. Het bestuur heeft (aanvullende) actie ondernomen om dit risico verder te verminderen door met APS in gesprek te gaan rondom de nieuw voorgestelde datagerichte aanpak en daarbij het eigen minimale scenario neer te leggen. Daarnaast heeft het bestuur vereisten neergelegd met betrekking tot het rapporteren en inzichtelijk maken van voortgang inzake de oplevering van het platform en de aantoonbare interne beheersing.

3.2.4 De pensioenaanspraken en -rechten kunnen niet of worden niet correct toebedeeld aan de deelnemer (risico 10 risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

Het risico dat de pensioenaanspraken en -rechten niet of niet correct worden toebedeeld aan de deelnemer.

Het risico dat er onvoldoende aandacht is voor informatiebeveiligings- en AVG vereisten tijdens de transitie en inrichting van de systemen. Gevolg hiervan kan zijn: risico dat er datalekken plaatsvinden door falende systemen of menselijke fouten.

Kans	Impact	Bruto risico
3	3	9

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Opzet van datakwaliteitsbeleid.
2. Analyse huidige data opstellen.
3. Verbeterplan datakwaliteit opstellen.
4. Aparte externe verklaring vanuit SFH ACT of accountant op kwaliteit data vragen; ook van APS wordt gevraagd een audit uit te voeren op de data.
5. Onderdeel transitieplan AllVida analyses.
6. Eventueel gezamenlijke audit met meerdere klanten van APS; bijeenkomsten van SFH's. Voor zo ver bekend is er al een opdracht uitgezet binnen Achmea dat de Wtp-transitie en de overgang naar het AllVida-platform onderwerp is van een audit vanuit de poot Interne Audit van Achmea zelf.
7. Montae is ingehuurd om het datakwaliteitsbeleid op te zetten en alle stappen met SPF te zetten die nodig zijn om aan de eisen te voldoen.
8. Het uitvoeren van proefberekeningen om de omzetting van aanspraken naar kapitalen te testen en te valideren.
9. Het certificeren van de modules per 1 augustus 2024.
10. Het uitvoeren van meerdere controles op de proefberekeningen van APS in de verdere loop van 2025.

Kans	Impact	Netto risico
1	3	3

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico binnen de risicobereidheid valt van het fonds en accepteert het restrisico. Uiteraard blijft er aandacht voor de opvolging en monitoring van de beheersmaatregelen.

3.2.5 Key person risk: Capaciteit ondersteuning (intern / extern) (risico 5 risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

Het vertrek van belangrijke spelers in het project, bestuur, VO, DPF of medewerkers van uitbestedingspartners veroorzaakt kennishiaten en leidt tot vertraging/onzorgvuldigheid in beleids- en besluitvorming.

Het risico dat onvoldoende personeel bij APS beschikbaar is voor de uitvoering van het transitie project (Change fase) of na de transitie (Run fase). Capaciteitsrisico na transitie reeds benoemd.

Kans	Impact	Bruto risico
4	3	12

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Instellen projectgroep met juiste kennis, competenties.
2. Sleutelspelers worden in het project betrokken.
3. Door goede dossiervorming kan het inwerkprobleem worden ondervangen en een consistente lijn worden bewaakt.
4. Het werken met ruimere wervingstermijnen zodat er een warme overdracht kan plaatsvinden, actief beleid om keypersons te behouden.
5. De platte projectorganisatie en het bottum-up proces maken dit risico ook kleiner.
6. Er wordt meer gedelegeerd over de bestuursleden.
7. Meer werkzaamheden worden gedelegeerd naar bestuursleden en adviseurs.
8. Gesprekken voeren met APS en WTW over de beschikbaarheid van de adviseurs vanwege het uitstellen van de transitiedatum naar 1 juli 2025.

Kans	Impact	Netto risico
4	2	8

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico buiten de risicobereidheid valt van het fonds ondanks de aanwezige beheersmaatregelen. Het bestuur erkent dat de capaciteit van key persons onder druk staat en heeft daarom de aanwezige beheersmaatregelen ingericht. Eerder is besloten de transitiedatum uit te stellen naar 1 juli 2025 (besluit in juli 2024). Dit betekent echter dat het fonds langere tijd afhankelijk is van key persons / adviseurs met de juiste kennis en competenties om de transitie af te ronden. Deze adviseurs zijn ook betrokken bij het proces met DNB, dat tot op heden nog niet is afgerond. Het bestuur erkent de impact van deze verlengde afhankelijkheid en blijft actief monitoren of de beheersmaatregelen toereikend zijn. De verwachting is dat de afronding van het invaardossier binnen enkele maanden plaats vindt. Gezien de genomen maatregelen en de voortdurende opvolging van de risico's, acht het bestuur het resterende risico acceptabel.

3.2.6 Fluctuaties in de financiële situatie van SPF en/of de rente leiden tot nieuwe berekeningen (risico 14 risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

Het bestuur heeft in het kader van de transitie verschillende besluiten genomen. Er bestaat een risico dat fluctuaties in de financiële situatie van SPF en/of de rente ertoe kunnen leiden dat het bestuur moet terugkomen op eerder genomen besluiten, wat de noodzaak creëert om nieuwe financiële berekeningen te maken. Dit risico kan de stabiliteit en continuïteit van de besluitvorming negatief beïnvloeden.

Kans	Impact	Bruto risico
3	4	12

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Het opstellen van een evenwichtskader voor invaren.
2. Er zijn afspraken gemaakt over wanneer SPF opnieuw het evenwichtskader voor invaren zal herzien.
3. Maandelijks monitoren van de dekkingsgraad en de renteontwikkeling via het dekkingsgraadoverzicht.
4. De noodprocedure / het financieel crisisplan bieden een duidelijke werkwijze voor het geval dat de dekkingsgraad en/of renteontwikkelingen zich significant negatief ontwikkelen.
5. De aankoop van putopties.

6. Het bestuur voert periodiek het gesprek over de putopties, onder andere in het kader van evenwichtigheid.

Kans	Impact	Netto risico
2	4	8

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico buiten de risicobereidheid valt van het fonds ondanks de aanwezige beheersmaatregelen. Dit risico is een belangrijk terugkerend onderwerp en krijgt de benodigde aandacht binnen het bestuur, tegelijkertijd is het fonds afhankelijk van externe factoren en de afronding van het invaardossier met DNB. Om deze reden heeft het bestuur besloten het restrisico te accepteren.

3.3 Omgevingsrisico's en reputatie risico's

Het bestuur van SPF heeft vastgesteld dat de volgende omgevingsrisico's en reputatie risico's zich voor, tijdens en/of na de transitie kunnen voordoen:

- Draagvlak bij de achterban komt zwaar onder druk;
- Communicatie aan deelnemers is niet adequaat;
- Langere doorlooptijd van het wetgevingstraject en/of tussentijdse inhoudelijke veranderingen in de voorgenomen wetgeving;
- Onvoldoende doorlooptijd of een niet volledig besluitvormingsproces voor DPF, fondsorganen en sleutelfunctiehouders;
- Het risico dat de afstemming over de transitie met de toezichthouders stroef verloopt.

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op deze risico's.

3.3.1 Draagvlak bij de achterban komt zwaar onder druk (risico 1 risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

In het traject op weg naar de nieuwe pensioenregeling ontstaat een aanleiding voor een grote groep deelnemers om het lidmaatschap van DPF op te zeggen, waardoor het vereiste draagvlak bij de achterban zwaar onder druk komt. Een mogelijke aanleiding is dat de pensioenregeling niet aansluit bij de risico's die deelnemers kunnen en willen dragen. Een andere mogelijke aanleiding kan liggen bij ontwikkelingen bij andere beroepspensioenfondsen die invloed hebben op de perceptie van SPF-deelnemers t.a.v. de verplichtstelling.

De negatieve berichtgeving met betrekking tot de Wtp vanuit media en politiek kan de beeldvorming van de SPF achterban negatief beïnvloeden.

Kans	Impact	Bruto risico
3	4	12

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Onderzoeken risicohouding bij achterban: (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.
2. Benutten informatie uit reeds bestaande onderzoeken.
3. Gebruik wetenschappelijke data naast dialoog met deelnemers.
4. Vertaling maken risicohouding t.b.v. strategisch beleggingsbeleid.
5. Stemming ALV DPF over pensioenregeling, risicopreferenties, invaren, uitvoering, contractskeuze. De ALV DPF stemt niet over de regeling maar waarschijnlijk over een klein onderdeel van de regeling (nabestaandenpensioen)
6. Keuzevrijheid bieden.

7. Goede communicatie gaandeweg het transitietraject.
8. Aansluiting zoeken bij communicatiekanalen van stakeholders zoals WVF, FDV en KNGF.
9. Contact onderhouden met de Kring van Beroepspensioenfondsen (verbinden, monitoren en signaleren).
10. Intensievere begeleiding voor deelnemers vanwege het uitstel van de transitiedatum van 1 januari 2025 naar 1 juli 2025.
11. Informatievoorziening voor komende pensioengerechtigden die vóór of vlak na de nieuwe transitiedatum van 1 juli 2025 met pensioen gaan.
12. Gerichte communicatie naar specifieke doelgroepen vanwege het uitstellen van de transitiedatum naar 1 juli 2025.
13. Het uitbrengen van een statement waarin wordt benadrukt dat zorgvuldigheid voorop staat bij het verschuiven van de transitiedatum naar 1 juli 2025.
14. Het dagelijks bestuur ontvangt wekelijks een overzicht van Wtp-bezwaren.
15. Het dagelijks bestuur beoordeelt de ontvangen Wtp-bezwaren en past zo nodig de communicatie aan.

Kans	Impact	Netto risico
2	4	8

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico buiten de risicobereidheid valt van het fonds ondanks de aanwezige beheersmaatregelen. Dit risico krijgt de benodigde aandacht binnen het bestuur gezien het beeld en sentiment van de gehele pensioensector. Tegelijkertijd is het bestuur van mening dat het weinig invloed kan uitoefenen op externe factoren. Het bestuur heeft gedaan wat redelijkerwijs kan worden verwacht. Om deze reden heeft het bestuur besloten het restrisico te accepteren.

3.3.2 Communicatie aan deelnemers is niet adequaat (risico 2 risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

Het risico dat SPF er via zijn communicatie-activiteiten niet in slaagt om de deelnemer comfort te geven over diens huidige en/of toekomstige pensioensituatie. De pensioenregeling en de keuzes die hierbij zijn gemaakt blijken niet uitlegbaar.

Kans	Impact	Bruto risico
3	3	9

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Opstellen communicatieplan en kalender.
2. Wettelijke eisen volgen en in kaart brengen o.a. AFM-eisen.
3. Concept uitingen (meermaals) toetsen met deelnemers.
4. Inschakelen externe communicatiedeskundige (t/m 2023).
5. Aansluiting zoeken bij communicatiekanalen van stakeholders zoals WVF, FDV en KNGF.

Kans	Impact	Netto risico
1	3	3

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico binnen de risicobereidheid valt van het fonds en accepteert het restrisico. Uiteraard blijft er aandacht voor de opvolging en monitoring van de beheersmaatregelen.

3.3.3 Langere doorlooptijd van het wetgevingstraject en/of tussentijdse inhoudelijke veranderingen in de voorgenomen wetgeving (risico 3 in risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

Het wetgevingstraject zorgt voor vertraging in de projectvoortgang en/of er worden onvoorziene veranderingen in de concept-wetgeving doorgevoerd (nu vaart SPF op concept-wetgeving). Door de vertraging in de Tweede Kamer is dit risico toegenomen.

Kans	Impact	Bruto risico
4	3	12

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Monitoren wetgevingstraject.
2. Tijdig een plan B opstellen met aangepaste tijdlijnen.
3. Bij de Pensioenfederatie: invloed uitoefenen via lobby.
4. Zelf alles in gereedheid brengen om, zodra de wet- en regelgeving definitief is, meteen door te gaan met het implementatietraject.
5. Het wetgevingstraject zorgt voor vertraging in de projectvoortgang en/of er worden onvoorziene veranderingen in de concept-wetgeving doorgevoerd (nu vaart SPF op concept-wetgeving). Door de vertraging in de Tweede Kamer is dit risico toegenomen.

Kans	Impact	Netto risico
3	3	9

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico buiten de risicobereidheid valt van het fonds ondanks de aanwezige beheersmaatregelen. Dit risico krijgt de benodigde aandacht binnen het bestuur gezien de ontwikkelingen in de politiek. Tegelijkertijd is het bestuur van mening dat het beperkte indirecte invloed kan uitoefenen op externe factoren. Het bestuur heeft gedaan wat redelijkerwijs kan worden verwacht. Om deze reden heeft het bestuur besloten het restrisico te accepteren.

3.3.4 Onvoldoende doorlooptijd of een niet volledig besluitvormingsproces voor DPF, fondsorganen en sleutelfunctiehouders (risico 4 in risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

Het risico dat er onvoldoende doorlooptijd is, of een niet volledig besluitvormingsproces voor DPF, fondsorganen en sleutelfunctiehouders.

Kans	Impact	Bruto risico
4	4	16

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Planning opstellen rekening houdend met uitloop. Waarbij verschillende scenario's en mogelijke opties wordt rekening gehouden. Waardoor we kunnen voorkomen, en daar waar we niet kunnen voorkomen snel kunnen schakelen.
2. Planning doorleven met alle betrokkenen en expliciet commitment vragen.
3. Tijdig plan B opstellen met aangepaste tijdlijnen.
4. Communicatie en kortcyclisch werken met de fondsgremia.
5. Zorgvuldige planning goed monitoren.

6. Stakeholdermanagement DPF en SPF.
7. Werkzaamheden over meer personen verdelen.
8. Het te verrichten werk wordt verdeeld over meerdere adviseurs.
9. Beelvormende sessies van het bestuur rondom de 'GO - No Go'-besluiten.

Kans	Impact	Netto risico
3	2	6

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico binnen de risicobereidheid valt van het fonds en accepteert het restrisico. Uiteraard blijft er aandacht voor de opvolging en monitoring van de beheersmaatregelen.

3.3.5 Het risico dat de afstemming over de transitie met de toezichthouders stroef verloopt (risico 13 risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

Het risico bestaat dat de afstemming over de transitie met de toezichthouders stroef verloopt. Dit kan leiden tot vertragingen in de geplande transitie en reputatieschade voor SPF.

Kans	Impact	Bruto risico
4	4	16

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Vroegtijdig in gesprek gaan met de toezichthouders.
2. Monitoring van richtlijnen en regelgeving.
3. Tijdige aanlevering van documentatie aan de toezichthouders.
4. Goed onderling contact met de toezichthouders.
5. Afstemming met andere pensioenfondsen die als eerste de overgang naar de Wtp willen maken.
6. Zo veel mogelijk aansluiten bij de bestaande kaders.
7. Deelname aan Platform Pensioentransitie van AFM en DNB.
8. Intensieve samenwerking SZW, afstemming met het AFM-platform + extra capaciteit ingeregeld.

Kans	Impact	Netto risico
4	3	12

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico buiten de risicobereidheid valt van het fonds ondanks de aanwezige beheersmaatregelen. Het bestuur acht het verminderen van dit risico noodzakelijk en heeft (aanvullende) actie ondernomen. Het bestuur heeft aanvullende gesprekken en afstemming met DNB én hanteert bij het beoordelen van het proces de recent gepubliceerde Guidelines en Good Practices. Het ontvangen van een beschikking van DNB is voorwaardelijk voor de transitie per 1 juli 2025. Het bestuur acht daarmee het restrisico acceptabel.

3.4 Juridische en privacy risico's

Het bestuur van SPF heeft vastgesteld dat de volgende juridische risico's zich voor, tijdens en/of na de transitie kunnen voordoen:

- De deelnemer start een juridische procedure in verband met de overgang naar de nieuwe pensioenregeling
- Tijdens de procedure op weg naar het nieuwe pensioencontract is sprake van onzorgvuldige besluitvorming

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op deze risico's.

3.4.1 De deelnemer start een juridische procedure in verband met de overgang naar de nieuwe pensioenregeling (risico 7 risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

Het risico dat de deelnemer vindt dat zijn aanspraken niet juist zijn vastgesteld c.q. ontevreden is met de uitkomst en een juridische procedure start tegen het pensioenfonds met gevolgen voor reputatie en draagvlak.

Kans	Impact	Bruto risico
3	3	9

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Nadere duiding vanuit wetgeving volgen.
2. Eigen juridische toetsing uitvoeren.
3. Communicatie over invaren inrichten en wegnemen van zorgen bij belanghebbenden (stakeholdermanagement richting deelnemersgroepen).
4. Design en rekenmethodie keuze goed uitvoeren en onderbouwen.
5. Aparte controle aansluiting bestanden voor en na invaren door SF IA of externe accountant.

Kans	Impact	Netto risico
3	2	6

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico binnen de risicobereidheid valt van het fonds en accepteert het restrisico. Uiteraard blijft er aandacht voor de opvolging en monitoring van de beheersmaatregelen.

3.4.2 Tijdens de procedure op weg naar het nieuwe pensioencontract is sprake van onzorgvuldige besluitvorming (risico 8 in risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

De belangen van alle (gewezen) deelnemers moeten behartigd worden. Mogelijke scenario's: de genomen bestuursbesluiten zijn niet in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, er is geen adviesaanvraag gedaan bij het VO, de belangen van de verschillende deelnemersgroepen zijn onvoldoende goed afgewogen waardoor de besluitvorming als niet evenwichtig kan worden beschouwd, generatie-effecten zijn niet goed meegenomen, er is sprake van onvoldoende transparantie of er worden onrealistische verwachtingen gewekt over het nieuwe pensioenstelsel en het pensioen van deelnemers doordat de informatie niet correct, duidelijk, tijdig of evenwichtig is. Gebleken is dat de door de ALV vastgestelde wijzigingen in de statuten van DPF in de afgelopen jaren niet zijn geformaliseerd door het verlijden van een akte van statutenwijziging bij de notaris. Dit zal alsnog op korte termijn gebeuren. Dit wekt de schijn op van mogelijke manipulatie.

Kans	Impact	Bruto risico
2	4	8

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Planning: er ligt een projectplan waarin de belangrijkste stappen zijn opgenomen.
2. Projectgroepen: er zijn verschillende werkgroepen en een projectstuurgroep ingericht.
3. Onderzoek: naar o.a. de risicohouding van de deelnemers, datakwaliteit, mogelijkheden t.a.v. het beleggingsbeleid.

4. Externe adviseurs: Er wordt professioneel advies ingewonnen op basis waarvan de besluitvorming kan plaatsvinden.
5. Betrekken intern toezicht/VO/DPF: Alle partijen die betrokken zijn bij de transitie naar een nieuw pensioencontract worden tijdig geïnformeerd en in staat gesteld hun rol uit te voeren.
6. Kennis Bestuur/VO: de gremia van het pensioenfonds en de individuele bestuursleden worden gestimuleerd om hun kennis te verbreden en te verdiepen. Ook is er aandacht voor de tendens in de pensioenmarkt.
7. In de communicatie ten aanzien de formele statutenwijziging nadrukkelijk communiceren wat de feitelijke beslismomenten zijn geweest bij de ALV en welke concrete besluiten daarbij zijn genomen.
8. De sleutelfunctiehouders hebben ook op dit proces meegekeken en hun oordeel gegeven.
9. Het uitstellen van de transitiedatum naar 1 juli 2025.
10. Beelvormende sessies van het bestuur rondom de 'GO - No Go'-besluiten.

Kans	Impact	Netto risico
1	4	4

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico binnen de risicobereidheid valt van het fonds en accepteert het restrisico. Uiteraard blijft er aandacht voor de opvolging en monitoring van de beheersmaatregelen.

3.5 Vermogensbeheer risico's

Het bestuur van SPF heeft vastgesteld dat de volgende vermogensbeheer risico's zich voor, tijdens en/of na de transitie kunnen voordoen:

- Het beleggingsbeleid wordt niet goed en/of tijdig omgezet naar de eisen van de nieuwe pensioenregeling.
- Het risico dat de administratie van de portefeuilles en het beheer van de portefeuilles niet correct gebeurt en de rapportages niet correct zijn.

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op deze risico's.

3.5.1 Het beleggingsbeleid wordt niet goed en/of tijdig omgezet naar de eisen van de nieuwe pensioenregeling (risico 11 in risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

Achmea IM heeft geen ervaring met het inrichten van de gevraagde beleggingsmixen op deze grote schaal. Er kan een onjuiste vertaling plaatsvinden van de risicohouding van deelnemers naar beleggingsmix. Of het nieuwe beleggingsbeleid sluit niet of niet voldoende aan bij de ambitie, risico en premie.

Tegenvallers in de vormgeving van het vermogensbeheer kunnen zijn de waardering en verhandelbaarheid van illiquide beleggingen.

Kans	Impact	Bruto risico
2	4	8

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. ALM driemaal uitvoeren op basis van premie, ambitie en risicohouding om tot een passend beleggingsbeleid te komen.
2. Vermogenstransitieplan dat is opgesteld door Achmea IM.
3. Het nog te finaliseren Operating Manual tussen APS en Achmea IM.

4. Opstellen van een risicoanalyse verhandelbaarheid illiquide beleggingen.
5. Er is een risicoanalyse uitgevoerd om de juiste omvang van de illiquide beleggingen te bepalen.
6. SPF heeft het gebruik van aandelenputopties uitgewerkt.
7. De BAC heeft analyses gemaakt voor de afbouw van de renteafdekking. Dit is besproken in de bestuursvergadering van 12 juni 2024.
8. Het uitgangspunt is om de rentehedge voorafgaand aan het invaren af te bouwen.
9. De afbouw van illiquide posities is gestart en wordt gemonitord.
10. Parkeerregels voor FPR zijn opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van SPF.
11. SPF heeft diverse analyses uitgevoerd, waaronder schokkenanalyses. Op basis hiervan is besloten om het aandelenrisico af te bouwen door middel van putopties tot het moment van invaren. Daarnaast is besloten om de huidige rentehedge van 60% te handhaven.

Kans	Impact	Netto risico
1	4	4

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico binnen de risicobereidheid valt van het fonds en accepteert het restrisico. Uiteraard blijft er aandacht voor de opvolging en monitoring van de beheersmaatregelen.

3.5.2 Het risico dat de administratie van de portefeuilles en het beheer van de portefeuilles niet correct gebeurt en de rapportages niet correct zijn (risico 12 risicoanalyse NPC)

Risico omschrijving:

Achmea IM heeft aangegeven dat ze de back en MID office activiteiten willen onderbrengen bij een Asset Service Provider (ASP). Daarnaast zal Achmea IM ook een selectie voor een nieuw front office systeem opstarten. De implementatie moet plaatsvinden in 2025. Dit is enerzijds een kosten overweging (niet onderscheidende activiteiten) en een noodzaak vanwege de ophanden zijnde overgang naar het NPC, waarbij de koppeling tussen PUO en fiduciair ontoereikend zou kunnen zijn. Het betreft ongeveer 100 fte die wel voor minimaal 3 jaar betrokken moeten blijven bij Achmea IM om de continuïteit te waarborgen. Het is niet mogelijk om deze mensen bij de ASP onder te brengen omdat deze activiteiten niet in Nederland uitgevoerd worden.

Kans	Impact	Bruto risico
3	4	12

Aanwezige beheersmaatregelen:

1. Projectplanning opstellen.
2. Externe project begeleiding door KPMG.
3. Mogelijkheid tot extra resources bij KPMG.
4. SPF voert regelmatig gesprekken met Achmea IM en APS over de voortgang van de koppeling.
5. Achmea IM en APS hebben in overleg verschillende vereisten opgesteld waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen.
6. Ruim voor de transitie voeren Achmea IM en APS een ketentest uit om te controleren of het systeem voldoet aan de opgestelde vereisten. Op deze manier kan er, indien nodig, tijdig worden bijgestuurd.
7. Er vinden regelmatig overleggen plaats tussen Achmea IM en APS om de voortgang hiervan te bewaken.
8. Achmea IM en APS hebben een operating manual opgesteld waarin de gegevensuitwisseling wordt vastgelegd.
9. COM+ blijft beschikbaar tot minimaal 1 juli 2025.

10. Nieuwe notitie opstellen over hoe SPF halverwege het jaar kan invaren en hoe het renterisico kan worden afgedekt.

Kans	Impact	Netto risico
2	4	8

Het bestuur heeft geconstateerd dat het netto risico buiten de risicobereidheid valt van het fonds ondanks de aanwezige beheersmaatregelen. Het bestuur acht het verminderen van dit risico noodzakelijk en heeft (aanvullende) actie ondernomen. Het bestuur heeft aanvullende gesprekken en afstemming met de PUO (APS) en de vermogensbeheerder (Achmea IM) over het koppelvlak en heeft hierbij de eigen vereisten neergelegd zoals intensiveren van tussentijdse rapportages (zie hiervoor paragraaf 4.3). Het gereed hebben van het koppelvlak is voor het fonds voorwaardelijk voor de transitie per 1 juli 2025. Het bestuur acht daarmee het restrisico acceptabel.

3.6 Periodiek oordeel bestuur, sleutelfunctiehouder risicobeheer en intern toezicht

De transitie naar de flexibele premiereregeling is een groot en complex traject dat afhankelijk is van externe factoren. Deze transitie vereist de inzet van veel partijen die over voldoende menskracht en expertise moeten beschikken. Het bestuur erkent dat er aanzienlijke risico's zijn verbonden aan de transitie, maar is van mening dat deze risico's op een adequate manier worden beheerst. Dit wordt bereikt door tijdig te starten met de voorbereiding en het onderzoeken van verschillende scenario's. Een zorgvuldig stappenplan met vooraf gedefinieerde ijkpunten zorgt voor een gecontroleerde overgang. Beslissende stappen worden zowel afzonderlijk als in samenhang grondig getest. De inzet en monitoring van beheersmaatregelen garanderen dat in realistische scenario's de risico's voldoende kunnen worden beperkt.

In de loop tot aan het transitiemoment per 1 juli 2025 zijn er door het bestuur diverse 'Go-NoGo'-momenten gepland waarop het bestuur vaststelt of de transitie adequaat, robuust, beheerst en integer kan plaatsvinden.


Bovenstaande conclusie over de risicoanalyse nieuw pensioencontract en de getroffen beheersmaatregelen worden door het bestuur, de sleutelfunctiehouder risicobeheer en het intern toezicht (de visitatiecommissie) gedeeld.

4 Oordeel op technische uitvoerbaarheid

4.1 Wijziging uitvoering

4.1.1 Belangrijkste wijzigingen in de taken en verantwoordelijkheden van de pensioenuitvoerder en partijen in de vermogensbeheerketen

Onder de Wtp en met name binnen de FPR is een veel grotere afhankelijkheid tussen pensioenbeheer en vermogensbeheer. Onderstaande figuur geeft op hoofdlijnen de reis van de euro voor een deelnemer binnen de FPR weer.

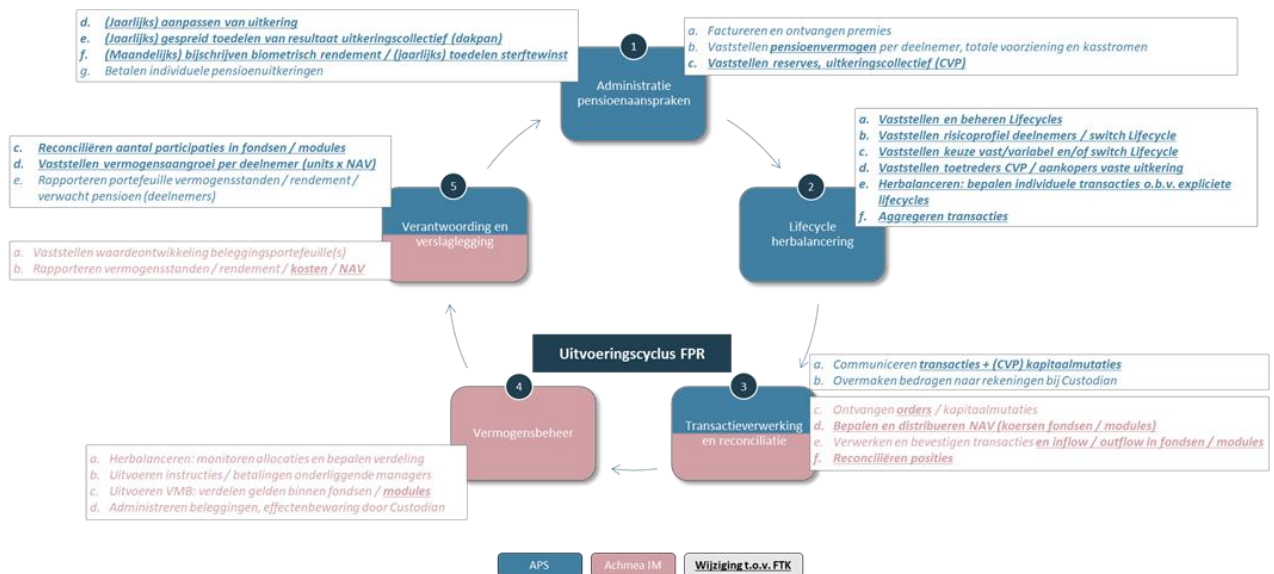

Uitvoering van de pensioenregeling

De periodieke uitvoeringscyclus binnen de FPR start met het factureren van de deelnemers en vervolgens het incasseren van de pensioenpremies. Bij 'actual payment', worden de pensioenpremies pas belegd en gaan deze pas renderen vanaf het moment dat de premie daadwerkelijk is betaald. Actual payment is evident voor beroepspensioenfondsen, aangezien de deelnemer zelf premieplichtig is en de premie niet aan het individuele pensioenvermogen kan worden toegevoegd als de deelnemer zelf niet de premie voldoet. Vervolgens worden alle overige deelnemer- en overige mutaties in de pensioenadministratie verwerkt. Waar binnen het FTK vervolgens aanspraken worden vastgesteld is binnen de FPR sprake van het vaststellen van de individuele pensioenvermogens, reserves (waaronder de risicodelingsreserve) en de pensioenaanspraken / het pensioenvermogen van het uitkeringscollectief (ook wel de collectief variabele pensioenuitkering of CVP genoemd).

Herbalanceren van de lifecycle

Als onderdeel van expliciet leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid vindt een extra activiteit plaats in de pensioenadministratie namelijk: het herbalanceren van de lifecycle. Dit is een activiteit die primair betrekking heeft op de individuele pensioenvermogens van deelnemers. Daarom is de lifecycle herbalancering, die bottom-up volgt uit de deelnemersadministratie, een primaire verantwoordelijkheid van APS. Teneinde de lifecycle herbalancering uit te kunnen voeren zijn naast een aantal vooraf gedefinieerde lifecycle profielen een aantal deelnemergegevens vereist zoals de geboortedatum, het risicoprofiel en de voorkeur voor vast of variabel pensioen. De geboortedatum staat vanzelfsprekend vast, maar de andere twee kunnen door deelnemers worden aangepast.

Leeftijd

Op basis van de leeftijd bepaalt APS of de deelnemer een andere leeftijdsafhankelijke beleggingsmix dient te krijgen en of er mogelijk met een deel van het vermogen een aandeel in de CVP moet

worden aangekocht. Ook kan sprake zijn van deelnemers die op pensioendatum kiezen voor een bij een verzekeraar in te kopen vaste uitkering. In dat geval treedt deze deelnemer uit het fonds.

Risicoprofiel

Deelnemers kunnen periodiek hun risicoprofiel aanpassen door het invullen van de beleggingsbalans. De beleggingsbalans geeft inzicht in de relatie tussen risico en rendement en helpt de deelnemer bij het kiezen van het risicoprofiel dat bij hem of haar past. Door de beleggingsbalans (opnieuw) in te vullen kan een deelnemer in een andere lifecycle terecht komen.

Als de correcte uitgangssituatie is vastgesteld start APS de deelnemer lifecycle herbalanceren. Per deelnemer wordt bepaald welke aan- en verkopen er moeten worden uitgevoerd (cash-allocatie) om premies te beleggen, pensioen uit te keren of de beleggingsmix bij te sturen conform de lifecycle (herbalanceren). In de laatste stap voor het uitsturen van de aan- en verkoopopdrachten worden al deze individuele beleggingsmutaties geaggregeerd tot één verzamelorder per onderliggend beleggingsbouwblok.

Verwerken van transacties

Het transactieverwerkingsproces bestaat voor de opbouwfase van de FPR uit het communiceren van de verzamelorder per beleggingsbouwblok aan Achmea IM, alsmede het vervolgens betalen van de te beleggen premies naar de rekening behorende bij de betreffende beleggingsbouwblokken (fondsen / administratieve pools), of laten overboeken van de betreffende middelen vanuit de beleggingsbouwblokken naar de operationele rekening van het pensioenfonds. Voor het CVP geldt over het algemeen dat deze opereren als een FTK portefeuille, waarin sprake is van aanspraken, een dekkingsgraad en een kasstroomprofiel. Voor het CVP geldt dan ook dat sprake is van een kapitaalmutatie; een storting of onttrekking zonder specificatie waar ze in belegd of aan onttrokken wordt. De fiduciair zal de gelden beleggen binnen de kaders van de beleggingsrichtlijnen die voor het CVP zijn opgesteld.

Na het salderen van de uit te keren pensioenen en de in te kopen kapitalen bepaalt APS hoeveel geld er moet worden gestort naar of onttrokken uit het CVP. APS instrueert Achmea IM over deze kapitaalmutatie en verstrekt tegelijkertijd het meest recente kasstroomprofiel van de verplichtingen en de dekkingsgraad. Vervolgens boekt APS de benodigde gelden naar de beleggingsrekening bij de Custodian van het pensioenfonds, of instrueert de custodian om de vrijgemaakte middelen naar de operationele rekening van het pensioenfonds over te boeken.

Zodra Achmea IM is geïnformeerd over de periodieke storting of onttrekking in het CVP dan wordt deze in de beleggingsadministratie verwerkt en start het periodieke cashallocatie- en herbalanceringsproces. Per beleggingsbouwblok voert Achmea IM de geaggregeerde order in aantallen euro's of units uit op de afgesproken handelsdatum. De volgende dag stelt de beheerder van het beleggingsbouwblok de NAV en handelskoers per unit van het bouwblok vast. Achmea IM hanteert één handelskoers systematiek. De handelskoers is de koers die aan APS teruggekoppeld wordt om de transactie te kunnen bevestigen. Naast een eventuele transactiebevestiging ontvangt APS ten behoeve van de reconciliatie ook het nieuwe aantal units en de NAV en daarmee de totale vermogenspositie van het pensioenfonds in het beleggingsbouwblok.

Het hier beschreven proces staat bekend als forward pricing: een order wordt uitgevoerd tegen de geldende marktprijs op de handelsdatum waardoor pas achteraf kan worden bepaald hoeveel units worden ontvangen per ingelede euro, of hoeveel euro's een order in units heeft gekost of opgebracht. In het proces zitten diverse waarborgen die maken dat de participant te allen tijde volledig belegd is en dat de transactie wordt uitgevoerd tegen een koers die zo wordt vastgesteld dat zittende participanten niet worden benadeeld. Om dit proces te faciliteren komen APS en Achmea IM een handelskalender overeen met die werkdagen waarop handel plaats kan vinden. Op alle werkdagen wordt een NAV vastgesteld en uitgewisseld met APS. De teruggekoppelde transactiebevestiging wordt binnen de pensioenadministratie vervolgens weer uitgesplitst naar

transacties voor de individuele pensioendeelnemers. Op basis van de koersontwikkeling (Net Asset Value) van de deelnemingsrechten (units) wordt een 1-op-1 koppeling tussen het rendement van de beleggingsbouwblokken en de individuele deelnemersportefeuilles gelegd.

Vermogensbeheer

Zoals hiervoor al aangegeven start het cashallocatie- en herbalanceringsproces voor ieder beleggingsbouwblok vanaf het moment dat Achmea IM de order van APS ontvangt. De order wordt automatisch in de administratie ingelezen en de portefeuillemanager wordt hierover geïnformeerd. De portefeuillemanager van het betreffende beleggingsbouwblok stelt vast hoe de ontvangen / te onttrekken middelen zo efficiënt mogelijk belegd / vrijgemaakt kunnen worden binnen de beleggingsrichtlijnen die voor het bouwblok zijn opgesteld. Voor de CVP portefeuille geldt, net als in het FTK, dat Achmea IM zo efficiënt mogelijk bijstuurt naar de strategische asset allocatie en renteafdekking zoals overeengekomen met het pensioenfonds in de beleggingsrichtlijnen.

Verantwoording en verslaglegging

Achmea IM en APS wisselen periodiek de vermogensstanden (#units x NAV) van de beleggingsbouwblokken uit, zodanig dat APS in staat is om de vermogensstanden in de pensioenadministratie te reconciliëren met de vermogensstanden in de beleggingsadministratie. Door periodiek de aansluiting van posities tussen de pensioen- en vermogensbeheer administratie te controleren wordt gewaarborgd dat het totale pensioenfondsvermogen in de beleggingsadministratie 1-op-1 aansluit op de optelsom van de individuele vermogens plus reserves in de pensioenadministratie. Het collectieve beleggingsbeleid van de beleggingsbouwblokken sluit hierdoor exact aan bij de optelsom van alle beleggingsmixen van alle individuele deelnemers. Deze directe koppeling maakt het mogelijk om per deelnemer een individuele beleggingsmix toe te kennen en daarin keuzevrijheid te bieden terwijl er toch collectief belegd wordt en er geen sprake is van ex-ante herverdeling. Ook levert Achmea IM informatie over de invulling van de beleggingsbouwblokken die APS vervolgens op portalen communiceert aan deelnemers.


Aan het eind van een periode stelt Achmea IM het totale fondsvermogen en het gerealiseerde rendement vast per bouwblok en zet dit in haar rapportage aan het pensioenfonds af tegen de strategische asset allocatie. Het totale vermogen in het CVP is voor APS input om de dekkingsgraad vast te stellen ten behoeve van resultaatdeling.

Administreren van de FPR

Binnen de FPR is sprake van jaarlijkse bijschrijving van biometrische rendementen en het toedelen van de sterftewinst. De periodieke cyclus in de FPR eindigt met het (jaarlijks) gespreid toekennen van het resultaat aan het uitkeringscollectief (dakpansgewijs) en het dientengevolge aanpassen van de uitkering in het CVP. Deze aanpassing van de uitkering wordt tijdig (circa 3 maanden tevoren) met deelnemers gecommuniceerd. De hieruit voorkomende verhogingen of verlagingen vinden op hetzelfde tijdstip plaats als de jaarlijkse daling of stijging van de uitkering. De periodieke cyclus eindigt met de maandelijkse uitbetaling van de pensioenuitkeringen.

Uitvoeringscyclus Flexibele Premiereregeling


Basisflow gegevensuitwisseling

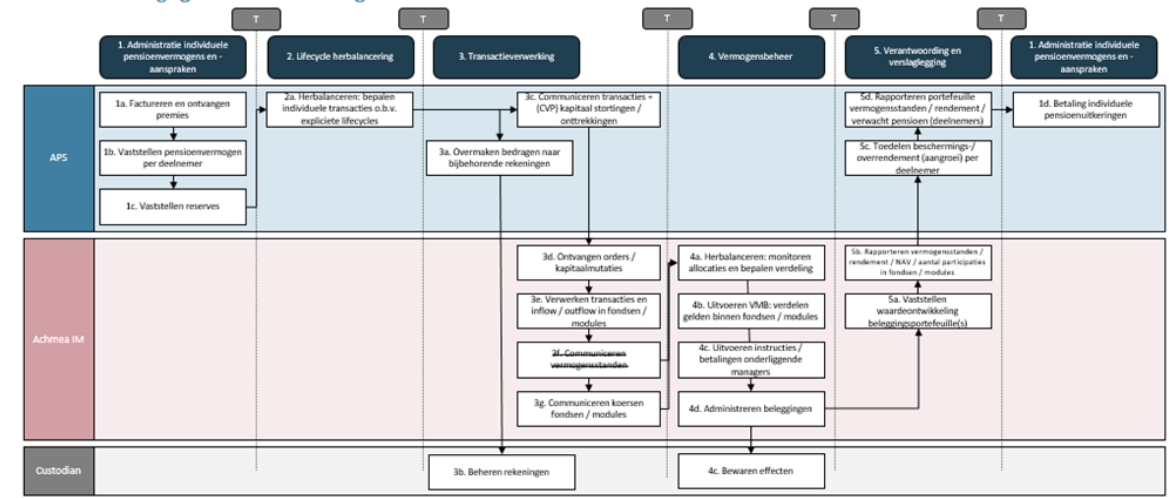


Doordat de DB-regeling een Wtp-regeling wordt, is er een directe koppeling nodig tussen de pensioenadministratie en vermogensbeheer. Dit heeft een grote impact op de taken en verantwoordelijkheden van de pensioenuitvoerder en van de partijen in de vermogensbeheerketen. APS en Achmea IM hebben al ervaring met unitizen en de aansluiting van de pensioenadministratie op de vermogensbeheeradministratie. Deze koppeling wordt voor het hele vermogen tussen APS en Achmea IM ingericht. Daarin zit ook het vermogen bij ASR. Deze aansluiting van de pensioenadministratie op de vermogensbeheeradministratie wordt fonds specifiek uitgewerkt in een Operating Manual. Deze wordt in de loop van 2025 fondsspecifiek gemaakt.

Om de koppeling tussen APS en AIM te realiseren zijn vijf deliverables onderkend:

WTP koppeling PB-VB

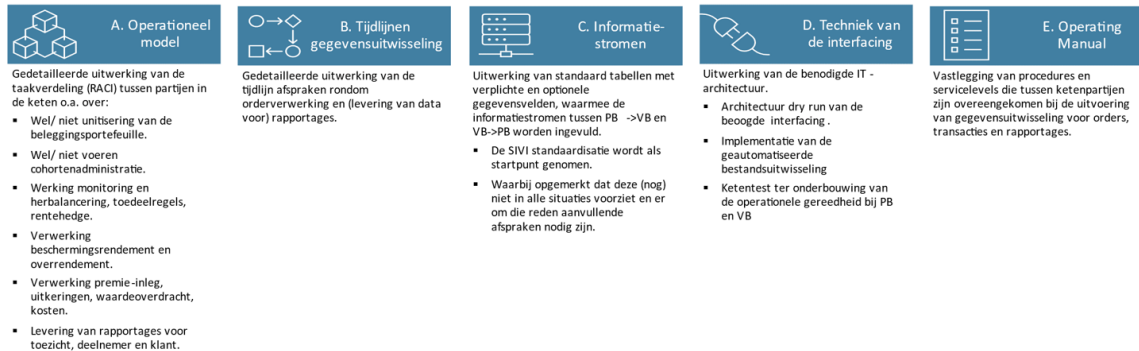

De blauwdruk voor de taakverdeling tussen de ketenpartners ziet er als volgt uit:

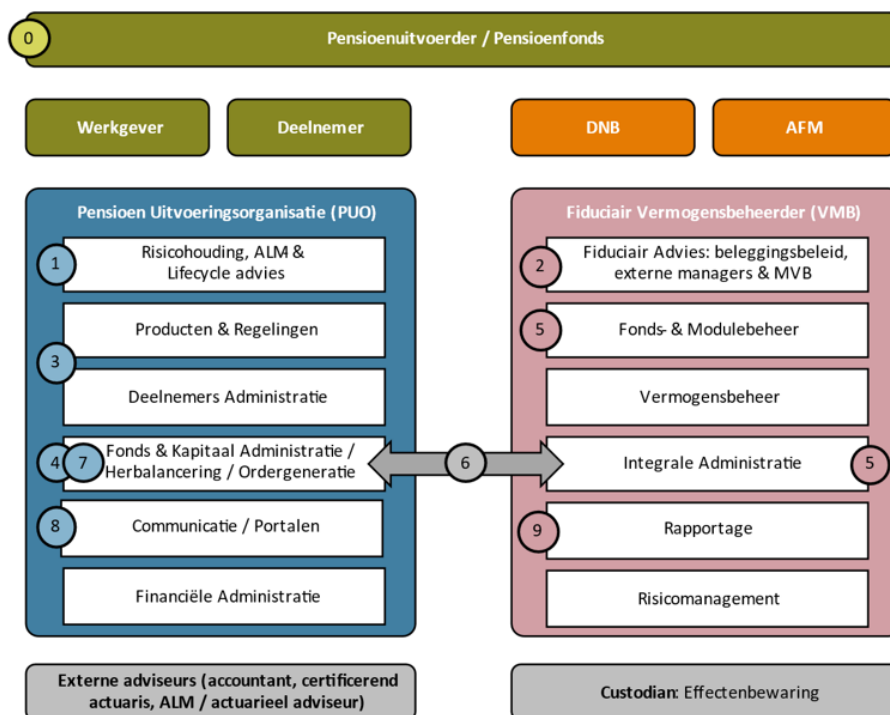

4.1.2 Continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening

APS en Achmea IM hebben voor de beheersing van de belangrijkste risico's een Control Framework (CFW) ingericht. In dit CFW zijn de belangrijkste risico's (key risks) en bijbehorende belangrijkste beheersmaatregelen (key controls) opgenomen. De belangrijkste risico's en bijbehorende belangrijkste beheersmaatregelen van APS en Achmea IM worden hieronder nader toegelicht.

Achmea Pensioenservices

APS heeft voor de beheersing van haar belangrijkste risico's haar Control Framework (CFW) ingericht. In het CFW worden, volgend op een 'Tactisch Risk Assessment' voor het organisatieonderdeel, vanuit de aandachtsgebieden Business, Compliance, Financial Reporting en IT de belangrijkste risico's (Key Risks) opgenomen en voorzien van de belangrijkste maatregelen (Key Controls) om de Key Risks te beheersen/mitigeren. Elk kwartaal worden de Key Controls beoordeeld op opzet, bestaan en effectieve werking door de verantwoordelijke (business/IT) teams (1e lijn) en het restrisico (Netto Risico) ingeschat, waarna rapportage aan de verantwoordelijke directie plaatsvindt. De afdeling Operational Risk & Compliance voert 2e lijns monitoring uit op de beoordeelde Key Controls waarbij onder andere de gehanteerde bewijslast wordt beoordeeld. Ook geeft zij haar opinie over de mate van beheersing op basis van onder andere het CFW aan de verantwoordelijke directie. De afdeling Achmea Internal Audit (3e lijn) voert aan de hand van een meerjarig Auditplan haar audits uit, waarbij op basis van het risicoprofiel van de processen ten minste 3-jarlijks processen worden geaudit door Achmea Internal Audit. De verantwoording in het CFW is hierbij één van de belangrijkste bronnen die Achmea Internal Audit hanteert.

Binnen het aandachtsgebied 'Business' zijn onder andere Key Risks geactiveerd die verband houden met de risico's ten aanzien van de juiste mensen en middelen en de wijze van besturing om de capaciteit toe te wijzen waar deze nodig is. Ook is de financiële besturing van APS (o.a. Rolling Forecast proces) hier onderdeel van. Binnen het aandachtsgebied 'IT' wordt onder andere

verantwoording afgelegd over de beheersing binnen projecten en programma's, maar ook bijvoorbeeld of wordt voldaan aan gestelde normen ten aanzien van Business Continuity Management, Crisismanagement en Logische Toegangsbeveiliging.

APS heeft binnen het aandachtsgebied 'Business' ook de Key Risks die verband houden met haar uitvoeringsprocessen opgenomen, waarbij de in de ISAE3402 opgenomen beheersingsmaatregelen op de uitvoeringsprocessen voor de pensioenfondsen, worden beoordeeld. De externe accountant voert gedurende het jaar de hiervoor benodigde controle en testwerkzaamheden uit op basis van door de teams aangeleverde controle dossiers. De resultaten van deze werkzaamheden worden vervolgens in het CFW opgenomen en zijn onderdeel van de (interne en externe) risicoverantwoordingsrapportages, welke ook gebruikt worden voor de besturing van APS.

De werkwijze met het CFW is voor APS niet gebonden aan het systeem waarop SPF wordt geadministreerd en bestaat met name de 'run' alsook de beheersing op de 'change' organisatie.

Ten aanzien van de beheersing op de uitvoeringsprocessen welke via een ISAE3402 type accountantsverklaring wordt overlegd geldt, dat op het huidige pensioenadministratiesysteem (MAIA) de aantoonbare beheersing reeds geruime tijd is ingericht. Voor het toekomstige pensioenadministratiesysteem (AllVida) geldt een overeenkomstige werkwijze als voor MAIA. Zodra het eerste pensioenfonds is geïmplementeerd op AllVida wordt toegewerkt naar een ISAE3402 type 2 accountantsverklaring om inzicht te geven in de wijze van beheersing op AllVida op basis van de relevante ingerichte processen.

Achmea IM

Achmea IM heeft voor de beheersing van haar belangrijkste risico's een Control Frame Work (CFW) ingericht. In dit CFW zijn de belangrijkste risico's (key risks) en bijbehorende belangrijkste beheersmaatregelen (key controls) opgenomen. Het CFW is ingericht naar thema's: Business (primaire bedrijfsprocessen), IT (o.a. logische toegangsbeveiliging, wijzigingenbeheer, Business Continuity) en Compliance (o.a. Ken uw cliënt).

De key risks en key controls (opzet) worden periodiek beoordeeld en bij eventuele relevante wijzigingen in processen of wet- en regelgeving herijkt. Elk kwartaal beoordelen de 1e lijn verantwoordelijken de key controls op bestaan en effectieve werking. De afdeling Operational Risk & Compliance (OR&C) voert hier 2e lijn monitoring op uit en rapporteert hierover aan de directie van Achmea IM.

Binnen het CFW heeft Achmea IM de voor klanten relevante key controls geïdentificeerd. Daarover rapporteert Achmea IM elk kwartaal in de rapportage Niet-Financiële Risico's (NFR) voor SPF en haar andere klanten. Daarnaast rapporteert Achmea IM jaarlijks over de key controls die relevant zijn voor:

- de financiële verantwoording van klanten middels de Standaard (ISAE) 3402 II rapportage en
- de DNB Good Practices Informatiebeveiliging middels de Richtlijn 3000A rapportage.
- In die twee rapportages is ook een assurance-rapport van de externe accountant opgenomen.

Achmea Internal Audit (IA) voert periodiek onderzoeken uit bij Achmea IM. Daartoe hanteert zij een meerjaren Audit Plan waarbij de processen van Achmea IM roulerend, met een frequentie die gebaseerd is op risicoanalyse, worden onderzocht. In haar onderzoeken neemt IA ook de key risks en key controls in het CFW van Achmea IM mee. IA rapporteert aan de directie van Achmea IM. Achmea IM stelt jaarlijks aan haar klanten een rapportage van IA beschikbaar waarin de uitkomsten van de audits zijn opgenomen. In die rapportage is ook het meerjaren Audit Plan opgenomen.

4.1.3 Wijzigingen in de belangrijkste bedrijfsprocessen van APS

In het kader van de migratie naar het doelsysteem AllVida is een generiek procesmodel uitgewerkt. In dat model zijn alle aan de PDC gekoppelde diensten beschreven in bedrijfsprocessen. Van ieder proces is een 'startdocument' aanwezig waarin het proces is uitgewerkt volgens een vast stramien inclusief een op het proces gerichte risicoanalyse met bijbehorende beheersmaatregelen. Met de introductie van de Wtp zijn de processen uitgebreid met de diensten voortkomend uit de nieuwe wetgeving. Daarnaast zijn bestaande processen aangevuld met de vereisten uit de Wtp.

In AllVida worden de processen volgens het generieke procesmodel ingericht. Daarnaast wordt tijdens de implementatie met de klant afgesproken welke specifieke aanvullende dienstverlening wordt toegevoegd aan het generieke procesmodel. Deze worden uitgewerkt in maatwerkoplossingen welke aanvullend zijn op de PDC en het procesmodel. Deze worden vastgelegd en ingericht in het contractmodel binnen AllVida.

4.1.4 Wijzigingen in de governance

De governance blijft in grote lijnen hetzelfde onder de Wtp. SPF blijft een paritair bestuur houden met een visitatiecommissie als intern toezicht. Ook de huidige sleutelfunctiehouders blijven betrokken. Inhoudelijk kan er een verschuiving in aandachtspunten zijn, maar ook dat blijft grotendeels gelijk.

4.1.5 Wijzigingen in de kostenstructuur

APS heeft samen met SPF de Product- en Diensten Catalogus (PDC) op 19 mei 2022 ingevuld voor zover de producten, diensten en keuzes op dat moment bekend waren. In mei 2024 heeft APS een prijsvoorstel uitgebracht. Daarbij zijn de kosten uitgesplitst over pensioenuitvoering en adviesdiensten. De kosten stijgen licht ten opzichte van de huidige pensioenuitvoeringskosten. De besprekingen over het contract lopen nog.

De implementatie van de FPR zorgt ervoor dat er aanpassingen nodig zijn binnen de beleggingsportefeuille. De portefeuille zal op hoofdlijnen bestaan uit een tweetal administratieve portefeuilles ("Modules") voor SPF, te weten de module Rendement en de module Rente. Achmea IM verzorgt het beheer van deze modules voor SPF, dit omvat onder andere de administratie, waaronder dagelijkse NAV berekening en transactieverwerking, rapportage en beleid. De jaarlijkse kosten voor deze aanvullende dienstverlening door Achmea IM zijn 14 juni 2023 door het bestuur akkoord bevonden. De beheerkosten in euro van de totale (onderliggende) beleggingsportefeuille worden naar verwachting lager, doordat in de verwachte FPR portefeuilleverdeling sprake is van een lagere allocatie naar 'duurdere' illiquide beleggingen dan de huidige portefeuille. De fiduciaire kosten en de vergoedingen per manager, de bestaande fondsen en mandaten en dergelijke, blijven gelijk.

Kosten van de transitie

De kosten die APS maakt voor het implementeren van het nieuwe IT systeem AllVida exclusief benodigde aanpassingen voor de Wtp, neemt APS voor haar rekening. Dit geldt ook voor de kosten die gemaakt worden voor de datamigratie van MAIA naar AllVida.

De kosten die APS maakt in het kader van de Wtp worden aan de klanten van APS doorbelast. Deze kosten bestaan uit tien werkpakketten waarbij voor elk werkpakket een range is vastgesteld waarbinnen de kosten zich naar verwachting zullen bevinden.

Door de transitie naar de Wtp, gaan alle actieve deelnemers over naar een beschikbare premieregeling. Het gevolg daarvan is dat in het algemeen het beleggingsrisico meer bij de deelnemers komt te liggen. Voor beroepspensioenfondsen lag het beleggingsrisico feitelijk al bij de deelnemer. Het onderhevig zijn aan beleggingsrisico is relevant voor de toepassing van de btw-vrijstelling door APS. De wetgever heeft aangegeven dat bij de nieuwe premieregelingen de btw-vrijstelling voor deze dienstverlening geldt voor zowel de opbouwfase als de uitkeringsfase, tenzij er

in de uitkeringsfase wordt gekozen voor een vaste uitkering (premie-uitkeringsovereenkomst). Kortom, onder voorwaarden is de btw-vrijstelling op dienstverlening APS van toepassing als het pensioenfonds de nieuwe regeling uitvoert.

Maar de werkzaamheden t.b.v. de implementatie naar het nieuwe pensioenstelsel starten nu. De vraag is of de btw-vrijstelling van het beheer van collectief vermogen ook nu al geldt voor de transitiedienstverlening. APS meent dat de transitiedienstverlening kwalificeert als het beheer. Hamvraag is wat APS betreft of het voor de vrijstelling voldoende is dat de werkzaamheden worden toegerekend aan het collectief vermogen dat (later) ontstaat in het nieuwe pensioenstelsel. In Kamervragen is dit aspect aan de orde geweest, maar de beantwoording laat qua duidelijkheid te wensen over.

APS meent dat er sterke argumenten zijn vóór toepassing van de btw-vrijstelling, met de kanttekening dat dit voor discussie vatbaar kan zijn. Daarom is APS met de Belastingdienst hierover in overleg gegaan. De Belastingdienst heeft begrip voor dit standpunt en heeft aangegeven dat de toepassing van de btw-vrijstelling intern wordt besproken (in algemene zin) en dat de Belastingdienst later zal komen met een zienswijze/standpunt (c.q. het staat APS vrij om hier later dit jaar opnieuw naar te vragen). Op basis hiervan stelt APS voor om per 2023 de transitiedienstverlening vrijgesteld van btw te factureren, met eventueel een deel van de vergoeding met btw indien er is gekozen voor een vaste uitkeringsfase.

In de bestuursvergadering van 17 mei 2023 is de inschatting en onderbouwing van de eenmalige transitievergoeding voor overgang naar FPR door Achmea IM toegelicht. Deze kosten zijn akkoord bevonden door het bestuur en worden gespreid, in 2023 en 2024, in rekening gebracht. Dit is vastgelegd in een WTP addendum bij de overeenkomst met Achmea IM.

4.2 Haalbaarheidsanalyse

In deze paragraaf worden de criteria benoemd die SPF hanteert om de (technische) uitvoerbaarheid van de nieuwe regeling door de uitbestedingspartijen vast te stellen, evenals de wijze waarop aan deze criteria invulling wordt gegeven. Om inzicht te bieden in de effectiviteit van de beheersmaatregelen, zijn in deze analyse zowel het bruto als het netto risico benoemd, evenals het restrisico en de (mogelijke) acceptatie hiervan. Bij de beoordeling heeft het bestuur vastgesteld dat het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen.

SPF herijkt periodiek de haalbaarheidsanalyse. De laatste versie van deze analyse is door het bestuur vastgesteld op 5 februari 2025. Eerdere herijkingen hebben plaatsgevonden op 13 september 2023, 12 juni 2024, 3 juli 2024 en 17 juli 2024. De voorbereiding op de herijking van de haalbaarheidsanalyse is verzorgd door een werkgroep bestaande uit bestuurders en bestuursondersteuning. De sleutelfunctiehouders risicobeheer en internal audit zijn tijdens dit proces periodiek betrokken geweest.

Om tot een gedegen herijking van de haalbaarheidsanalyse te komen, zijn de volgende voorbereidingen getroffen door de werkgroep:

1. Het opvragen van de meest recente versie van verschillende documenten bij de uitbestedingspartijen APS en Achmea IM.
2. Het verzamelen van de meest recente documenten die niet in beheer zijn bij de uitbestedingspartijen: risicoanalyse nieuw pensioencontract (uitgevoerd door SPF) en de meest recente Quality Assurance (QA) rapportage APS van Eraneos.
3. De sleutelfunctiehouder risicobeheer is gevraagd om een opinie te schrijven ten aanzien van de haalbaarheidsanalyse.

Voor de haalbaarheidsanalyse is de volgende legenda door het bestuur gebruikt:

Kans x impact	Duiding	Kleur
Laag	Risico beperkt, geen extra monitoring van het bestuur vereist.	Groen
Midden	Risico acceptabel, extra monitoring van het bestuur vereist.	Geel
Aanzienlijk	Risico niet acceptabel, mitigatie van het risico vereist voor de transitiedatum van 1 juli 2025.	Oranje
Hoog	Risico onacceptabel, directe mitigatie van het risico vereist.	Rood

In de volgende paragrafen worden de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de regeling DPF, de haalbaarheidscriteria voor de technische uitvoerbaarheid van de regeling door APS en Achmea IM uitgewerkt. Tot slot volgt de conclusie van het bestuur.

4.2.1 Haalbaarheid uitvoerbaarheid regeling DPF

Beoordelingscriteria	Bruto risico	Norm	Mitigerende maatregelen	Netto risico	Restrisico en acceptatie
1. Voldoen aan wet- en regelgeving		Wtp & lagere regelgeving.	- De FPR voldoet aan de Wtp & lagere regelgeving. SPF en DPF hebben gezamenlijk het traject van de totstandkoming van de regeling doorlopen, met ondersteuning van actuarissen en adviseurs van Willis Towers Watson (WTW) en APS. Bovendien heeft pensioenjurist Erik Lutjens specifieke onderdelen beoordeeld. Het inrichtingsdocument is daarnaast getoetst door de afdeling juridische afdeling (JZ). - SPF is in overleg met DNB over de uitwerking van de risicohouding, de doelstellingen, maatstaven en bandbreedtes (DMB) en de kostenvoorziening.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. SPF acht het restrisico acceptabel, omdat SPF verwacht op korte termijn overeenstemming met DNB te bereiken over de nog openstaande punten.
2. Evenwichtig		- Het evenwichtigheidskader dat is opgenomen in het document doelstellingen, maatstaven en bandbreedtes voldoet aan de Leidraad evenwichtigheid van SZW. - Dekkingsgraad op moment van invaren valt binnen het afgesproken evenwichtigheidskader.	- Het evenwichtigheidskader is opgesteld in samenspraak met de opdrachtgever (DPF). Het VO is geconsulteerd en heeft haar goedkeuring aan het evenwichtigheidskader gegeven. Het evenwichtigheidskader van SPF is getoetst aan de Leidraad evenwichtigheid van SZW. De toetsing is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. - Het evenwichtigheidskader voldeed voor dekkinggraden onder de 105% niet aan het wettelijk kader. Op 3 juli 2024 is het aangepaste kader, dat wel voldoet aan de wet- en regelgeving, vastgesteld door het bestuur van SPF. Het VO heeft ten aanzien van dit besluit positief advies gegeven en DPF heeft ingestemd met het aangepaste kader.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. Het risico is gemitigeerd, omdat het evenwichtigheidskader van SPF voldoet aan wet- en regelgeving en alle gremia akkoord hebben gegeven.
3. Complete en heldere afspraken		Complete en heldere afspraken voldoen aan wet- en	Alle onderdelen van de opdracht van DPF zijn opgenomen in het		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met

		regelgeving. • Pensioenreglement en inrichtingsdocument zijn volledig en duidelijk. • Positief oordeel door jurist, en door actuarieel- en communicatieadviseur op pensioenreglement.	pensioenreglement en inrichtingsdocument. • Het pensioenreglement is voor 99% af. Dit reglement wordt vastgesteld door het bestuur na een positief oordeel van de jurist, actuaire en communicatieadviseur. Het pensioenreglement wordt geschreven op B1-niveau. • Het inrichtingsdocument is opgesteld door een actuaire, gebaseerd op een fit-gap-analyse van het oude en nieuwe pensioenreglement en is getoetst aan de PDC-lijst van APS. • Herijking van doelstellingen, maatstaven en bandbreedtes is vastgesteld door het bestuur en afgestemd met DPF. • DPF heeft een nieuw transitieplan opgesteld.		de toegepaste beheersmaatregelen. Het risico is gemitigeerd, omdat SPF op 19 februari 2025 de 99%-versie van het pensioenreglement gaat vaststellen. De laatste openstaande punten zijn met DPF afgehecht in de vergadering op 30 januari 2025 en verwerkt in het aangepaste transitieplan. De definitieve vaststelling van het pensioenreglement vindt plaats tijdens de laatste bestuursvergadering voor de transitiedatum van 1 juli 2025.
4. Passend bij voorkeuren deelnemers		• Wensen DPF (zie ook het transitieplan). • Uitkomst stemronde DPF. • Uitvragen SPF (o.a. risicopreferentie en polls).	• De regeling is conform de wensen van DPF en blijft zo dicht mogelijk bij de huidige regeling. Dat zijn onder andere het premieniveau, de ambitie en de flexibiliseringsmogelijkheden. • In de regeling wordt het nabestaandenpensioen ingeregeld conform de uitkomst van de stemronde. • Bij het bepalen van de risicohouding zijn alle deelnemers met alle schuifstanden meegenomen. • Het proces is én uitkomsten zijn voortdurend getoetst bij het VO en DPF.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. Het risico is gemitigeerd, omdat SPF zo dicht mogelijk bij de huidige regeling is gebleven en dit continu getoetst is bij het VO, DPF en de deelnemers.

5. Uitvoerbaar		• Uitvoerbaar (op de lange termijn) volgens SPF. • Aansluiten bij producten die in de markt beschikbaar zijn. Bij voorkeur bij de standaard van uitbestedingspartijen APS en Achmea IM.	• De regeling is zo eenvoudig mogelijk. • De basisregeling is voor iedereen van toepassing. • De BasisPlusregeling is een gesloten regeling. Deelnemers hebben de mogelijkheid om terug te gaan naar de basisregeling. • Het aantal overgangsbepalingen is minimaal. • Er is aangesloten bij de standaarden van APS en Achmea IM. Hiertoe is een deskundige van APS voor de nieuwe regeling vroegtijdig bij het project betrokken. • De PDC-lijst van APS is gevolgd bij de inrichting van de regeling. • Vroegtijdig hebben de key persons, die veel ervaring hebben met de administratie van SPF, meegekeken naar de uitvoerbaarheid van de nieuwe regeling en zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe IT-systeem. Dit wordt altijd multidisciplinair opgepakt: deelnemersadministratie, juridische zaken en communicatie worden hierbij betrokken. • Tijdens de detailanalyse van de nieuwe regeling is bevestigd dat de regeling conform de wensen van SPF ingericht kan worden. • Er zijn afspraken gemaakt voor de implementatie van de nieuwe regeling met de uitbestedingspartijen in het migratieplan en vermogenstransitieplan. • Nauwe afstemming met DPF en de afdeling communicatie met betrekking tot de communicatie richting de deelnemers.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. Het risico is gemitigeerd, omdat uit de genomen beheersmaatregelen blijkt dat de regeling van SPF uitvoerbaar is en past binnen de standaard van APS. De paar openstaande vragen zijn in scope van het bestuur en worden op korte termijn opgelost.
6. Zorgplicht		• Leidraad communicatieplan van de AFM. • Leidraad keuzebegeleiding van de AFM.	• Het communicatieplan SPF is geschreven op basis van de Leidraad communicatieplan van de AFM. • Het beleid keuzebegeleiding is vormgegeven conform de leidraad		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. Het risico is gemitigeerd, omdat SPF door de beheersmaatregelen en de opzet

			keuzebegeleiding van de AFM. • Alle communicatie uitingen worden getoetst aan de opmerkingen die de AFM gemaakt heeft. • Er is een hernieuwd communicatieplan opgesteld, dat gelijktijdig met het nieuwe implementatieplan wordt ingediend bij de AFM. • Beperkt aantal keuzemogelijkheden met passende defaults. • Keuzebegeleiding wordt zorgvuldig door APS ingericht. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarbij pensioenfondsen input op de deliverables kunnen geven. • Aan de communicatiecommissie worden opzet van de keuzebegeleiding en diverse uitingen voorgelegd, waarna de commissie input kan leveren, op basis waarvan dit wordt aangepast, al dan niet fondsspecifiek.		van de keuzebegeleiding aan de zorgplicht kan voldoen. Daarnaast voldoet het communicatieplan aan de leidraad van de AFM.
7. Kosten		• Marktconform voor pensioenadministratie en vermogensbeheer. • De transitiekosten worden getoetst op redelijkheid.	• Er is nog geen duidelijkheid over wat marktconform is. Voor de nieuwe 'run' kosten worden de kosten daarom vergeleken met de huidige kosten. • Voor alle transitiekosten wordt een onderbouwing van de bestede uren en het uurtarief geëist. Waar mogelijk worden meerdere offertes opgevraagd en gemonitord. • Heldere afspraken over de transitiekosten zijn vastgelegd in de projectovereenkomst met APS inclusief een early movers korting. • Voor de nieuwe pensioenbeheerovereenkomst wordt ook gesproken over een early movers korting.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. Het risico is gemitigeerd, doordat heldere afspraken in de transitieovereenkomst zijn vastgelegd. SPF blijft de kosten voor pensioenadministratie in de markt monitoren. De laatste aanpassingen moeten nog worden verwerkt in de projectovereenkomst met APS. SPF verwacht hierbij geen moeilijkheden.
8. Uitlegbaar		• De regeling sluit aan bij de opdracht van DPF. • De regeling is mede gebaseerd op de uitkomsten van het RPO.	• Doordat de keuzes dicht bij de huidige regeling blijven, vindt het bestuur dat deze uitlegbaar is. • Het bestuur vindt de regeling		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. Het risico is

		• Keuzes/afwegingen en risico's zijn voor deelnemers en het pensioenfonds te begrijpen.	uitlegbaar. Ook heeft het VO een positief oordeel gegeven over de regeling inclusief de uitlegbaarheid. Gedurende het gehele proces zijn het VO en DPF geconsulteerd.		gemitigeerd, omdat SPF zo dicht mogelijk bij de huidige regeling is gebleven en dit continu getoetst is bij het VO, DPF en de deelnemers.
--	--	---	---	--	---

4.2.2 Haalbaarheidscriteria technische uitvoerbaarheid van de regeling door APS

Beoordelingscriteria	Bruto risico	Norm	Mitigerende maatregelen	Netto risico	Restrisico en acceptatie
1. Tijdigheid		• APS heeft in voldoende mate rekening gehouden met de tijdslijnen van de transitie. • Er is een gedetailleerd draaiboek, een planning en een fallback scenario aanwezig. • Er is een schriftelijke vastlegging van de commitment van APS op de transitie per 1 juli 2025.	• APS heeft een gedetailleerde planning opgesteld die rekening houdt met de tijdslijn van de transitie inclusief diverse 'Go / No-Go'-besluitmomenten en verschillende fasen. • APS heeft naast de gedetailleerde planning ook fallback-scenario's opgesteld die in werking treden bij verschillende mogelijke vertragingen of problemen tijdens de transitiefasen. • Aan het einde van de voorbereidingsfase wordt tussen SPF en APS een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de wederzijdse commitments worden vastgelegd. • Eraneos voert onafhankelijke reviews uit. • Er zijn extra 'Go / No-Go'-momenten opgenomen in het migratieplan. Het eerstvolgende 'Go / No-Go'-besluit voor een transitie per 1 juli 2025 wordt door het bestuur genomen eind mei 2025. • SPF en APS hebben 'Go / No-Go'-criteria opgesteld. Dit is onder andere uitgewerkt in het migratieplan.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. SPF acht het restrisico op dit moment onacceptabel. APS heeft een nieuwe datagerichte werkwijze gepresenteerd aan SPF, die zich nog moet bewijzen. Het volgende 'Go / No-Go'-moment is eind mei 2025 gepland. SPF is van mening dat er in de eerste helft van april, zo snel mogelijk na de PI dagen van APS, duidelijkheid moet zijn over de effectiviteit van de nieuwe datagerichte werkwijze bij APS waarbij er op dat moment een realistische inschatting gemaakt moet kunnen worden over de haalbaarheid van de transitiedatum van 1 juli 2025. Een aangepaste detailplanning liggen volgt begin februari 2025.
2. Volledigheid		• Alle processen zijn meegewogen in de haalbaarheid inclusief beroepspensioenfondsen specifieke processen en benodigde functionaliteit. • De dienstverlening is in scope van de haalbaarheidsanalyse van APS minimaal vergelijkbaar met de huidige dienstverlening (oftewel: minimaal dezelfde functionaliteit en service).	• Alle processen van APS zijn beschreven in de haalbaarheidsstudie. De studie omvat zowel generieke inrichtingen die keten gereed zijn, fonds specifieke inrichtingen voor SPF en koppelingen die specifiek ten behoeve van SPF nodig zijn. De lijst met koppelingen zorgt ervoor dat alles wordt meegewogen, variërend van pensioenuitvoering en portaal inrichting tot specifieke koppelingen met externe systemen. Al deze functionaliteiten zullen voldoen aan de eisen van de producten en diensten die SPF van APS heeft afgenomen. • De dienstverlening die in de scope van de haalbaarheidsanalyse van APS ligt, is minimaal vergelijkbaar met de huidige dienstverlening. Deze dienstverlening is gebaseerd op de PDC van APS en de		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. Het risico is gemitigeerd. De openstaande punten die nog opgepakt moeten worden, lijken passend binnen de huidige planning en lijken niet dermate kritisch, waardoor de regeling volledig passend is. Maar doordat nog niet van alles de impact bekend is, is het beeld hierop niet volledig.

			keuzes die SPF daarin heeft gemaakt. Dit is vastgelegd in een pensioenbeheerovereenkomst. • De benodigde processen op de transitiedatum worden doorlopend getest. • Er zijn diverse proefmigraties bij APS. Deze proefmigraties worden ook beoordeeld door SFH Actuarieel en KPMG. • De ketenacceptatietest moet gereed zijn op 8 juni 2025. • SPF wordt in de hypercarefase proactief geïnformeerd over omissies in de dienstverlening. Hierover zijn afspraken gemaakt. • De hypercarefase is verlengd. • Er zijn afspraken gemaakt met KCC over signalen in de hypercarefase. Deze signalen worden besproken met de werkgroep regeling. • Eraneos voert onafhankelijke reviews uit. • Vroegtijdig hebben de key persons, die veel ervaring hebben met de administratie van SPF, meegekeken naar de uitvoerbaarheid van de nieuwe regeling en zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe IT-systeem. Dit zijn medewerkers die de regeling van SPF door en door kennen. Dit wordt altijd multidisciplinair opgepakt: deelnemersadministratie, juridische zaken en communicatie worden hierbij betrokken.		
3. Maakbaarheid		• Er is voldoende capaciteit vrijgemaakt gezien de hoeveelheid werk en de tijdslijnen.	• APS heeft extra capaciteit vrijgemaakt voor de migratie / transitie. Bij de nieuwe datagerichte werkwijze is een nieuwe planning gemaakt met diverse scenario's. Indien extra capaciteit nodig blijkt, zal deze worden uitgebreid door middel van aanvullende afspraken met zowel bestaande sourcingspartners als nieuwe derde partijen. • De Abtn en het pensioenreglement worden aangepast en volledig geschikt gemaakt volgens de nieuwe pensioenregeling. • De werkgroep regeling bewaakt de planning van de fondsdocumenten. • Eraneos voert onafhankelijke audits uit.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. SPF acht het restrisico op dit moment onacceptabel. APS heeft een nieuwe datagerichte werkwijze gepresenteerd aan SPF, die zich nog moet bewijzen. Het volgende 'Go / No-Go'-moment is eind mei 2025 gepland. SPF is van mening dat er in de eerste helft van april, zo snel mogelijk na de PI dagen van APS, duidelijkheid moet zijn over de effectiviteit van de nieuwe datagerichte werkwijze bij APS waarbij er op dat moment een realistische inschatting gemaakt

					moet kunnen worden over de haalbaarheid van de transitiedatum van 1 juli 2025. Er moet een aangepaste detailplanning komen. Daarnaast zijn de Abtn en het pensioenreglement in de maak. Op 19 februari 2025 worden beide documenten voorlopig vastgesteld door het bestuur met nog enkele aandachtspunten. Het is duidelijk wat hiervoor nog opgeleverd moet worden.
4. Robuustheid		De uitvoering van de Wtp-regeling is na de transitie voldoende geborgd binnen APS, inclusief de koppelingen met de vermogensbeheerder (Achmea IM).	- APS en Achmea IM stellen gezamenlijk een operating manual op waarin de werkzaamheden en de verantwoordelijken op detailniveau worden beschreven. - Na de transitie verzorgt APS een nazorgfase voor de systeemketen en biedt hypercare voor de dienstverlening. Eventuele issues worden opgelost en de werking wordt gewaarborgd. - Eraneos voert onafhankelijke audits uit.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. SPF acht het restrisico op dit moment als onacceptabel. Het operating manual is nog niet helemaal gereed, maar ligt wel op planning. De laatste openstaande punten zijn goed in beeld en worden naar verwachting snel opgelost. Het koppelvlak tussen APS en Achmea IM is nog niet gereed. Er ligt hiervoor een haalbare planning. Voor SPF is het cruciaal dat de testen van het koppelvlak succesvol zijn afgerond eind Q1 2025. De samenwerking tussen APS en Achmea IM heeft zich al bewezen bij DC-regelingen van andere pensioenfondsen. Ook is er een document opgeleverd als bijlage bij de projectovereenkomst, waarin de verantwoordelijkheden van APS en Achmea IM duidelijk zijn vastgelegd. De kans op minder geautomatiseerde processen is groter geworden. APS heeft een nieuwe datagerichte werkwijze gepresenteerd aan SPF, die zich

					nog moet bewijzen. Het volgende 'Go / No-Go'-moment is eind mei 2025 gepland. SPF is van mening dat er in de eerste helft van april, zo snel mogelijk na de PI dagen van APS, duidelijkheid moet zijn over de effectiviteit van de nieuwe datagerichte werkwijze bij APS waarbij er op dat moment een realistische inschatting gemaakt moet kunnen worden over de haalbaarheid van de transitiedatum van 1 juli 2025. Er moet een aangepaste detailplanning liggen. Deze volgt begin februari 2025.
5. Kwaliteit		De kwaliteit van het product en de dienstverlening moet voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen ten aanzien van volledigheid, juistheid en tijdigheid van de huidige uitvoering en dezelfde kwaliteitseisen ten aanzien van de huidige operationele uitvoering.	- De haalbaarheidsanalyse van APS wordt grondig uitgevoerd, inclusief planning, voorbereiding op mogelijke tegenslagen en beschrijving van alle processen en koppelingen. - De koppelingen met het IT-systeem AllVida, net als die met de vermogensbeheerder (Achmea IM), worden gemonitord door het bestuur. - De benodigde processen op de transitiedatum worden doorlopend getest. - Er zijn diverse proefmigraties bij APS. Deze proefmigraties worden ook beoordeeld door SFH Actuarieel en KPMG. - De ketenacceptatietest moet gereed zijn op 8 juni 2025. - De ACE invaarmodule is extern gevalideerd door Milliman. - Eraneos voert onafhankelijke reviews uit. - Inhoudelijke aandachtspunten worden besproken, afgestemd en waar nodig opgelost.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. SPF acht het restrisico op dit moment als onacceptabel. De kans op minder geautomatiseerde processen is groter geworden. APS heeft een nieuwe datagerichte werkwijze gepresenteerd aan SPF, die zich nog moet bewijzen. Het volgende 'Go / No-Go'-moment is eind mei 2025 gepland. SPF is van mening dat er in de eerste helft van april, zo snel mogelijk na de PI dagen van APS, duidelijkheid moet zijn over de effectiviteit van de nieuwe datagerichte werkwijze bij APS waarbij er op dat moment een realistische inschatting gemaakt moet kunnen worden over de haalbaarheid van de transitiedatum van 1 juli 2025. Er moet een aangepaste detailplanning liggen. Deze volgt begin februari 2025.

4.2.3 Haalbaarheidscriteria technische uitvoerbaarheid van de regeling door Achmea IM

Beoordelingscriteria	Bruto risico	Norm	Mitigerende maatregelen	Netto risico	Restrisico en acceptatie
1. Tijdigheid		- Achmea IM heeft in voldoende mate rekening gehouden met de tijdslijnen van de transitie. - Er is een gedetailleerd draaiboek, een planning en een fallback scenario aanwezig. - Er is een schriftelijke vastlegging van de commitment van Achmea IM op de transitie per 1 juli 2025.	- SPF en Achmea IM hebben afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking en het uitvoeren van de transitie. - Achmea IM heeft SPF schriftelijk akkoord gegeven voor de transitiedatum van 1 juli 2025 en de planning daarop aangepast. - Er is voor SPF een gedetailleerd draaiboek, een planning en een fallback scenario aanwezig om ervoor te zorgen dat de transitie gemaakt kan worden op 1 juli 2025. - De bouw en implementatie van de module rente en de module rendement zijn succesvol afgerond. Het transitieverslag daarvan is voorgelegd aan het bestuur in oktober 2024. - BDO voert onafhankelijke audits uit. De sleutelfunctiehouder interne audit heeft de audits positief beoordeeld. - Maandelijkse risico-overleggen met de BAC en Achmea IM om de maandelijkse voortgang te monitoren.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. SPF acht het restrisico op dit moment als acceptabel, maar wel met verhoogde aandacht in de monitoring (onder andere in het tweewekelijkse transitie-overleg met Achmea IM). Het operating manual is nog niet helemaal gereed, maar ligt wel op planning. De laatste openstaande punten zijn goed in beeld en worden naar verwachting snel opgelost. Het koppelvlak tussen APS en Achmea IM is nog niet gereed. Er ligt hiervoor een haalbare planning. Voor SPF is het cruciaal dat de testen van het koppelvlak succesvol zijn afgerond eind Q1 2025.
2. Volledigheid		- Alle processen zijn meegewogen in de haalbaarheid (inclusief eventuele beroepspensioenfondsspecifieke processen) en benodigde functionaliteit. - De dienstverlening is in scope van de haalbaarheidsanalyse van Achmea IM minimaal vergelijkbaar met de huidige dienstverlening (oftewel: minimaal dezelfde functionaliteit en service).	- Door Achmea IM worden alle relevante processen meegewogen in de haalbaarheid binnen het project IPA. Dit omvat de aanpassingen van de FPR, de implementatie / testen van nieuwe processen, systeemaanpassingen binnen Achmea IM, connecties met dagelijkse gegevensuitwisseling met de PUO (APS) en de SPF specifieke transitie, inclusief het opstellen van het vermogenstransitieplan. - Op basis van de grondige aanpak en de gedetailleerde werkstromen binnen het project IPA, wordt verwacht dat de dienstverlening van Achmea IM minstens gelijkwaardig blijft en mogelijk verder geoptimaliseerd wordt (definitieve bevestiging volgt aan de hand van		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. Het risico is gemitigeerd vanwege de uitgebreide rapportages en de audit van BDO, in combinatie met het positieve advies van de sleutelfunctiehouder internal audit.

			- testresultaten). - BDO voert onafhankelijke audits uit. De sleutelfunctiehouder interne audit heeft de audits positief beoordeeld. - Maandelijkse risico-overleggen met de BAC en Achmea IM om de maandelijkse voortgang te monitoren.		
3. Maakbaarheid		Er is voldoende capaciteit vrijgemaakt gezien de hoeveelheid werk en de tijdslijnen.	- Achmea IM heeft diverse strategische stappen gezet om te waarborgen dat er voldoende capaciteit is voor de transitie van SPF op 1 juli 2025. - BDO voert onafhankelijke audits uit. De sleutelfunctiehouder interne audit heeft de audits positief beoordeeld. - Maandelijkse risico-overleggen met de BAC en Achmea IM om de maandelijkse voortgang te monitoren.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. Het risico is gemitigeerd, omdat uit rapportages blijkt dat er voldoende capaciteit is.
4. Robuustheid		De uitvoering van de Wtp-regeling is na de transitie voldoende geborgd binnen Achmea IM inclusief de koppelingen met de PUO (APS).	- De uitvoering van de Wtp-regeling na de transitie is binnen Achmea IM geborgd (inclusief de koppelingen met de PUO, APS). - APS en Achmea IM stellen gezamenlijk een operating manual op waarin de werkzaamheden en de verantwoordelijken op detailniveau worden beschreven. - Na de transitie verzorgt Achmea IM een afsluitfase. In deze fase worden de eerste reguliere premiestortingen binnen de nieuwe regeling gemonitord, eventuele openstaande punten opgelost en de verantwoording van de vermogenstransitie vastgelegd middels een transitieverslag. - BDO voert onafhankelijke audits uit. De sleutelfunctiehouder interne audit heeft de audits positief beoordeeld. - Maandelijkse risico-overleggen met de BAC en Achmea IM om de maandelijkse voortgang te monitoren.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. SPF acht het restrisico acceptabel, met verhoogde aandacht voor monitoring. Het operating manual is nog niet helemaal gereed, maar ligt wel op planning. De laatste openstaande punten zijn goed in beeld en worden naar verwachting snel opgelost. Er ligt een haalbare planning voor het testen van het koppelvlak tussen Achmea IM en APS. SPF blijft dit risico monitoren tijdens de tweewekelijkse transitie-overleggen met Achmea IM.

5. Kwaliteit		De kwaliteit van het product en de dienstverlening moet voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen ten aanzien van volledigheid, juistheid en tijdigheid van de huidige uitvoering en dezelfde kwaliteitseisen ten aanzien van de huidige operationele uitvoering.	- De voortgangsrapportage van IPA wordt in de werkgroep vermogensbeheer (de BAC) gemonitord. - De modules worden periodiek getest. - SPF monitort koppeling tussen Achmea IM en APS. SPF wordt daarin ondersteund door Eraneos. - BDO voert onafhankelijke audits uit. De sleutelfunctiehouder interne audit heeft de audits positief beoordeeld. - Maandelijkse risico-overleggen met de BAC en Achmea IM om de maandelijkse voortgang te monitoren.		Het netto risico ontstaat door het bruto risico te verminderen met de toegepaste beheersmaatregelen. SPF acht het restrisico op dit moment als acceptabel, maar wel met verhoogde aandacht in de monitoring (onder andere in het tweewekelijkse transitie-overleg met Achmea IM). De modules zijn succesvol getest. Het koppelvlak tussen APS en Achmea IM is nog niet gereed. Er ligt hiervoor een haalbare planning. Voor SPF is het cruciaal dat de testen van het koppelvlak succesvol zijn afgerond eind Q1 2025.
--------------	---	--	---	---	--

4.3 Conclusie bestuur naar aanleiding van de haalbaarheidsanalyse

Het bestuur concludeert dat de regeling waarvan DPF heeft verzocht deze uit te voeren, haalbaar is. Daarnaast concludeert het bestuur dat de implementatie van de nieuwe regeling, conform de analyses van APS en Achmea IM, onder voorwaarden haalbaar is per 1 juli 2025. Enkele criteria zijn qua netto risico door het bestuur op 'geel' en 'oranje' gezet. Dit betekent niet dat de regeling niet haalbaar is, maar wel dat deze criteria strak gemonitord moeten worden en dat er diverse additionele beheersmaatregelen getroffen moeten worden die effectief moeten blijken in de eerste helft van april, zo snel mogelijk na de PI dagen van APS.

Op 5 februari 2025 heeft het bestuur het 'Go / No-Go'-moment vastgesteld en besloten om vooralsnog geen 'No-Go' te geven voor de transitie per 1 juli 2025. APS heeft SPF op 24 januari 2025 geadviseerd om de transitie voort te zetten. APS heeft dus een go vastgesteld. Dit is alleen mogelijk, omdat APS een nieuwe datagerichte werkwijze heeft gepresenteerd. Deze nieuwe werkwijze moet zich echter in praktijk nog bewijzen. Om deze reden heeft SPF een nieuw 'Go / No-Go'-moment ingepland in de eerste helft van april, zo snel mogelijk na de PI dagen van APS. Ten aanzien van dat besluit, heeft SPF, mede op advies van Eraneos, de volgende critica opgesteld:

- De nieuwe datagerichte werkwijze van APS moet zich in de praktijk hebben bewezen.
- APS moet voldoende voortgang hebben gemaakt met de inrichting van het IT-systeem.
- De koppeling tussen APS en Achmea IM, het deelnemersportaal en de output moeten gereed en getest zijn per eind Q1 2025.
- APS moet inzichtelijk hebben gemaakt welke processen op de transitiedatum opgeleverd moeten zijn en wat de implicaties zijn voor de run organisatie van processen die niet opgeleverd zijn.
- Bovenstaande processen, inclusief de omschrijving van status en benodigde activiteiten (tijd / capaciteit) ten behoeve van readiness, moeten helder uitgewerkt zijn in een realistische planning, inclusief prioritering hiervan (in afstemming met SPF).
- Kortcyclische rapportage (per 2 weken) met het procesdashboard per sprint, interface dashboard, migratie en implementatie inclusief invaren dashboard en voortgang op de inhoudelijke aandachtspunten.
- Detail fondsspecifieke voortgangsrapportage op de controlemomenten op 15 februari, 15 maart, 28 maart, 1 april en 18 april 2025.
- Dit bovenstaande is correct uitgewerkt in de aangepaste projectovereenkomst. Ook moeten de pensioenbeheerovereenkomst (PBO) met dienstverleningsovereenkomst en SLA tijdig zijn gecontracteerd om SPF een 'stevige' positie te geven in 'het afdwingen' van de nakoming van de APS dienstverleningsverplichtingen.
- De openstaande punten ten aanzien van de inrichting van de pensioenregeling, het pensioenreglement en de Abtn moeten afgehandeld zijn.
- Er moeten heldere contractuele afspraken worden gemaakt in het licht van de deeloplevering (verschillende scenario's) en de (financiële) consequenties.
- DNB moet goedkeuring hebben gegeven aan SPF voor de transitie per 1 juli 2025.

4.4 Kritieke uitbestedingen en onderuitbestedingsrelaties

De kritieke uitbestedingspartijen van SPF zijn APS en Achmea IM.

Er is een directe uitbestedingsrelatie tussen SPF en APS als uitvoeringsorganisatie. APS werkt ook met onderuitbestedingspartijen. APS voert de afspraken die SPF met APS heeft gemaakt door in de keten van (onder-)uitbestedingen. Dit door met de partijen die voor het pensioenfonds als onderuitbesteding worden gezien o.a. afspraken te maken over de verwerking van gegevens (verwerkingsovereenkomst), de beveiliging van de IT-omgeving (security-agreement) en afspraken over beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid via servicelevels (servicelevel-agreement).

SPF krijgt in de niet-financiële risicorapportages van Achmea IM en APS een overzicht van de onderuitbestedingspartijen. Niet alle onderuitbestedingen zijn in dezelfde mate betrokken bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Met name de IT-onderdelen zijn in de aanloop naar het nieuwe IT-systeem en de koppeling tussen vermogensbeheer en pensioenbeheer van belang. De IT-koppeling is uitbesteed aan Achmea IT. Bij Achmea IM is de grootste IT-dienstverlener Schuberg Philis.

De softwareleveranciers zijn in principe geen uitbesteding van de pensioenuitvoeringsorganisatie maar inkoop van software. De onderuitbestedingen in de nieuwe IT keten zijn als volgt:

Allvida

Leverancier	Dienst	Datalocatie	Relatie
Achmea Interne Diensten N.V. • Strategie & Transformatie • Centrale Dienstverlening • Distributie, Innovatie en Merken	Groepsbrede IT-leverancier voor o.a. infrastructuur, licenties, platforms, applicaties en netwerken. Tevens mailingdiensten via Rotaform.	EER	Intragroep
eBenefits B.V.	Het beschikbaar stellen van een werkgeversportaal	EER	Extern
Hyfen	Het beschikbaar stellen van waardeoverdracht.nl	EER	Extern
IG&H Consulting B.V.	Het beschikbaar stellen van VIDA, QWIK en de risicobereidheidstool	EER	Extern
T&T Vertrouwd Verbonden	Het beschikbaar stellen van koppelingen tegen o.a. de basisregistratie personen	EER	Extern

In de ISAE 3402 II-rapportages die SPF ontvangt van de uitbestedingspartners wordt over de onderuitbestedingen gerapporteerd en hoe deze uitbestedingen worden gemonitord en beheerst. Dit betreft rapportage achteraf. Voor de bouw van het nieuwe IT-systeem bij APS en de nieuwe koppelingen tussen APS en Achmea IM heeft SPF een derde onafhankelijke partij (Eraneos) ingeschakeld om tijdens het ontwikkel- en bouwproces te monitoren.

5 Datakwaliteit


Om te kunnen invaren is het essentieel dat de kwaliteit van de administratieve data op orde is. Medio 2022 is SPF daarom gestart met een onderzoek naar de datakwaliteit. In het eerste deel van het onderzoek (get clean) is het Kader Datakwaliteit van de Pensioenfederatie gevolgd. Dit is op 13 september 2023 afgerond. Daarna zijn (en worden) nog activiteiten verricht met het oog op het blijvend waarborgen van de datakwaliteit (stay clean).

Om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel succesvol te kunnen afronden is het van groot belang voldoende zekerheid te krijgen en te houden over de gegevens van deelnemers en hun aanspraken. Zonder afdoende inzicht in de datakwaliteit voorafgaand aan het invaren, kan SPF geen goed en evenwichtig invaarbesluit nemen en kunnen fouten ontstaan in de berekende individuele 'pensioenvermogens'.

SPF dient aan te tonen dat de datakwaliteit vóór, tijdens en na transitie geborgd is. Hierbij worden twee toetsmomenten onderscheiden:

1. Toetsmoment 1 betreft het vaststellen van de datakwaliteit als voorbereiding op het totale proces van invaren;
2. Toetsmoment 2 vindt vlak na het moment van invaren plaats.

Het "Kader Datakwaliteit Wet toekomst pensioenen" van de Pensioenfederatie heeft tot doel te faciliteren dat fondsen die wensen in te varen op een consistente en aantoonbare wijze de datakwaliteit onderbouwen en borgen. Het kader richt zich op toetsmoment 1 (get clean and stay clean) en onderscheidt zes fasen met daarin verschillende uit te voeren stappen:

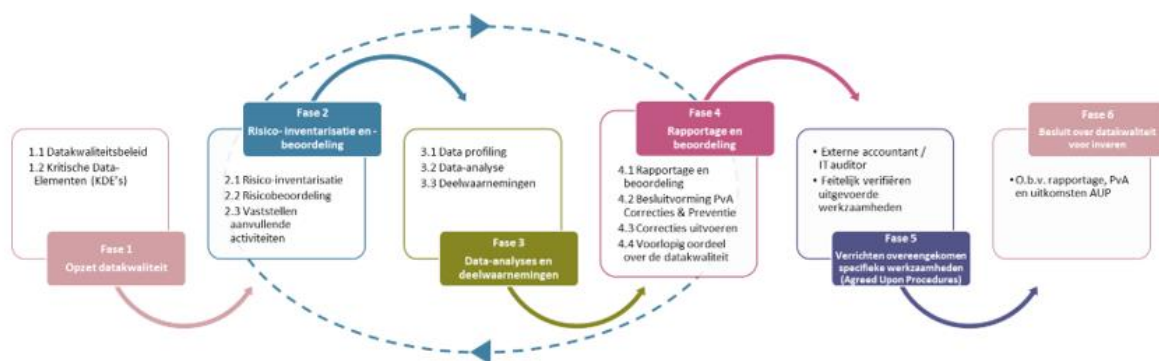

Figuur 2

5.1 Fase 1 - Opzet datakwaliteit

Het doel van deze fase is om de risicobereidheid datakwaliteit te inventariseren en te (her)formuleren, alsmede het vaststellen van de kritieke data-elementen (KDE's). SPF heeft daartoe een datakwaliteitsbeleid opgesteld waarbij de volgende onderdelen zijn opgenomen in het beleid:

- a. Definitie datakwaliteit;
- b. Governance datakwaliteit;
- c. Taken en Verantwoordelijkheden.;
- d. Identificatie van KDE's;
- e. Risicobereidheid (kwalitatief of kwantitatief);
- f. Gebruik van en eisen aan externe databronnen;
- g. Herzieningenbeleid & communicatie aan deelnemers;
- h. Datakwaliteitsdimensies;
- i. Aantoonbaarheid datakwaliteit;

- j. Key controls datakwaliteit;
- k. Data-architectuur en data flows;
- l. Procesafwijkingen vaststellen en opvolgen.

SPF heeft een herzieningenbeleid opgesteld waarin een beleid is vastgesteld voor het corrigeren/herzien van gegevens en waarin het onderwerp communicatie is opgenomen. Het herzieningenbeleid is gepubliceerd op de website van SPF op 26 juni 2023.

De SFH risicobeheer heeft de kwalitatieve risicobereidheid en het herzieningenbeleid beoordeeld en heeft vastgesteld dat deze actueel en bruikbaar zijn. De SFH risicobeheer heeft hierover schriftelijk aan het bestuur gerapporteerd. In zijn rapportage heeft de SFH tevens vastgelegd dat de SFH risicobeheer de KDE's heeft geëvalueerd en dat hij heeft vastgesteld dat dit de relevante KDE's zijn voor het invaren van de pensioenregeling.

Na de eerste inwaarmelding heeft een partiële toetsing door DNB plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot het aanscherpen van enkele documenten. De aangescherpte documenten zijn in de bestuursvergadering van 30 oktober 2024 vastgesteld, waarbij het bestuur heeft geconcludeerd dat de risico's die in de risicoanalyse datakwaliteit worden benoemd, afdoende worden beheerst.

5.2 Fase 2 - Risico-inventarisatie en -beoordeling

In fase 2 heeft de risicobeoordeling plaatsgevonden aan de hand van een aantal workshops. Hierbij waren vanuit SPF het dagelijks bestuur, de SFH interne audit en een externe adviseur aanwezig, aangevuld met de bestuursadviseur. Vanuit APS waren de account- en transitie manager aanwezig en tevens de APS risicomanager en leden van het team deelnemersadministratie vanwege hun kennis van de regeling en administratie van SPF.

SPF heeft een risicoanalyse opgesteld, die onder andere naar aanleiding van de partiële toetsing door DNB enkele malen is verbeterd: 2024.09.18 SPF Risicoanalyse datakwaliteit v3.3. Hierin is een overzicht van de pensioenuitvoerdersrisico-indicatoren opgenomen welke voorzien zijn van een onderbouwing. Indien van toepassing is ook de impact op de datakwaliteit genoteerd door APS.

Daarnaast heeft SPF een inschatting gemaakt van het pensioenuitvoerderrisicoprofiel waarbij een inventarisatie is gemaakt van:

- a) Welke mogelijke pensioenuitvoerdersrisico-indicatoren van toepassing zijn;
- b) De aantoonbare kwaliteit van pensioendata als gevolg van het huidige datakwaliteitsbeheersingsraamwerk;
- c) Welke belangrijke gebeurtenissen (events) er zijn geweest in het verleden, zoals bijvoorbeeld collectieve waardeoverdrachten of wijzigingen van pensioenuitvoeringsorganisatie;
- d) Risico-indicatoren vanuit relevante incidenten en klachten in het verleden, wat de impact is van de betreffende klachten/incidenten op de huidige datakwaliteit en of de klachten/incidenten aantoonbaar zijn opgelost.
- e) Welke tijdshorizon gehanteerd wordt waarover de activiteiten in fase 3 kunnen plaatsvinden in verband met de beschikbaarheid van de historische gegevens. Hierbij is expliciet onderbouwd overwogen hoe om te gaan met niet-beschikbare data die wel tot de scope behoren, maar waarop geen activiteiten plaats kunnen vinden.

SPF heeft in fase 2 onderzoek gedaan naar welke DRI's (deelnemersrisico-indicatoren) van het Kader Datakwaliteit van toepassing zijn op SPF. Er heeft een aantoonbare beoordeling plaatsgevonden of deze lijst nog aangevuld moet worden met specifieke, aanvullende DRI's en hoe vaak de betreffende DRI's voorkomen. Tevens is aangetoond dat de genoemde frequentie zichtbaar aansluit op de pensioenadministratie.

SPF heeft een schriftelijke inventarisatie gemaakt van mogelijke combinaties van DRI's met een verhoogd datakwaliteitsrisico en hoe vaak deze combinaties voorkomen. Ook zijn de risicogroepen geïdentificeerd; deze sluiten aan bij de uitkomsten van de hiervoor genoemde werkzaamheden.

Per KDE heeft SPF een risicobeoordeling gemaakt waarbij aandacht is besteed aan een risico-beschrijving. Het bruto risico is ingeschat, de effectiviteit van geïmplementeerde beheersingsmaatregelen en gegevensgerichte werkzaamheden zijn vastgesteld en gedocumenteerd en het netto risico is hierbij bepaald.

SPF heeft de maximaal toegestane afwijking (MTA) op de aanspraak vastgesteld op € 12,- per jaar. De besluitvorming en de hierbij horende motivering en onderbouwing is gedocumenteerd in lijn met de 'Nadere toelichting op vaststellen van de maximale toegestane afwijking op de aanspraak' zoals beschreven in het kader datakwaliteit. Hierbij is SPF ten behoeve van de besluitvorming inzake het risicoprofiel en de risicobeoordeling schriftelijk geadviseerd door de SFH. Het bestuur van SPF heeft de uitkomsten van de risicobeoordeling en het risicoprofiel geaccordeerd op de bestuursvergaderingen van 14 juni en 5 juli 2023.

Voor elke KDE, zoals geïdentificeerd in fase 2.1, is een analyse uitgevoerd, ofwel een generieke analyse, een specifieke analyse dan wel door middel van data-profilering. In fase 2 zijn conform het Kader Datakwaliteit tevens per risicogroep aanvullende activiteiten voor fase 3 vastgesteld, zoals data-analyses en deelwaarnemingen.

SPF heeft de grondslag voor de omvang van de deelwaarneming vastgesteld en deze grondslag onderbouwd waarbij rekening is gehouden met de risico's en de omvang van de geïdentificeerde risicogroepen.

Er is een overzicht opgesteld met structurele beheersingsmaatregelen, onderzoeken en aanvullende acties, die door SPF benodigd zijn geacht om het risico op onjuiste KDE's te mitigeren en in de toekomst te voorkomen (stay clean). De SFH risicobeheer heeft het overzicht beoordeeld en schriftelijk geconcludeerd dat dit de benodigde structurele beheersingsmaatregelen, onderzoeken en aanvullende acties zijn.

De SFH actuarieel heeft een opinie gegeven over de MTA en de KDE's:

- *"Het uitgangspunt van het datakwaliteitsbeleid van het pensioenfonds is: "Iedere beroepsgenoot en pensioengerechtigde moet de pensioenrechten toegekend en/of tijdig uitgekeerd krijgen waar hij of zij recht op heeft.". De Maximaal Toegestane Afwijking (MTA) geeft aan hoeveel verschil er maximaal mag zijn op de aanspraak per individuele deelnemer als gevolg van tekortkomingen in de pensioenadministratie, waarbij conform het Kader Datakwaliteit van de Pensioenfederatie de belangen van deelnemers en invloed op persoonlijke pensioenvermogen dienen te worden afgewogen. Gedurende het proces is de MTA door het fonds verlaagd van de initiële vaststelling (€ 63 per jaar) naar € 1 per maand. Met deze MTA zijn bij beperkte afrondingsverschillen niet direct intensieve vervolganalyses met bijbehorende kosten noodzakelijk. De aanpassing heeft plaatsgevonden in samenspraak tussen de juiste rollen en functies, zoals opgenomen in het Kader Datakwaliteit van de Pensioenfederatie. Ik beoordeel deze aangepaste MTA als voldoende passend bij het uitgangspunt van het datakwaliteitsbeleid."*
- *"Kritieke Data Elementen (KDE's) zijn de elementen in de pensioenadministratie die als essentieel worden beschouwd om te komen tot een juiste en volledige berekening van aanspraken. Er zijn door het fonds KDE's geïdentificeerd, daarnaast zijn controles uitgevoerd op deze KDE's (rapportage Data Profiling). Ik ben door het fonds in gelegenheid gesteld om de geïdentificeerde KDE's te evalueren. In mijn e mail van 26 mei 2023 zijn suggesties opgenomen voor aanvullingen op de reeds geïdentificeerde KDE's . Het fonds heeft toegelicht op welke wijze die suggesties impliciet waren ondervangen door de combinatie van reeds geïdentificeerde KDE's. Ik kan mij hier in vinden."*

5.3 Fase 3 - Data-analyses en deelwaarnemingen & Fase 4 – Rapportage en beoordeling

Gedurende deze fases heeft SPF inzicht verkregen in de plausibiliteit en juistheid van de data (KDE's Invaren).

Data profiling

Voor het uitvoeren van de data profiling activiteiten is een databestand gebruikt dat SPF aantoonbaar heeft aangesloten op de pensioenadministratie en waarbij eventuele verschillen zijn verklaard. Dit databestand is opgezet door APS en vervolgens door SPF van comments en vragen voorzien. De verschillen zijn verklaard en vervolgacties zijn uitgevoerd.

Op het databestand, zoals geïdentificeerd in fase 1, heeft SPF een dataprofilering onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bevatte ten minste:

- a) een onderzoek op compleetheid, juistheid van het datatype (validiteit), de verwachte domeinwaarden (accuraatheid) en de datadistributie;
- b) een onderzoek of de kenmerken van de data voldeden aan de vooraf door SPF gedefinieerde verwachtingen;
- c) indien deze niet voldeden aan de vooraf gedefinieerde verwachtingen zijn de betreffende KDE's nader onderzocht en zijn correcties en/of aanvulling van ontbrekende data geïdentificeerd.

Uit de dataprofilering heeft SPF correcties en/of aanvulling van ontbrekende data geïdentificeerd. Dit is vastgelegd in het document Plan van Aanpak Datakwaliteit Correcties en Preventies. De benodigde correcties zijn tevens geagendeerd in dit Plan van Aanpak.

Generieke data analyse

SPF heeft een schriftelijke vastlegging opgesteld van de uitgevoerde generieke analyses. Per generieke analyse is een verwachting gedefinieerd, waarbij de toegestane afwijkingen zijn gedefinieerd, rekening houdend met de risicobereidheid.

Met betrekking tot de generieke analyses die niet zijn uitgevoerd heeft SPF een schriftelijke motivatie gegeven waarom de analyse niet is uitgevoerd en met welke (aanvullende) beheersmaatregelen het risico op onjuistheden in het databestand is afgedekt, waardoor de betreffende analyse niet benodigd is. De genoemde motivatie is door de SFH risicobeheer schriftelijk beoordeeld en akkoord bevonden.

SPF heeft enkele onderzoeken inzake specifieke data-analyses laten uitvoeren. De uitkomsten van de specifieke data-analyses zijn vastgelegd en schriftelijk onderbouwd in de documenten:

- a) Rapportage Controle actieve deelnemers zonder pensioenopbouw_v1.0;
- b) Rapportage specifiek Controle verwerkte echtscheidingen en vereveningen SPF_v1.0;
- c) Rapportage Controle op dubbel verwerkte mutaties_v1.0.

Door SPF zijn de KDE's vastgesteld die in aanmerking komen voor correctie, rekening houdend met de MTA. De groepen van outliers, rekening houdend met de MTA, vormden input voor stap 3.3 "Deelwaarnemingen".

Deelwaarnemingen

In deze stap zijn per risicogroep deelwaarnemingen uitgevoerd op basis van een door SPF uitgevoerde selectie uit het databestand. De geselecteerde aantallen zijn bepaald op basis van de 'Nadere toelichting op vaststellen van deelwaarnemingen per risicogroep' van het Kader Datakwaliteit.

Bij de specifieke deelwaarnemingen zijn de outliers uit de data-analyses integraal of deelwaarnemingsgewijs door SPF onderzocht met brondocumenten en/of zijn nagerekend voor de relevante KDE's van de outliers. Dit is vastgelegd in de documenten:

- a) Rapportage deelwaarneming ADV_SPF_v1.0;
- b) Rapportage deelwaarneming IWO SPF v1.0;
- c) Rapportage deelwaarneming schoolverklaring_SPF_V1.0;
- d) Rapportage deelwaarneming toekenning premievrijstelling_SPF_v1.0.

In het Plan van Aanpak Datakwaliteit Correcties en Preventies en het Projectplan Datakwaliteit heeft SPF vastgelegd dat zij een schriftelijke risico-inschatting heeft gemaakt van de afwijkingen groter dan de MTA en dat conform de risico-inschatting nader onderzoek naar de data is uitgevoerd hetzij middels data-analyse, hetzij middels deelwaarnemingen.

5.4 Fase 4 - Rapportage

SPF heeft een Projectplan Datakwaliteit opgesteld waarin de werkzaamheden in alle fases zijn opgenomen. Hierin is zichtbaar gemaakt wat de datakwaliteit is vergeleken met de door het bestuur vastgestelde normen en risicobereidheid.

Daarnaast is een Plan van Aanpak Datakwaliteit Correcties en Preventies - SPF opgesteld. In deze rapportage zijn de uitkomsten van fase 2 en de geconstateerde afwijkingen uit fase 3 weergegeven. Hierbij is per type afwijking opgenomen of en hoe de afwijking is gecorrigeerd, dan wel wordt gecorrigeerd en of sprake is van een incidentele, dan wel structurele afwijking. Ook is de prioritering vastgesteld en is, conform het datakwaliteitsbeleid, een beoordeling gemaakt van de bestaande tekortkomingen in de datakwaliteit.

Het bestuur heeft vervolgens besloten de voorgestelde correcties door te voeren (get clean) en tevens het plan uit te voeren om soortgelijke toekomstige issues te voorkomen (stay clean).

De SFH risicobeheer heeft schriftelijk beoordeeld dat alle correcties waartoe besloten is overeenkomstig het correctie- en herzieningenbeleid zijn gecorrigeerd of conform het Plan van Aanpak Datakwaliteit Correcties en Preventies - SPF zullen worden gecorrigeerd.

De SFH risicobeheer heeft zich ten aanzien van de data analyses, correcties en preventieve maatregelen gebaseerd op de beschikbare documenten en heeft op basis van deze documenten op 30 juni 2023 in zijn opinie kunnen vaststellen dat SPF en APS:

- *“een overzicht hebben opgesteld met structurele beheersingsmaatregelen, onderzoeken en aanvullende acties die nodig zijn geacht om het risico op onjuiste KDE's te mitigeren en in de toekomst te voorkomen (stay clean);*
- *een schriftelijke vastlegging hebben opgesteld van de uitgevoerde generieke- en specifieke data analyses, en*
- *naar aanleiding van de data profiling, generieke analyses, specifieke analyses en deelwaarnemingen een plan van aanpak hebben opgesteld dat helder weergeeft welke bevindingen en incidenten gecorrigeerd zijn, dan wel dienen te worden.”*

Na ontvangst van aanvullende documenten heeft de SFH risicobeheer hieraan op 14 juli 2023 toegevoegd dat hij heeft kunnen vaststellen dat het fonds en APS een schriftelijke motivatie hebben gegeven van de generieke analyses die niet zijn uitgevoerd, waarom de analyse niet is uitgevoerd en met welke (aanvullende) beheersmaatregelen het risico op onjuistheden in het databestand is afgedekt waardoor betreffende analyse niet benodigd is.

De SFH risicobeheer is dan ook van mening dat de gemaakte afwegingen en keuzes om bepaalde analyses niet te doen, zorgvuldig en passend bij de risicohouding en -bereidheid van SPF zijn

gemaakt.

5.5 Fase 5 - Verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden door de externe accountant/externe IT-auditor

Het Kader Datakwaliteit - Wet toekomst pensioenen gaat ervan uit dat een externe accountant of IT-auditor minimaal een set aan vooraf overeengekomen specifieke werkzaamheden ('agreed upon procedures' (AUP)) verricht, conform COS 4400N voor accountants of Richtlijn 4401 (vanaf 1 januari 2023 Richtlijn 4400 geheten) voor IT-auditors. Hierbij stelt de externe accountant vast dat de in het kader beschreven procedures en onderliggende werkzaamheden zijn uitgevoerd en gedocumenteerd door het pensioenfonds of door de PUO in opdracht van het pensioenfonds. De externe accountant hanteert bij zijn werkzaamheden het Kader Datakwaliteit van de Pensioenfederatie, de AUP-richtlijn van NBA en NOREA en de Good practice datakwaliteit pensioenfonds van DNB.

De overeengekomen specifieke werkzaamheden worden uitgevoerd per pensioenregeling waarvoor een implementatieplan wordt ingediend. De AUP rapportage maakt onderdeel uit van dit implementatieplan. SPF heeft gevraagd aan EY om dit uit te voeren. Op 14 juli 2023 heeft EY zijn rapport opgeleverd. In zijn rapport heeft Ernst & Young Accountants LLP vastgesteld dat de in het Kader Datakwaliteit beschreven fasen en onderliggende stappen door SPF zijn uitgevoerd en gedocumenteerd.

5.6 Beschikbaarheid van data

Op verzoek van SPF heeft APS een beschrijving geleverd van de beschikbaarheid van de data vóór, tijdens en na de transitie, alsmede van de beheersing van de hiermee gepaard gaande risico's:

- Data voor de transitie: deze zijn zowel beschikbaar in MAIA als in AllVida.
- Data tijdens de transitie: deze zijn uitsluitend beschikbaar in AllVida (tussenresultaten benodigd voor invaren zullen worden vastgelegd in AllVida).
- Data na de transitie: deze zijn uitsluitend beschikbaar in AllVida.

Na de migratie/transitie zullen de data uit de "oude systeemketen" worden veiliggesteld in een daarvoor bestemd archief.

5.7 Definitieve besluitvorming

De definitieve besluitvorming van het bestuur heeft plaatsgevonden op 13 september 2023. Op grond van de opinies van de sleutelfunctiehouders heeft het bestuur geconcludeerd dat er geen belemmeringen betreffende de datakwaliteit zijn die maken dat het eerder genomen besluit om te kunnen invaren moeten worden herzien.

De SFH risicobeheer heeft geconcludeerd: *"Mijns inziens is er voldoende onderbouwing op basis van het doorlopen proces, de uitkomsten, de benodigde herstelacties en de ingerichte beheersmaatregelen naar de toekomst om definitief te oordelen dat de datakwaliteit toereikend is."*

De SFH interne audit heeft geconcludeerd: *"Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden kan worden vastgesteld dat de in de rapportage genoemde activiteiten van de uitvoering van de fasen van het kader Datakwaliteit ... zijn uitgevoerd en de beschreven deliverables zijn opgeleverd."*

De SFH actuarieel heeft de volgende aanbeveling gedaan: *"In aanvulling op mijn oordeel over de MTA en de KDE heb ik het bestuur meegegeven dat een integraal onderzoek door een onafhankelijke partij, gericht op de berekening van opbouw en mutatie van aanspraken (dus doet het systeem in alle gevallen wat het zou moeten doen met de gecontroleerde brondata?), een waardevolle toevoeging kan zijn. Het bestuur heeft hier kennis van genomen en aangegeven dit mee te nemen in haar overwegingen."*

Het bestuur heeft naar aanleiding van de aanbeveling geconcludeerd dat altijd meer onderzoek kan worden gedaan om nog meer zekerheid te krijgen. Gezien het doorlopen proces en de beperkte bevindingen verwacht het bestuur echter niet dat een extra onderzoek van toegevoegde waarde is, terwijl extra onderzoek wel een investering in geld en tijd kost. Het risico ligt naar het oordeel van het bestuur binnen de risicobereidheid van het bestuur.

5.8 Stay clean maatregelen datakwaliteit

Het traject inzake het Kader Datakwaliteit heeft rapportages opgeleverd op basis waarvan een beperkt aantal fouten in de datakwaliteit is hersteld (de get clean fase). Omdat pensioen-administratie een doorlopend proces betreft, is het van belang dat de datakwaliteit van goede kwaliteit blijft. SPF heeft daarom aan Achmea Pensioenservices (APS) gevraagd hoe dit tot de transitiedatum blijvend kan worden geborgd (de stay clean fase).

Stay-clean maatregelen

APS heeft extra maatregelen genomen in het kader van stay-clean en heeft deze beschreven. De risicoanalyse datakwaliteit geeft het overzicht van beheersmaatregelen. Voor de meeste beheersmaatregelen is geconcludeerd dat de reguliere beheersmaatregelen voldoende zijn. Voor een aantal risico's heeft het bestuur van SPF geconcludeerd dat het restrisico niet acceptabel was. Daarvoor zijn in de risicoanalyse extra maatregelen gedefinieerd, waarna het bestuur het restrisico als acceptabel heeft beoordeeld.

Rapportage van stay clean maatregelen

Over de reguliere beheersmaatregelen rapporteert APS via de jaarlijkse ISAE-rapportage en in de kwartaalrapportages niet-financiële risico's. Over de aanvullende maatregelen rapporteert APS via de extra kwartaalrapportage Stay clean maatregelen en opvolging onderzoek Datakwaliteit SPF.

Monitoring van stay clean maatregelen

De jaarlijkse ISAE-rapportage, de kwartaalrapportages niet-financiële risico's en Stay clean maatregelen en opvolging onderzoek Datakwaliteit SPF worden door het dagelijks bestuur beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt gekeken of nadere maatregelen nodig zijn. De rapportages en de beoordeling door het dagelijks bestuur gaan naar de Commissie GRC. De GRC challenge het oordeel van het dagelijks bestuur en kijkt of hiermee de integrale risico's, ook ten aanzien van datakwaliteit voldoende zijn geborgd. De GRC rapporteert hierover vervolgens aan het bestuur. Het bestuur heeft geoordeeld dat de risico's als genoemd in de risicoanalyse datakwaliteit op basis van deze cyclus voldoende zijn beheerst en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Aanvullende stay clean maatregelen

Het bestuur van SPF heeft geconcludeerd dat het inmiddels geruime tijd geleden is dat SPF de zes fases van het Kader Datakwaliteit heeft afgerond. Op basis van de (beperkte) bevindingen zijn weliswaar extra beheersmaatregelen ingevoerd die door het dagelijks bestuur van SPF worden gemonitord op hun effectiviteit, maar wat moet worden voorkomen is dat eventueel nieuwe of andere issues ontstaan op het gebied van datakwaliteit. Als gevolg van het opschuiven van de transitiedatum is de periode tussen het moment van "get clean" en het daadwerkelijke transitiemoment langer geworden en is de kans op verlaging van de kwaliteit van de data mogelijk toegenomen. Gelet op het feit dat aanlevering van de data door de deelnemers zelf plaatsvindt, blijft het van groot belang de kwaliteit van de data nauwgezet te monitoren. Om deze reden heeft SPF APS de opdracht gegeven om begin 2025 een nieuw Data Profiling onderzoek uit te voeren.

Omdat de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van hun gegevens heeft SPF APS daarnaast verzocht om deelnemers er nogmaals expliciet op te wijzen dat zij moeten nagaan of hun pensioengevend inkomen en parttime percentage juist geadministreerd staan. In dit kader wordt

in het voorjaar van 2025 een brief verzonden aan alle deelnemers met een parttimepercentage van minder dan 20% en aan deelnemers bij wie sprake lijkt te zijn van een bijzondere combinatie van beroepsinkomen en/of parttimepercentage.

5.9 Kader Datakwaliteit – Toetsmoment 1 en 2

Het Kader Datakwaliteit heeft tot doel het faciliteren dat pensioenuitvoerders die wensen in te varen op een consistente en aantoonbare wijze de datakwaliteit onderbouwen en waarborgen. Het Kader Datakwaliteit, dat Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten heeft doorlopen en afgerond, richtte zich op Toetsmoment 1 en beschrijft de werkzaamheden in het kader van get clean en stay clean.

Toetsmoment 2 (hierna: TM2) geeft invulling aan de wijze waarop datakwaliteit tijdens en na de transitie aantoonbaar geborgd is. Om een juiste en volledige transitie te borgen en te voldoen aan de wettelijke vereisten worden in het kader van TM2 de volgende stappen doorlopen:

- Stap 0. Vaststellen FTK-eindbalans
- Stap 1. Beschikbaar vermogen bepalen voor toepassen van de standaardregel;
- Stap 2. Toepassen van de standaardregel;
- Het onder voorwaarden eventueel afwijken van de uitkomsten van de standaardregel.

Met de toepassing van TM2 wordt toegezien op het beheerste verloop van de uitgevoerde transitie. Dit betekent dat SPF als pensioenuitvoerder vaststelt dat het een integere en beheerste bedrijfsvoering heeft, hetgeen inhoudt dat het vermogen en daarmee dus de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten van de deelnemers juist, volledig en tijdig geregistreerd worden.

Van SPF wordt verwacht dat het alle IT-beheersmaatregelen treft die van toepassing zijn in de verschillende 'good practices' en verordeningen. Het is aan SPF om vast te stellen en te onderbouwen of en – zo ja - welke aanvullende werkzaamheden nodig zijn om een beheerste transitie te kunnen waarborgen. Om dit te realiseren heeft SPF in samenwerking met accountants van KPMG en EY, alsmede met actuarissen van APS en WTW een overleg opgestart waarin de volgende mijlpalen zijn benoemd:

- Opstellen van een planning met daarin alle stappen inzake controle en assurance momenten met betrekking tot:
 - Proefmigraties;
 - Controle van het vermogen per 30 april 2025 en 30 juni 2025;
 - Controle van omzetting van de aanspraken in persoonlijke vermogens.
- Controle van de FTK eindbalans op 17 juli 2025.

6 Invaren

Bij het vaststellen van de bouwstenen, heeft DPF al in 2021 aangegeven dat invaren van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten voor de deelnemers van SPF de beste optie is. Op het moment dat SPF zou besluiten om niet in te varen, dan blijven de opgebouwde aanspraken tot de transitiedatum achter in het oude FTK-stelsel. Gezien de op dat moment lage dekkingsgraad van SPF zou dit voor de in het huidige stelsel opgebouwde aanspraken mogelijk zelfs tot korten hebben kunnen leiden. Inmiddels is de dekkingsgraad hersteld, maar gevolg van het niet invaren is daarnaast dat er twee afzonderlijke regelingen geadministreerd en beheerd moeten worden. Dit leidt tot een groter risico op fouten, een ingewikkelder beleggingsbeleid, een zwaardere bestuurlijke last, ingewikkeldere communicatie en daarmee tot een verhoging van de uitvoeringskosten. Niet invaren zorgt er ook voor dat het moeilijker is het fonds of de opgebouwde aanspraken in de toekomst elders onder te brengen.

Invaren is in het voordeel van alle belanghebbenden, omdat dit een negatieve impact op de uitvoeringskosten voorkomt. Daarnaast was het alleen met invaren mogelijk om doelgroepen te compenseren in het kader van de overgang naar het nieuwe stelsel en mogelijke onevenwichtigheid van de afgelopen jaren. Wel invaren is bovendien ook de standaard in de wetgeving. DPF en SPF hebben gedurende het transitietraject geen reden gezien om hiervan af te wijken. DPF verzoekt SPF daarom om de per de transitiedatum opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in te varen in de nieuwe pensioenregeling.

Het bestuur van SPF heeft het verzoek van DPF getoetst aan de wettelijke criteria (art 102a en art 150l PW). Op grond van de positieve uitkomsten van deze toets, welke nader uitgewerkt is in de opdrachtbevestiging aan sociale partners, heeft het bestuur besloten om de opdracht te aanvaarden en uitvoering te gaan geven aan de flexibele premiereregeling per 1 juli 2025. Het bestuur zal tevens de bestaande pensioenaanspraken en -rechten per dezelfde datum invaren in de nieuwe regeling.

De fondsorganen en de uitvoerders van SPF zijn meegenomen in het proces van het vormgeven van de pensioenregeling (o.a. financiële opzet) en het aanwenden van het fondsvermogen. De organen zijn ook nauw betrokken geweest bij het besluitvormingsproces over het invaren. Het verantwoordingsorgaan heeft daarover op 20 juni 2023 een unaniem positief advies gegeven.

6.1 Tijdelijk geruisloos invaren

De vraag is daarbij hoe het invaren wordt vormgegeven. Hierbij heeft SPF ervoor gekozen om bij de overgang eerst tijdelijk geruisloos in te varen. Tijdelijk geruisloos invaren betekent dat pensioengerechtigden op de transitiedatum overgaan met dezelfde uitkering die zij ook onder het FTK ontvingen. Na ongeveer 3 maanden wordt vervolgens, op het moment dat alle vermogensstanden op de transitiedatum bekend zijn en de exacte dekkingsgraad op de transitiedatum is vastgesteld, bekeken welke aanpassing (positief dan wel negatief) moet worden verricht om de uitkeringen te laten aansluiten bij de dekkingsgraad op de transitiedatum.

Door deze werkwijze krijgt enerzijds de uitvoeringsorganisatie meer tijd om de eindstanden te bepalen en de uitkeringen hierop aan te passen. En is er tijd voor een zorgvuldig proces in het kader van Toetsmoment 2. Anderzijds levert dit minder onzekerheid op voor de pensioengerechtigden. Zij krijgen de zekerheid dat ze in eerste instantie overgaan met dezelfde uitkering als onder het FTK. Daarna krijgen zij de keuze voor een vast of een variabel (dalend) pensioen, waarna ze in één keer de juiste pensioenuitkering onder het nieuwe stelsel ontvangen, zonder dat daarop nog aanpassingen moeten worden gedaan. Dit helpt aan het bouwen van vertrouwen in het nieuwe stelsel.

6.2 Standaardmethode met spreidingsperiode 10 jaar

De standaardmethode is wettelijk gezien de default bij invaren. Alleen als het bestuur oordeelt dat de standaardmethode onevenwichtig uitpakt, kan worden ingevaren met de Value Based ALM

methode. Het bestuur onderbouwt in dat geval hoe en waarom het fonds invaart met de Value Based ALM methode.

Vanaf het begin had SPF de voorkeur voor de standaardmethode. SPF vindt namelijk de uitlegbaarheid richting de deelnemers erg belangrijk. Daarnaast weegt ook het nadeel van de gevoeligheid voor aannames in de Value Based ALM methode voor het bestuur heel zwaar. In de standaardmethode kan het onverdeeld vermogen (vermogen van toekomstige generaties) gericht worden toegedeeld aan groepen (afhankelijk van status en leeftijd) om te compenseren voor bijvoorbeeld afschaffing van de doorsneesystematiek. Dit laatste is niet aan de orde bij SPF.

Het bestuur is gedurende het besluitvormingsproces van mening gebleven dat de standaardmethode voor SPF passend is en niet af te wijken van de standaardmethode als default keuze. De volgende overwegingen spelen hierbij een rol:

- Het bestuur heeft de netto profijt-effecten van beide methoden beoordeeld. Invaren met de Value Based ALM methode kan voor wat betreft de bestaande aanspraken neerkomen op dezelfde verdeling van vermogen als invaren met de standaardmethode. Oftewel bij het invaren met de standaardmethode krijgt iedere deelnemer ten minste de zogenaamde inclusieve marktwaarde van de bestaande aanspraken mee.
- Er is bij SPF geen sprake van gemiste indexaties die eerst nog ingehaald zouden kunnen worden voordat het onverdeeld vermogen wordt verdeeld.
- Door de 2% onvoorwaardelijke indexatie werkt het afschaffen van de doorsneesystematiek voor SPF anders dan in het geval deze onvoorwaardelijke indexatie er niet was geweest. Uit de actuariële tarieven voor het pensioen blijkt dat de jonge deelnemers momenteel een beperkt voordeel ondervinden van de doorsneesystematiek. Dit beeld wordt bevestigd door de netto profijtberekeningen. De groep 40-plussers hoeft niet gecompenseerd te worden voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Ze hebben in het verleden immers, in tegenstelling tot pensioenfondsen zonder onvoorwaardelijke indexatie, geen nadeel ondervonden van de doorsneesystematiek.
- Ook voor de jonge deelnemers is compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek niet nodig: De jongeren hebben, als gevolg van de 2% onvoorwaardelijke indexatie, in het verleden nooit nadeel ondervonden van de doorsneesystematiek. Het is dus niet zo dat zij in het verleden een 'te hoge' premie voor hun pensioen hebben betaald en daar in de toekomst voor gecompenseerd verwachten te worden.
- Uit de ALM studie blijkt dat het pensioenperspectief van de jongeren in de nieuwe pensioenregeling het meeste verbetert ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen. De jongeren profiteren het langst van een beleid dat rekening houdt met hun beleggingshorizon.


Het bestuur van SPF heeft besloten om bij invaren gebruik te maken van de default spreidingstermijn van 10 jaar. Onder de huidige regeling worden dekkingstekorten of overschotten ook gespreid toegedeeld aan de deelnemers. Door ook bij invaren van een lange spreidingshorizon uit te gaan, wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de huidige regeling, wat de evenwichtigheid van de transitie ten goede komt. Afwijken van de default leidt naar het oordeel van het bestuur niet tot een meer evenwichtige transitie.

6.3 Het invaarproces

6.3.1 Het invaarproces in de pensioenadministratie

Het invaarproces is een eenmalig proces in de transitie en daarmee in de administratieve uitvoering. De gegevens en de onderliggende berekeningen moeten echter wel worden vastgelegd en verantwoord zodat deze raadpleegbaar en reproduceerbaar zijn en blijven. De uitkomsten zijn echter afhankelijk van de situatie op dat ene moment van transitie. Dit betekent dat ze pas op het transitiemoment definitief kunnen worden vastgelegd. Voorafgaand aan dit moment moet er wel communicatie plaatsvinden en worden geanticipeerd op de mogelijke gevolgen in het vermogen en

de administratie. Het is belangrijk dat gedurende de periode voor het transitiemoment inzicht kan worden gegeven in de ontwikkelingen inclusief de gevolgen voor de deelnemers, de reserves en de vermogens. Om dit proces te ondersteunen is binnen ACE² een invaarmodule ontwikkeld. Deze invaarmodule berekent de stappen van het invaarproces zowel voor het totale bestand als de gevolgen per deelnemer. Ook zullen de wettelijk verplichte toetsen hier worden uitgevoerd. In aanloop kunnen op basis van gegevens uit het latende systeem (MAIA) of de bestaande uitkeringsregeling pro forma berekeningen plaatsvinden.

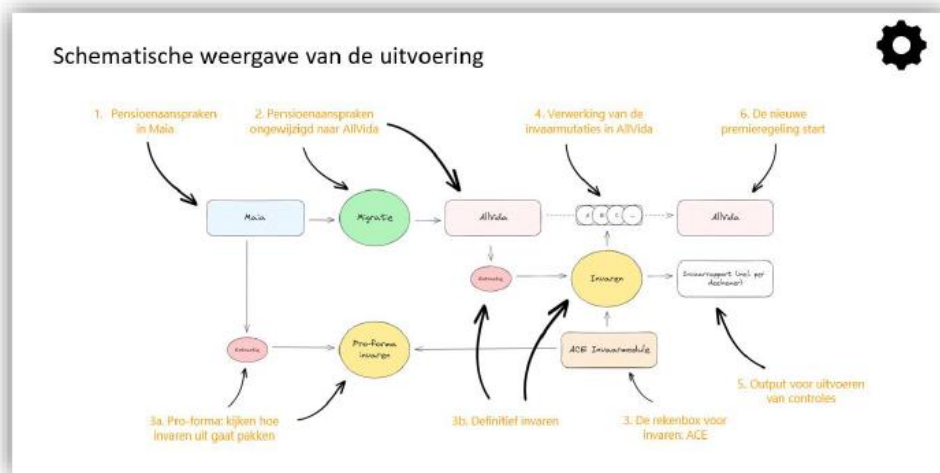

De benodigde gegevens voor de transitie worden gemigreerd vanuit MAIA naar AllVida. Indien noodzakelijk kunnen deze gegevens worden verrijkt met URM prognoseberekningen en andere kenmerken. De stand die wordt gebruikt voor de invaarberekening wordt vastgelegd als beginstand in AllVida. Voor de definitieve migratie kunnen gegevensbestanden direct vanuit MAIA worden gebruikt in ACE. Hiermee kunnen in de periode voor de werkelijke migratie wel al pro forma invaarberekeningen plaatsvinden in de invaarmodule van het actuariële systeem (ACE).

De output van de invaarmodule is tweeledig:

1. De invaarmodule levert een inputbestand voor AllVida met de factoren per leeftijd/status/pensioenvorm waarmee in AllVida (pensioenadministratie) de invaarstappen doorlopen kunnen worden.
2. Daarnaast levert de invaarmodule rapportages waarmee het proces van invaren kan worden verantwoord. Het gaat om de volgende rapportages: De individuele kapitalen per pensioenvorm per polis na invaren + tussenstappen.
 - De individuele kapitalen geaggregeerd per polis na invaren + tussenstappen.
 - De kasstromen per leeftijd in de opbouwphase na invaren.
 - De kasstromen in het collectief variabel pensioen na invaren


ACE levert de benodigde tabellen, en gegevens zodat in AllVida de invaarberekeningen per deelnemer kunnen worden uitgevoerd die dezelfde uitkomsten genereren. Bij het definitieve invaren zullen de voor de deelnemer relevante tussenresultaten en gegevens in AllVida worden vastgelegd waarmee de nieuwe regeling kan starten. Deze gegevens vormen ook de basis voor de communicatie over de gevolgen van de transitie naar de deelnemers en de keuzes die in de nieuwe regeling kunnen worden gemaakt. De stappen in het invaarproces zijn per deelnemer reproduceerbaar zodat

² De invaarmodule van ACE wordt gebruikt om het aanwezige pensioenfondsvermogen op het transitiemoment te verdelen in persoonlijke en collectieve pensioenvermogens volgens de standaardmethode. Dit is de scope van het initiële model dat extern gevalideerd is door Milliman. Milliman en APS hebben een acceptatiegrens afgesproken van 0,125% (maximale individuele afwijking o.b.v. maatmens).

eventuele correctie van aanspraken voorafgaand aan invaren met terugwerkende kracht kunnen worden verwerkt.

6.3.2 Invaarberekeringen in ACE

APS voert voor SPF het invaren uit. Dit gebeurt in het systeem ACE. Het hele proces ziet er als volgt uit:

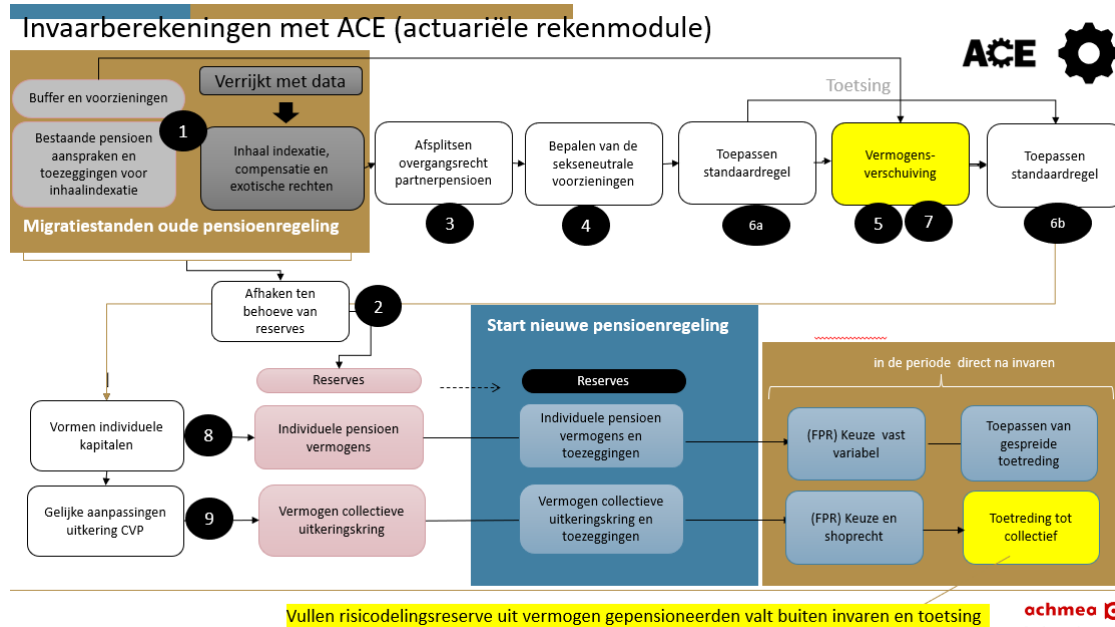

6.4 Minimaal vereist eigen vermogen, operationele reserve en risicodelingsreserve

6.4.1 Minimaal vereist eigen vermogen

Net zoals onder het huidige Financieel Toetsingskader (Ftk), moet een pensioenfonds ook in het nieuwe pensioenstelsel beschikken over een minimaal vereist eigen vermogen (MVEV). Het MVEV voor een premieregeling is te verdelen in drie elementen.

1. Component afhankelijk van de beheerslasten
 - a. Als de beheerslasten meer dan 5 jaar vastliggen (of de resterende contractduur meer dan 5 jaar is): 1% van de som van alle persoonlijke pensioenvermogens
 - b. Als beheerslasten 5 jaar of minder vastliggen (of de resterende contractduur 5 jaar of minder is): 25% van de jaarlijkse beheerslasten
2. Biometrisch risico overlijden
3. Biometrisch risico arbeidsongeschiktheid

Omdat SPF met APS een contract voor de duur van 5 jaar sluit, wordt voor de component afhankelijk van de beheerslasten uitgegaan van 25% van de jaarlijkse beheerskosten. Op basis van de uitvoeringskosten uit de jaarrekening 2023 is dat € 6.300.000. Dit onderdeel van het MVEV is dan ongeveer gelijk aan 0,04% van het vermogen.

De onderdelen biometrisch risico overlijden en biometrisch risico arbeidsongeschiktheid behandelen we samen.

We beschouwen de onderdelen van het MVEV in het licht van de huidige DB verplichtingen. Uit het jaarverslag 2023 blijkt dat het totale MVEV voor SPF ca. 4,3% bedraagt. Daarvan is 4%-punt vanwege het feit dat het pensioenfonds het beleggingsrisico over het DB-deel loopt. De overige 0,3% is voor de biometrische risico's van overlijden en arbeidsongeschiktheid samen.

Nu kijken we vooruit naar de situatie dat SPF over is naar de FPR. Voor het MVEV nemen we gemakshalve aan dat de omvang van de biometrische risico's gelijk is aan de huidige situatie. Dit

doen we vanuit de gedachte dat de risico's niet significant veranderen. De hoogte van de biometrische risico's in het MVEV zou dan gelijk moeten zijn aan 0,30%.

In combinatie met de 0,30% als componentafhankelijk van de beheerslasten komt het MVEV onder de Wtp uit op 0,34%

Het eigen vermogen dat voor het MVEV wordt aangehouden, wordt als een aparte balanspost aangehouden. Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel wordt het MVEV vóór het invaren initieel gevuld vanuit het collectieve fondsvermogen, ongeacht de dekkinggraad op het moment van overgang.

6.4.2 Operationele reserve

De operationele reserve is een reserve voor operationele en onvoorziene (technische) resultaten. DNB heeft op 18 april 2024 een Q&A gepubliceerd die ingaat op de operationele reserve en onder welke voorwaarden deze mag worden gevormd. Hieruit volgt onder andere dat de operationele reserve eigen vermogen is dat met het MVEV wordt afgezonderd voor de toepassing van de omrekenmethoden.

SPF houdt een operationele reserve aan voor de volgende doelen:

- Resultaat op MVEV
- Resultaat risicodekkingen
- Resultaat op premievrije opbouw
- TWK mutaties onvoorzien
- Resultaat op kosten (voorziening)
- Resultaat op overgangsrecht NP
- Reserve mogelijke transitie claims
- Reserve transitie onvoorzien

Op basis van een inschatting van de hoogtes van de voorzieningen ultimo 2024 en de risicopremies ultimo 2023 op basis van de nieuwe regeling in de FPR heeft het bestuur de operationele voorziening vastgesteld op 1,36% van het vermogen op transitiedatum. Dit wordt omgerekend naar een bedrag dat wordt afgesplitst.

De operationele reserve kent verschillende doelen. Deze reserve wordt als een geheel beschouwd. Een positief (jaar)resultaat op één onderdeel van de operationele reserve kan dan een negatief (jaar)resultaat op een ander onderdeel salderen. Uiteraard dienen die verschillende beleidsdoeleinden wel transparant te zijn. In de jaarlijkse verantwoording wordt de hoogte van de reserve geëvalueerd en wordt nader stil gestaan bij de vraag of de doelstellingen van de operationele reserve nog allemaal bestaan en of de hoogte daarbij passend is of moet worden bijgesteld.

6.4.3 Risicodelingsreserve

De risicodelingsreserve in de FPR van SPF is alleen voor pensioengerechtigden en is alleen bedoeld om nominale verlagingen zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat gepensioneerden shoprecht hebben in de FPR, vindt het bestuur van SPF het onwenselijk dat de risicodelingsreserve voor toepassing van de standaardmethode wordt gevuld. De risicodelingsreserve wordt na de transitie, evenals in de toekomstige "run" situatie, betaald uit het inkooptarief bij aankoop van de pensioenuitkering. Dit gebeurt op het moment dat de gepensioneerden hebben gekozen voor een variabele uitkering in het pensioenfonds.

6.5 Premievrije voortzetting en nabestaandenpensioen

Deze paragraaf beschrijft hoe SPF bij de transitie omgaat met premievrije voortzetting bij invaliditeit en nabestaandenpensioen

6.5.1 Premievrije voortzetting bij invaliditeit (PVI)

Premievrijstelling vindt na de transitie op dezelfde wijze plaats als nu. Voor de deelnemers die op de transitiedatum recht op premievrijstelling hadden, stellen we een fictief pensioengevend inkomen vast. Dit fictieve pensioengevend inkomen verminderen we met de franchise van 2025. De pensioengrondslag die hiermee ontstaat vormt de basis voor de berekening van de vrijgestelde premie in de pensioenregeling die vanaf 1 juli 2025 geldt. We stellen het fictieve pensioengevend inkomen per 1 juli 2025 zodanig vast dat de vrijgestelde premie in deze pensioenregeling gelijk is aan de vrijgestelde premie die gold op 30 juni 2025.

6.5.2 Nabestaandenpensioen

Het partnerpensioen bij overlijden van een deelnemer vóór pensionering wordt in de nieuwe regeling verzekerd op basis van risicodekking. De deelnemer, tenzij hij of zij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, moet zelf de partner melden. Het partnerpensioen voor pensionering bedraagt:

In de Basisregeling:

- Voor fysiotherapeuten in loondienst: 15,1% van het pensioengevend salaris
- Voor fysiotherapeuten werkzaam als zelfstandige: 11,9% van het pensioengevend beroepsinkomen.

Dekking bedraagt in de BasisPlusregeling:

- Voor fysiotherapeuten in loondienst: 21,2% van het pensioengevend salaris
- Voor fysiotherapeuten werkzaam als zelfstandige: 19,0% van het pensioengevend beroepsinkomen.

Na het eindigen van de deelneming, sluit de pensioenregeling aan op de wettelijke verplichting om de dekking van het partnerpensioen voort te zetten. De dekking van het partnerpensioen loopt dan gedurende 6 maanden door. De dekking eindigt eerder als de gewezen werknemer een dienstverband aangaat bij een nieuwe werkgever of als het ouderdompensioen ingaat.

Als de gewezen deelnemer van SPF na het eindigen van de deelneming recht krijgt op een WW-uitkering of Ziektewetuitkering dan loopt de dekking van het partnerpensioen wettelijk verplicht ook na het verstrijken van de periode van 6 maanden door.

Gewezen deelnemers krijgen, na afloop van de dekking in de hierboven beschreven situaties, de mogelijkheid om de dekking van het partnerpensioen vrijwillig voort te zetten. De hiervoor benodigde risicopremie wordt gefinancierd vanuit het opgebouwde persoonlijke pensioenvermogen. Hierdoor wordt de pensioenuitkering na pensionering lager.

De opgebouwde aanspraken op partnerpensioen blijven beschikbaar voor partners of (toekomstige) ex-partners. Lopende uitkeringen van partnerpensioen op transitiemoment worden omgezet naar een variabel pensioen. De uitkeringen van het partnerpensioen worden jaarlijks met hetzelfde percentage aangepast als alle andere uitkeringen aan de uitkeringsgerechtigden.

6.5.3 Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt verzekerd op basis van risicodekking en bedraagt 20% van de hier boven beschreven percentages van het nabestaandenpensioen. Het wezenpensioen eindigt als de wees de leeftijd van 25 jaar bereikt.

Lopende uitkeringen van het wezenpensioen op transitiemoment worden voortgezet met de einddatum die van toepassing was op het moment dat de uitkering in ging. De uitkeringen van het wezenpensioen worden omgezet naar een variabel pensioen en worden jaarlijks met hetzelfde percentage aangepast als alle andere uitkeringen aan de uitkeringsgerechtigden.

6.6 Uitgangspunten overgang naar het nieuwe stelsel

Gedurende het besluitvormingsproces naar de nieuwe pensioenregeling heeft het bestuur een aantal uitgangspunten geformuleerd, die als richtlijn / toets hebben gefungeerd bij het nemen van besluiten. Deze uitgangspunten vormen samen “het verhaal” van SPF, dat ten grondslag ligt aan de besluiten die het bestuur van SPF in afstemming met de stakeholders heeft genomen. Dit verhaal moet goed evenwichtig en uitlegbaar zijn en passen bij het credo “van, voor en door fysiotherapeuten”.

De uitgangspunten in het besluitvormingsproces naar de nieuwe pensioenregeling zijn:

- SPF voert in opdracht van DPF een verplicht gestelde beroepspensioenregeling uit van, voor en door fysiotherapeuten.
- SPF is de hoeder van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten en moet bij het nemen van besluiten met de belangen van alle deelnemers rekening houden. Dit impliceert dat het geheel van besluiten evenwichtig moet uitpakken voor alle deelnemers.
- De nieuwe pensioenregeling moet passen bij de kernwaarden en de toekomstvisie van SPF.
- Het transitietraject is een traject dat het bestuur van SPF niet alleen kan afleggen. Het bestuur moet continu worden gevoed vanuit alle stakeholders. Daarom heeft het bestuur van SPF in het gehele besluitvormingsproces (dat medio 2019 is opgestart) samen opgetrokken met de deelnemersvereniging (DPF) en het verantwoordingsorgaan van SPF. Ook heeft de visitatiecommissie het bestuur periodiek gechallenged. Daarnaast zijn frequent nieuwsberichten gedeeld met de achterban, en zijn polls en webinars georganiseerd om de achterban bij het proces te betrekken.
- Solidariteit en collectiviteit vormen de basis van de nieuwe pensioenregeling, waarbij solidariteit betekent “risico’s als collectief samen delen”.
- Herverdeling tussen generaties past niet in de nieuwe pensioenregeling. Dit komt mede door de individualisering van de maatschappij en de beroepsgroep. Het gehele transitietraject betekent voor SPF “nog één keer herverdelen om daarna te stoppen met (intergenerationeel) herverdelen”.
- Houd het eenvoudig. De nieuwe pensioenregeling moet begrijpelijk zijn voor de deelnemers en eenvoudig zijn uit te voeren door de pensioenuitvoeringsorganisatie. Hierdoor kunnen ook de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Omdat de beroepsgenoten de volledige premie zelf moeten betalen en hun tarieven en daarmee hun inkomen al jaren ongeveer gelijk blijft, is dit een belangrijk vertrekpunt. Ook zorgt dit ervoor dat de kans op fouten zo klein mogelijk is. Op de langere termijn maakt dit de samenwerking en/of het samengaan met andere pensioenfondsen makkelijker.

6.7 Doelstellingen, maatstaven en bandbreedtes

Voor een beheerste en evenwichtige transitie is het van belang dat de transitiebesluitvorming door sociale partners en pensioenfondsen robuust is, met het oog op wijzigende financiële en economische omstandigheden. Complete besluitvorming voorkomt dat besluitvorming in een laat stadium onder druk opnieuw moet plaatsvinden, met risico’s voor de kwaliteit, beheersing en tijdigheid ervan.

In het kader van een beheerste en evenwichtige transitie hebben DPF en SPF doelstellingen geformuleerd die het bestuur mee moet nemen in de invulling van de nieuwe pensioenregeling. De

maatstaven die worden gebruikt om het behalen van deze doelstellingen inzichtelijk te maken zijn netto profijt en pensioenverwachting.

6.7.1 Doelstellingen

De wijze waarop het invaren van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in de nieuwe pensioenregeling moet plaatsvinden, is met vele waarborgen omkleed. Er zijn vele regels die gevolgd moeten worden en veel partijen die hierop toezicht houden. De uiteindelijke beslissing om wel of niet in te varen moet evenwichtig zijn.

Uiteraard moeten alle (groepen van) deelnemers krijgen waar zij recht op hebben. Daarom hebben partijen specifieke afspraken gemaakt over de wijze waarop het totale vermogen wordt verdeeld over alle deelnemers en hoe de verschillende reserves worden gevuld. Deze vul- en uitdeelregels heeft SPF vastgelegd in het zogenoemde evenwichtigheidskader.

De verplichte onderdelen, randvoorwaarden en doelen voor het evenwichtigheidskader zijn:

1. Wettelijk verplichte onderdelen:
 - a. Minimaal vereist eigen vermogen wordt afgesplitst
 - b. Operationele reserve wordt afgesplitst
2. Fondsspecifieke doelstellingen :
 - a. Pensioengerechtigden krijgen:
 - direct na de transitie minimaal een gelijke uitkering als voor de transitie.
 - na de transitie naar verwachting ook op de lange termijn minimaal een min of meer gelijke uitkering als voor de transitie.
 - na de transitie in slecht weer op de lange termijn maximaal een beperkt lagere uitkering dan voor de transitie.
 - b. Voorkomen dat voor deelnemersgroepen en/of generaties door de transitie sprake is van:
 - onevenredig grote herverdelingseffecten;
 - een onevenredig gunstige of ongunstige uitgangspositie in het nieuwe stelsel
 - c. Compensatie lage premiedekkingsgraad
 - d. Compensatie afschaffing doorsneesystematiek (indien van toepassing)

Aan de doelstellingen ten aanzien van het invaren is zoals hiervoor weergegeven een bepaalde prioriteit gegeven. Prioritering is nodig voor situaties waarin niet volledig aan alle doelstellingen kan worden voldaan als gevolg van de financiële positie van het pensioenfonds. Daarmee heeft de ene doelstelling in die context meer prioriteit dan de andere. De doelstellingen onder 2a en 2b worden bij alle dekkingsgraden in ogenschouw genomen. Bij hogere dekkingsgraden wordt ook invulling gegeven aan de doelstellingen 2c (Compensatie lage premiedekkingsgraad vanaf 2020) en 2d (Compensatie afschaffing doorsneesystematiek (indien van toepassing)).

Wat betreft doelstelling 2c (Compensatie lage premiedekkingsgraad) geldt dat sinds 2019 met enige regelmaat met zowel DPF als het VO is gesproken over de lage premiedekkingsgraad. Vanwege het grote strategische risico ten aanzien van het draagvlak bij de achterban was het geen optie om de premie te verhogen en/of de opbouw te verlagen. In de praktijk wisselen periodes met een lage premiedekkingsgraad en periodes met een hoge premiedekkingsgraad elkaar op de langere termijn af. Dan middelt dat nadeel op den duur uit. Door de komst van het nieuwe pensioenstelsel is dat perspectief voor de langere termijn echter komen te vervallen.

Voor wat betreft doelstelling 2d (Compensatie afschaffing doorsneesystematiek) geldt voor de meeste pensioenfonds dat oudere actieve deelnemers ('40 plussers') naar verwachting nadeel

zullen ondervinden van de afschaffing van de doorsneesystematiek. Zij hebben in hun jonge jaren te veel betaald voor hun pensioenopbouw en zouden op latere leeftijd gaan profiteren van de doorsneesystematiek. Door de afschaffing van de doorsneesystematiek krijgen zij een lager verwacht te bereiken pensioen. Voor deze groep deelnemers kunnen compensatieafspraken worden gemaakt.

Deze pensioenfondsen kennen echter alleen een nominale pensioenopbouw zonder onvoorwaardelijke indexatie. Door de onvoorwaardelijke indexatie van 2% die bij SPF van toepassing is, werkt het afschaffen van de doorsneesystematiek voor SPF anders dan in het geval deze onvoorwaardelijke indexatie er niet was geweest. Uit de actuariële tarieven voor het pensioen blijkt dat de jonge deelnemers (jonger dan 40 jaar) momenteel een (beperkt) voordeel ondervinden van de doorsneesystematiek. En dat de oudere deelnemers nadeel ondervinden van de doorsneesystematiek. De groep 40-plussers hoeft daarom niet gecompenseerd te worden voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Het is immers niet zo dat zij in het verleden een 'te hoge' premie voor hun pensioen hebben betaald en daar in de toekomst voor gecompenseerd verwachten te worden. DPF en SPF zijn van mening dat het niet nodig is te compenseren voor het wegvallen van een (beperkt) voordeel.

6.7.2 Maatstaven

SPF hanteert in overleg met DPF de wettelijke maatstaven netto profijt en pensioenverwachting, zoals beschreven in het document 2025.02.19 DMB (schoon).

Uitgangspunt van DPF in de overgang naar de WTP is een flexibele premieregeling met een gelijke ambitie en gelijke pensioenpremie voor deelnemers van SPF. Bij de transitie zal nog eenmaal sprake zijn van herverdeling (in verband met de compensatie voor de lage premiedekkingsgraad) om daarna niet meer te hoeven herverdelen.

De communicatie en uitlegbaarheid richting deelnemers zijn erg belangrijk voor DPF. Daarom heeft SPF gekozen om in te varen op basis van de standaardmethodiek en de ambitie (verwacht pensioen) alsmede het actuele premieniveau leidend te maken voor de overgang van de huidige pensioenregeling naar de flexibele premieregeling.

Via verschillende ALM-berekeningen is aangetoond dat voor alle deelnemers in het mediaan scenario een gelijk of hoger verwacht pensioen resulteert in de opgestelde flexibele premieregeling ten opzichte van de huidige pensioenregeling met 3% toeslagambitie. In het slecht weer scenario kunnen de uitkomsten lager uitvallen ten opzichte van de huidige pensioenregeling met 2% onvoorwaardelijke toeslag. Dit extra risico hebben DPF en SPF besproken en wordt geaccepteerd. Wettelijk moet er een transitie naar een beschikbare premieregeling gemaakt worden waardoor er een groter opwaarts en neerwaarts risico voor deelnemers is en een lagere uitkomst in een slecht weer scenario een logisch gevolg is.

Met een gelijke pensioenpremie en een hogere verwacht pensioenresultaat ten opzichte van de huidige pensioenregeling is er geen aanleiding om bepaalde (leeftijds-)groepen te compenseren. Dit wijkt af van het beeld van een gemiddeld pensioenfonds in Nederland, waar veelal compensatie nodig is voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. Dat dit bij SPF niet nodig is, wordt verklaard door de afwijkende pensioenregeling van SPF, waarin sprake is van een onvoorwaardelijke indexatie van 2%. Zie de verdere toelichting in de volgende paragraaf.

Bij herverdeling zal de ene (leeftijds-)groep meer profiteren dan een andere (leeftijds-)groep. Met netto profijt berekeningen verkrijgen partijen op voorhand inzicht in de herverdelingseffecten bij de overgang naar de flexibele premieregeling en wordt de evenwichtigheid van de transitie getoetst. Hierbij is het uitgangspunt gekozen dat er geen (leeftijds-) groepen onevenredig groot voordeel of

nadeel mogen hebben van de overgang naar de nieuwe regeling met invaren volgens de standaardmethodiek.

Tijdens het transitietraject zijn meerdere malen netto profijt berekeningen gemaakt waarbij gebruik is gemaakt van de beschikbare scenariosets op de betreffende momenten, dit zijn de zogenaamde Q-sets. Op basis van deze uitgevoerde berekeningen zijn de volgende conclusies getrokken:

- De omvang van effecten is sterk afhankelijk van “dagkoersen” / voorgeschreven scenariosets, maar de conclusie op hoofdlijnen blijft gelijk;
- Jongere deelnemers hebben bij huidige renteniveaus beperkt voordeel van de doorsneesystematiek in de huidige regeling, oudere deelnemers juist nadeel;
- Oudere deelnemers hebben geen compensatie nodig: bij een gelijke premie volgt naar verwachting een hoger pensioen;
- Jongere deelnemers hebben in het verleden niet te veel betaald als gevolg van de doorsneesystematiek. Bovendien hebben actieven (veelal jongeren) geprofiteerd van de lage premiedekkingsgraad (<100%) en het pensioenperspectief van jongeren in de nieuwe pensioenregeling verbetert het meeste ten opzichte van andere leeftijdsgroepen.

De verschillende berekeningen geven een vergelijkbaar beeld in termen van netto profijt. Hieruit hebben de besturen van DPF en SPF geconcludeerd dat de initiële veronderstelling, dat er geen compensatie benodigd is voor deelnemers bij SPF, bevestigd wordt door actualisatie van de berekeningen in december 2024.

Er zijn netto profijtberekeningen uitgevoerd op diverse momenten in de tijd. Hiermee zijn de transitie-effecten in een breed bereik van rentestanden bekeken. De conclusie is steeds geweest dat de transitie voldoende evenwichtig is. Bij hogere rentestanden ontstaat mogelijk wel een compensatievraagstuk voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Er is dan ook besloten de netto profijtberekeningen opnieuw uit te voeren als de 30-jaars rente boven 4% stijgt, uiterlijk 3 maanden voor de voorgenomen transitiedatum van 1 juli 2025.

Op basis van de uitkomsten is getoetst of deze aanleiding geven om de evenwichtigheid van de transitie in twijfel te trekken en of mogelijk toch een compensatievraagstuk van toepassing is. SPF en DPF hebben geconcludeerd dat bij hogere rentestanden mogelijk wel een compensatievraagstuk voor het afschaffen van de doorsneesystematiek ontstaat. SPF hanteert een premie waarin voor een toeslag van 3% wordt betaald (waarvan 2%-punt onvoorwaardelijk wordt ingekocht). Als de lange rente boven 3% komt ontstaat mogelijk een compensatievraagstuk. Voor kleine overschrijdingen van 3% zal dit effect naar verwachting marginaal zijn. Enerzijds ontstaat het leeftijdseffect van het hanteren van de doorsneepremie-opbouw, maar aan de andere kant is een lagere premie-inleg nodig voor hetzelfde pensioenresultaat.

DPF en SPF hebben daarom afgesproken bij grotere overschrijdingen opnieuw de evenwichtigheid van de transitie te willen toetsen. Bij hogere rentes of een verandering van de vorm van de rentetermijnstructuur kan compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek immers alsnog gewenst zijn. In de netto profijt berekeningen wordt dit zichtbaar bij de doorrekening van de RTS per 30 juni 2023 + 200 basispunten. De verhouding in de inkoop van de pensioenaanspraken bij deze rente tussen de leeftijden 30 en 60 is net iets kleiner dan 2:3. Als deze verhouding kleiner wordt dan 2:3 gaan DPF en SPF daarom opnieuw om tafel om eventuele compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek te bespreken.

6.7.3 Bandbreedtes

In de vroege fases van het transitietraject hebben DPF en SPF samen met de externe deskundigen en het VO de focus vooral gericht op pensioenresultaat. Netto profijt is vooral in algemene zin als toetssteen gebruikt om vast te stellen of er geen grote afwijkingen zichtbaar werden. Recentelijk (eind mei 2024) zijn specifieke bandbreedtes voor het toetsen van beide wettelijke maatstaven opgesteld en besproken door de betrokken gremia.

DPF en SPF hebben in onderling overleg bandbreedtes vastgesteld waaraan de mogelijke uitkomsten op de transitiedatum van de berekeningen inzake netto-profijs en pensioenverwachting worden getoetst. De bandbreedtes worden hierna verder uitgewerkt.

Netto profijt

Maximale achteruitgang actieve deelnemers: -25% (geb. 2005) tot -5% (geb. 1955)

Partijen accepteren in beginsel een maximale achteruitgang van -5%. Een grotere achteruitgang voor jongere actieve deelnemers als gevolg van het vervallen van de doorsneesystematiek is naar het oordeel van DPF en SPF toch passend. Het voordeel dat jonge actieve deelnemers hebben in de huidige pensioenregeling, hoeft niet te worden gecompenseerd. Het nadeel dat ouderen bij de huidige regeling hebben van de doorsneesystematiek zullen deze jongeren immers door de transitie naar de nieuwe regeling niet meer ondervinden. Als dit wel gecompenseerd zou worden, dan zou het zijn alsof actieven bij de start geld mee zouden krijgen.

Maximale vooruitgang actieve deelnemers: 100% (geb. 2005) tot 50% (geb. 1955)

DPF vindt het acceptabel dat de actieve deelnemers erop vooruitgaan, tenzij dit ten koste gaat van de rest van de populatie. De vooruitgang wordt gemaximeerd op 100%. Hoe jonger de actieve deelnemer, des te langer diens beleggingshorizon. Daarom is gekozen voor een met stijgende leeftijd afnemende maximumgrens.

Maximale achteruitgang slapers: -20% (geb. 2005) tot -5% (geb. 1955)

DPF accepteert in beginsel een maximale achteruitgang van -5%. Bij actieve / pensioengerechtigde deelnemers is sprake van een dempend (verlagend) effect als gevolg van nieuwe premie inleg/onttrokken pensioenuitkeringen. Dit effect ontbreekt bij slapers, waardoor het netto effect toch meer negatief mag worden dan 5%.

(NB: -25% bij actieve deelnemers heeft een andere oorzaak dan -20% bij slapers. Bij de actieve deelnemers betreft dit het afschaffen van de doorsneesystematiek; bij de slapers vloeit dit voort uit het feit dat bij een hoge rente jonge slapers relatief weinig kapitaal meekrijgen bij invaren. De contante waarde van de voorziening is immers relatief laag.)

Maximale vooruitgang slapers: 400% (geb. 2005) tot 50% (geb. 1955)

DPF en SPF vinden het acceptabel dat slapers erop vooruitgaan, tenzij dit ten koste gaat van de rest van de populatie. De vooruitgang wordt gemaximeerd op 400%. Hoe jonger de slaper, des te langer diens beleggingshorizon. Daarom is gekozen voor een met stijgende leeftijd afnemende maximumgrens.

DPF en SPF leggen de maximumgrens voor slapers hoger dan voor actieve deelnemers. Gelet op de relatief korte deelnameduur van slapers en de daarmee samenhangende beperkte voorzieningen, kan DPF voor de jongste slapers aanzienlijk hogere percentages accepteren. De impact op de evenwichtigheid is immers zeer beperkt. De gemiddelde deelnameduur van slapers is 8,5 jaar (2022). Dit neemt de laatste jaren af, veel jongeren stoppen al binnen 5 jaar met fysiotherapie in de eerste lijn. Daarnaast is bij slapers, in tegenstelling tot bij actieve deelnemers geen dempend effect van de toekomstige premies, wat in de ogen van het bestuur grotere uitslagen acceptabel maakt.

Maximale achteruitgang pensioengerechtigd: -5% (alle leeftijden)

Partijen accepteren een maximale achteruitgang van -5%. Dat is acceptabel, omdat in het huidige stelsel kortingen langer kunnen worden uitgesteld dan in het nieuwe stelsel. Daar kan dat maximaal 2 jaar. Dit speelt vooral bij een lage dekkingsgraad en lage RTS scenario's, ook al wordt hier wel de risicodelingsreserve gebruikt om de verlagingen in het nieuwe stelsel te dempen.

Maximale vooruitgang pensioengerechtigd: 100% (geb. 2005) tot 50% (geb. vóór 1956)

Partijen vinden het acceptabel dat de pensioengerechtigden erop vooruitgaan, tenzij dit ten koste gaat van de rest van de populatie. Hoe jonger de pensioengerechtigde, des te langer diens beleggingshorizon. Daarom is gekozen voor een met stijgende leeftijd afnemend maximumgrens. De vooruitgang wordt gemaximeerd op 100%, afnemend naar 50% voor oudere pensioengerechtigden.

Het bestuur heeft de verschillen in netto-profijsfeffecten tussen cohorten en tussen verschillende deelnemersgroepen bij verschillende scenario's in kaart gebracht en geanalyseerd. Per analyse heeft het bestuur hieraan conclusies verbonden. Deze zijn uitgewerkt in het document 2025.02.19 DMB (schoon).

Pensioenverwachting

Verwachte vooruitgang actieve deelnemers: 5% (alle leeftijden)

Voor actieven is minimaal een beperkte vooruitgang gewenst. Actieven zullen naar verwachting profiteren van het leeftijdsafhankelijke beleggingsbeleid en het feit dat er nauwelijks nog buffers worden gevormd. Jonge actieven profiteren meer van het leeftijdsafhankelijke beleggingsbeleid dan oudere actieven, maar dit voordeel wordt (bij de huidige rentestand) gedrukt door afschaffing van de doorsneesystematiek. Voor de actieve deelnemers vindt DPF het wenselijk om een minimale stijging van 5% op het pensioenresultaat in het verwachte scenario te realiseren.

Verwachte achteruitgang actieve deelnemers in pessimistisch scenario: -2% (alle leeftijden)

In het nieuwe pensioenstelsel liggen meer risico's bij de actieve deelnemers, omdat er minder buffers worden gevormd. In een pessimistisch scenario vindt DPF een beperkte daling van 2% op de pensioenverwachting acceptabel. De afweging van DPF is dat een beperkte daling acceptabel is, zolang de vooruitgang in het verwachte scenario groter is.

Verwachte vooruitgang slapers: 20% (geb. 2005) tot 5% (geb. 1955)

Voor slapers is minimaal een beperkte vooruitgang gewenst. Slapers zullen naar verwachting profiteren van het leeftijdsafhankelijke beleggingsbeleid en het feit dat er nauwelijks nog buffers worden gevormd. Omdat jonge slapers (bij de huidige rentestand) geen nadeel ondervinden van afschaffing van de doorsneesystematiek is een hogere vooruitgang in een verwacht scenario gewenst. Voor de jongste slapers is een minimale toename van 20% gewenst. Dit loopt af naar 5% voor de oudste slaper (in lijn met actieven).

Verwachte achteruitgang slapers in pessimistisch scenario: -2% (alle leeftijden)

In het nieuwe pensioenstelsel liggen meer risico's bij de slapers, omdat er minder buffers worden gevormd. In een pessimistisch scenario vindt DPF een beperkte daling van 2% op de pensioenverwachting acceptabel. De afweging van DPF is dat een beperkte daling acceptabel is, zolang de vooruitgang in het verwachte scenario groter is.

Verwachte vooruitgang pensioengerechtigd: -5% (alle leeftijden)

Partijen vinden het eigenlijk onwenselijk dat huidige pensioengerechtigden er bij de overgang op achteruit gaan. Bij het pensioenresultaat wordt gekeken naar de reële uitkering van de

pensioengerechtigden over 10 jaar. Het collectief van pensioengerechtigden kan in het nieuwe stelsel geen beleggingsrisico meer delen met de jongere deelnemers. Dit betekent dat het lastiger is om de koopkracht van dit collectief op peil te houden zonder buiten de risicohouding te treden. DPF en SPF accepteren daarom in het verwachte scenario een maximale daling van 5% in de pensioenverwachting van pensioengerechtigden.

Verwachte achteruitgang pensioengerechtigd in pessimistisch scenario: -10% (alle leeftijden)

In het pessimistische scenario gelden voor pensioengerechtigden dezelfde argumenten als voor het verwacht weer scenario. De achteruitgang in de pensioenverwachting in het pessimistische scenario mag daarom wat groter zijn, maar moet beperkt worden door de risicodelingsreserve en het beleggingsbeleid van het pensioengerechtigden collectief. DPF vindt een maximale daling van 10% in het pessimistisch scenario acceptabel.

De conclusies die partijen hebben getrokken luiden als volgt:

Netto profijt

- De uitkomsten van de netto profijt berekeningen vallen allemaal binnen de bandbreedtes, behalve in de het scenario met hoge rentes. Hier zien wij dat de slapers in termen van netto profijt onvoldoende profiteren van de overgang naar het nieuwe stelsel.
- Daarnaast zien wij voor de actieven dat de middengroep er minder op vooruit gaat dan de ouderen en de jongeren. Dit komt doordat deze groep bij hoge rente benadeeld wordt door het afschaffen van de doorsneesystematiek.
- Ook de oudere slaperscohorten vallen soms buiten de bandbreedtes, maar dit wordt veroorzaakt door een verschil van de behandeling in het model van deelnemers na de pensioenrichtleeftijd van wie de uitkering nog niet is ingegaan.

Pensioenverwachting

- Ook de uitkomsten van de doorrekening van de pensioenverwachting vallen binnen de bandbreedtes, behalve wederom in het scenario met hoge rentes. Hier zien wij dat de slapers en de pensioengerechtigden teveel nadeel ondervinden van de overgang. Als dat scenario zich voordoet is de afspraak met DPF dat we dan weer in overleg gaan. Dit is een extreem scenario met een lage waarschijnlijkheid dat het zich voordoet.
- Binnen de drie groepen (slapers, actieven en gepensioneerden) zien we verschillen in pensioenverwachting maar die zijn verklaarbaar. Ook de verschillen binnen dezelfde leeftijdscohorten van deze drie groepen ten opzichte van elkaar zijn verklaarbaar. Daarbij vallen alle uitkomsten, dus ook deze verschillen, binnen de gedefinieerde bandbreedtes. Het ligt bij sommige deelnemers wat verder uit elkaar, maar er is niemand die er onevenredig op achteruitgaat ten opzichte van een ander.

Monitoring bandbreedtes

SPF en DPF hebben geconcludeerd dat bij hogere rentestanden mogelijk wel een compensatievraagstuk voor het afschaffen van de doorsneesystematiek ontstaat. SPF hanteert een premie waarin voor een toeslag van 3% wordt betaald (waarvan 2%-punt onvoorwaardelijk wordt ingekocht). Als de lange rente boven 3% komt ontstaat mogelijk een compensatievraagstuk. Voor kleine overschrijdingen van 3% zal dit effect naar verwachting marginaal zijn. Enerzijds ontstaat het leeftijdseffect van het hanteren van de doorsneepremie-opbouw, maar aan de andere kant is een lagere premie-inleg nodig voor hetzelfde pensioenresultaat.

DPF en SPF hebben daarom afgesproken bij grotere overschrijdingen opnieuw de evenwichtigheid van de transitie te willen toetsen. Bij hogere rentes of een verandering van de vorm van de rentetermijnstructuur kan compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek immers alsnog gewenst zijn. In de netto profijt berekeningen wordt dit zichtbaar bij de doorrekening van de RTS per 30 juni 2023 + 200 basispunten. De verhouding in de inkoop van de pensioenaanspraken bij deze rente tussen de leeftijden 30 en 60 is net iets kleiner dan 2:3. Als deze verhouding kleiner wordt dan 2:3 gaan DPF en SPF daarom opnieuw om tafel om eventuele compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek te bespreken.

6.8 Evenwichtigheidskader

Op basis van de geformuleerde verplichte onderdelen, randvoorwaarden en doelen komen we tot de volgende invulling van het evenwichtigheidskader:

Dekkingsgraad bij invaren	90%	95%	100%	105%	110%	115%	120%	125%	130%	135%	140%
MVEV	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Operationele reserve	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Voorziening voor liquidatiekosten	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
DG na vullen reserves	88%	93%	98%	102%	107%	112%	117%	122%	127%	132%	137%
Standaardmethode	Spreidingsperiode 10 jaar										
Actieven											
45 jaar en jonger	86%	92%	98%	103%	108%	114%	120%	126%	131%	137%	143%
55 jaar	86%	92%	98%	103%	108%	114%	120%	125%	131%	137%	142%
65 jaar	89%	94%	98%	102%	106%	111%	115%	119%	124%	128%	133%
Slapers											
45 jaar en jonger	86%	92%	98%	104%	110%	115%	121%	127%	133%	138%	144%
55 jaar	86%	92%	98%	104%	109%	115%	121%	127%	132%	138%	144%
65 jaar	89%	94%	98%	103%	107%	112%	116%	121%	125%	129%	134%
Pensioengerechtigden	exclusief eventuele toekomstige bijdrage aan risicodelingsreserve										
allen	90%	94%	98%	103%	107%	112%	116%	120%	125%	129%	133%
Uitkering bij start	Afgezien van omzetting onvoorwaardelijke indexatie.										
	Uitkering gespreid over 3 jaar en indien nodig aangevuld tot 100% vanuit Risicodelingsreserve										
pensioengerechtigden	100%	100%	100%	100%	101%	102%	104%	105%	107%	108%	109%

Bij alle dekkingsgraadniveaus zonderen we eerst een deel van het vermogen af voor het minimaal vereist eigen vermogen en de operationele reserve. Daarna gebruiken we de standaardregel (10 jaar) voor het toekennen van het overgebleven vermogen (zowel positief als negatief). Hiermee krijgen oudere deelnemers iets minder van het tekort of overschot toegekend en jongeren iets meer, in lijn met het huidige FTK. Daarbij houden we rekening met gelijke aanpassingen van de uitkeringen voor pensioengerechtigden in de toebedeling van individuele pensioenvermogens.

Bij aanvang wordt de risicodelingsreserve niet gevuld. Pensioengerechtigden die ervoor kiezen om deel te nemen aan het collectief variabel pensioen, zullen bij de definitieve toetreding tot het collectief variabel pensioen 3% van hun vermogen afdragen aan de risicodelingsreserve. De risicodelingsreserve kan indien nodig direct voor 15% van het vermogen in de risicodelingsreserve worden aangewend om een verlaging van de uitkering te voorkomen.

Bij het opstellen van het invaarkader is het bestuur er aanvankelijk vanuit gegaan dat de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten onderdeel blijft van het vermogen van de deelnemer. Het is helaas gebleken dat dit niet is toegestaan. Het fonds dient een separate kostenvoorziening aan te houden. De impact hiervan op het door SPF vastgestelde invaarkader is verwaarloosbaar. Op dit moment maakt de kostenvoorziening ook onderdeel uit van de voorziening van de deelnemers. Bij het separaat aanhouden van een kostenvoorziening zal deze zowel worden afgehaakt van het vermogen als van de voorziening van de deelnemers. Het effect hiervan op de verdeling van het vermogen over de deelnemers is zo klein, dat het kwantitatieve invaarkader op de vorige pagina hierdoor niet wijzigt.

Invaardekkingsgraad gelijk aan 90%

Bij dekkingsgraden onder 90% zullen de aanspraken en uitkeringen eerst moeten worden gekort, zodanig dat de dekkingsgraad tenminste gelijk is aan 90%. Geen van de doelstellingen bij invaren is in dat geval haalbaar en dan moet SPF dus weer met DPF in overleg.

In het eerdere evenwichtigheidskader is gerekend met een invaardekkingsgraad van 92%. Met de nadere invulling van de risicodelingsreserve blijkt ook een invaardekkingsgraad van 90% haalbaar. Het bestuur heeft daarom een invaardekkingsgraad van 90% in het invaarsjabloon opgenomen. Korten tot een dekkingsgraad van 92% is immers niet nodig en daarmee ook niet toegestaan, aangezien korten ultimum remedium is. Het bestuur realiseert zich dat de dekkingsgraad van 90% niet in lijn is met laagste doorgerekende dekkingsgraad van 92% in het invaarsjabloon. Gegeven de huidige financiële positie van het fonds, ziet het bestuur geen aanleiding om de doorrekening voor de lage dekkingsgraad opnieuw te doen.

Dekkingsgraden tussen de 90% en 102%

Bij dekkingsgraden tussen de 90% en 102% is alleen de doelstelling om de uitkering van pensioengerechtigden niet hoeven korten bij overgang haalbaar. Iedereen zal minder dan de voorziening meekrijgen bij de transitie, ook pensioengerechtigden. Pensioengerechtigden die de keuze maken om deel te nemen aan de collectieve uitkeringsfase dragen 3% van hun kapitaal af aan de risicodelingsreserve. De risicodelingsreserve wordt direct aangewend om een pensioenverlaging in het eerste jaar te voorkomen.

Bij hogere dekkingsgraden dan 90% komt er steeds meer vermogen beschikbaar om aan de verschillende wettelijke verplichtingen en doelstellingen te voldoen. De eerste onttrekking uit de risicodelingsreserve om een eerste korting voor pensioengerechtigden te voorkomen wordt steeds kleiner en bij hogere dekkingsgraden kan iedereen steeds een hoger percentage van de voorziening meekrijgen.

Dekkingsgraden tussen 102% en 105%

Vanaf een dekkingsgraad vanaf 102% kan iedereen tenminste 100% van de technische voorziening meekrijgen. Herverdeling van individuele pensioenvermogens is bij deze dekkingsgraden niet toegestaan. Er kan daarom nog niet worden voldaan aan de doelstelling om slapers en pensioengerechtigden te compenseren voor de lage premiedekkingsgraden in de recente jaren.

Gewenste dekkingsgraad 105%

Bij dekkingsgraden van 105% tot 110% mag maximaal 5% van het vermogen verschoven worden. Bij een dekkingsgraad van 105% kan hiermee ook worden voldaan aan de laatste doelstelling: het compenseren van slapers en pensioengerechtigden voor de lage premiedekkingsgraden in de recente jaren. De verschuiving van pensioenvermogen blijft ruim binnen de 5%.

Dekkingsgraden boven de 105%

Bij hogere dekkingsgraden is het mogelijk om iedereen bij overgang meer dan voorziening mee te geven. Daarmee kunnen we voor pensioengerechtigden de uitkeringen verhogen na de transitie. In de tabel is uitgegaan van het in stand houden van de huidige onvoorwaardelijke indexaties van pensioengerechtigden, zodat je het niveau van uitkeringen voor en na transitie met elkaar kan vergelijken. Daarbij is zowel bij lage als bij hoge dekkingsgraden uitgegaan van het 3 jaar spreiden van het overschot (of tekort bij lagere dekkingsgraden) na transitie.

6.9 Conclusie met betrekking tot de totale evenwichtigheid van de transitie

Het bestuur van SPF heeft in samenspraak met DPF en het VO een uitgebreid traject afgelegd om te komen tot een evenwichtige wijze van invaren in het nieuwe pensioenstelsel. Gekozen is voor een flexibele premieregeling, omdat deze het beste past bij de fysiotherapeuten van, voor en door wie de pensioenregeling wordt uitgevoerd. Een beperkte mate van solidariteit is gewenst (het delen van de risico's van overlijden, arbeidsongeschiktheid en lang leven), maar intergenerationele herverdeling past daarbij niet. Alleen in de collectieve uitkeringsfase delen pensioengerechtigden alle risico's met elkaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van een risicodelingsreserve die een stabiliserend effect zal hebben op de variabele pensioenuitkering.

Op basis van:

- de evenwichtige bestuursbesluiten die in het verleden zijn genomen,
- de bijzonderheid dat er bij SPF door de onvoorwaardelijke toeslag van 2% geen sprake is van overdracht van middelen van jong naar oud, en
- de uitkomsten van netto profijtberekeningen

heeft het bestuur kunnen concluderen dat compensaties voor groepen van deelnemers bij de overgang naar de flexibele premieregeling niet nodig zijn.

De enige uitzondering hierop betreft de verhoging van de aanspraken van de slapers en pensioengerechtigden met 1% bij een dekkingsgraad boven de 105% uit de buffer. Dit is een symbolische bijdrage i.v.m. het nadeel dat ze een aantal jaar hebben gehad van de lage premiedekkingsgraad waarvan de toenmalige actieven hebben geprofiteerd.

Door gedurende het transitietraject telkens terug te vallen op de in het begin van het proces geformuleerde uitgangspunten / overtuigingen en door genomen besluiten hieraan te toetsen, heeft SPF een evenwichtige, nieuwe pensioenregeling kunnen ontwikkelen, die voldoet aan de kernwaarden van de beroepsgroep.

Met de huidige dekkingsgraad en rente kan SPF evenwichtig invaren binnen de daarvoor gestelde kaders. Het invaarkader is robuust voor verschillende dekkingsgraden. De evenwichtigheid komt niet in het geding bij een andere dekkingsgraad. De rente heeft wel impact op evenwichtig invaren. De risico's zitten hiervoor duidelijk aan de bovenkant. Bij een lage rente worden de verschillen tussen jonge slapers en jonge actieven groter. Dit komt doordat een lage rente leidt tot een relatief hoge technische voorziening voor jongere deelnemers. Jonge slapers profiteren hiervan meer dan jonge actieven, omdat dit positieve effect bij actieven verwatert door de toevoeging van nieuwe pensioenopbouw. Daarnaast is het voordeel dat jongeren in het huidige stelsel ervaren door de doorsneesystematiek groter bij een lage rente. Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zorgt dit voor een drukkend effect op zowel de netto profijt-effecten als de pensioenverwachting.

Zoals eerder aangegeven, monitort het bestuur de ontwikkeling van de rentetermijnstructuur. Bij hogere rentes of een verandering van de vorm van de rentetermijnstructuur ontstaan niet-evenwichtige effecten. Dit wordt beperkt zichtbaar bij de doorrekening van de RTS per 30 juni 2023 +

200 basispunten. De verhouding in de inkoop van de pensioenaanspraken bij deze rente tussen de leeftijden 30 en 60 is net iets kleiner dan 2:3. Als deze verhouding kleiner wordt dan 2:3 zullen DPF en SPF om tafel gaan om te bespreken welke gevolgen het ontbreken van evenwichtigheid voor de transitie heeft. Ook bij een dekkingsgraad van onder de 90%, waarbij eerst gekort moet worden, gaan SPF en DPF weer om de tafel. Op basis van de geformuleerde doelstellingen en rekening houdend met de maatstaven en bandbreedtes zullen SPF en DPF dan moeten vaststellen of c.q. op basis van welke uitgangspunten de transitie alsnog beheerst, integer en evenwichtig kan plaatsvinden.

6.10 Transitie FTK

Het bestuur van SPF heeft meerdere keren gesproken over het al dan niet gebruik maken van het transitie FTK. In december 2022 is dit, in aanwezigheid van het bestuur van DPF, besproken aan de hand van A220786 - 656035 - SPF - Overwegingen transitie-FTK. Het bestuur van SPF heeft deze zienswijze vervolgens bevestigd in de bestuursvergadering van maart 2023.

Veel pensioenfondsen maken gebruik van het Transitie FTK vanwege de mogelijkheid om extra te kunnen indexeren. SPF kiest ervoor, in tegenstelling tot de meeste pensioenfondsen die extra hebben geïndexeerd, zo snel mogelijk over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Een prudente omgang met de reserves vindt het bestuur hierbij gepast. Als er op het moment van overgaan nog reserves zijn, worden deze namelijk direct uitgedeeld. Een van de credo's van SPF luidt immers: "uitdelen wanneer het kan, verlagen wanneer het moet".

Een belangrijke overweging is ook dat pensioengerechtigden bij SPF dankzij de onvoorwaardelijke indexatie van 2%, en in tegenstelling tot de pensioengerechtigden bij fondsen die hoge indexaties uitkeren, geen indexatieachterstand hebben. De indexatie ambitie van 3% is weliswaar niet gehaald, maar de uitkeringen van de pensioengerechtigden zijn jaarlijks wel met 2% gestegen. Bovendien kent SPF geen beleid voor inhaalindexatie.

Bij gebruikmaking van het Transitie FTK is SPF verplicht een overbruggingsplan op te stellen waarmee op basis van netto profijt vóóraf en achteraf onderbouwd moet worden wat het verwachte en werkelijke effect is. Hier staan extra inspanningen tegenover, zoals het uitvoeren van netto profijt berekeningen. Gebruikmaken van het Transitie FTK brengt bovendien een grotere kans op verlagingen met zich mee, omdat het overbruggingsplan maar op een zeer korte periode betrekking heeft.

Alles overwegende heeft het bestuur besloten geen gebruik te maken van het Transitie FTK.

7 Transitieplan

7.1 Besluitvormingsproces transitieplan

Zoals eerder aangegeven hebben SPF en DPF (samen met het VO) het transitietraject volledig gezamenlijk doorlopen. Het transitieplan dat net als het implementatieplan een resultante is van het doorlopen traject, is dan ook grotendeels in gezamenlijkheid opgesteld. SPF heeft in de haalbaarheidsanalyse als beschreven in paragraaf 4.2.1 getoetst en vastgesteld dat het transitieplan voldoet aan de wettelijke voorschriften en uitvoerbaar is en kan het transitieplan van DPF volledig volgen. De regeling sluit aan bij de uitgangspunten die het bestuur van SPF vooraf had geformuleerd.

Als gevolg van het gezamenlijke traject hebben zowel SPF als DPF kunnen vaststellen, dat partijen het besluitvormingsproces rondom het transitieplan zorgvuldig hebben doorlopen. Dat geldt zowel voor de besluitvorming zelf als voor het op het juiste moment betrekken van de betreffende gremia.

In het transitieplan is een toelichting gegeven op de wijze waarop het bestuur de evenwichtigheid heeft vastgesteld en welke rol bestuursorganen (VO en sleutelfunctiehouders) daarbij hebben gespeeld.

De financiële grenzen (in termen van dekkingsgraad) zijn eveneens in het transitieplan opgenomen en in overeenstemming met het door SPF geformuleerde evenwichtigheidskader. Voor de afspraken en werkwijze als de financiële grenzen van het transitieplan worden overschreden (concreet en haalbaar plan) geldt dat partijen hebben vastgesteld dat als de dekkingsgraad onder de 90% zakt, er economisch gezien iets heftigs aan de hand moet zijn. De besturen van SPF en DPF treden dan in elk geval met elkaar in overleg. Het gesprek dat dan tussen SPF en DPF plaatsvindt zal gaan over wat de beste strategie is in de gegeven economische situatie. Een mogelijkheid is om de transitiedatum te verschuiven of om te korten vóór de transitie om de invaardekkingsgraad te halen.

De toets op de uitvoerbaarheid van het transitieplan is vastgelegd in de haalbaarheidsanalyse zoals opgenomen in hoofdstuk 4.2 van dit implementatieplan.

7.2 Projectierendement

Als default in de uitkeringsfase wordt een gelijkblijvende uitkering aangekocht (dat wil zeggen een uitkering berekend met een projectierendement gelijk aan de risicovrije rentetermijnstructuur (RTS)). Deelnemers kunnen zelf de keuze maken voor een 1% dalende uitkering³ (een uitkering berekend met een projectierendement gelijk aan de RTS +1%). Uit het risicobereidheidsonderzoek lijkt naar voren te komen dat de deelnemers op de korte termijn minder bereid zijn om de consequenties van een hoge risicobereidheid te dragen dan op lange termijn. Kijkend naar de kwantitatieve uitvraag via de pension builder, dan neemt het bestuur echter waar dat een groot deel van de deelnemers (91%) kiest voor een risicoprofiel dat past bij een variabel pensioen. Om tegemoet te komen aan deze verliesaversie is ervoor gekozen om de uitkering standaard te berekenen op de RTS. In verwachting zal de uitkering stijgen in de tijd doordat er naar verwachting meer rendement gehaald wordt op de beleggingen dan de risicovrije rente. Dit is enigszins vergelijkbaar met de nu standaard stijgende uitkering door onvoorwaardelijke indexaties. Dit is gelijktijdig met de ALM-studie voor de opbouwfase met het VO en DPF besproken.

7.3 Collectief Variabel Pensioen

De Flexibele Premiereregeling (FPR) maakt het mogelijk te kiezen voor een individuele of een collectieve variabele uitkering. Binnen de collectieve variabele uitkering worden meer risico's gedeeld dan bij een individuele variabele uitkering. Het betreft naast het delen van beleggings- en renterisico, ook het risico van een verandering in de levensverwachting. Het delen van deze risico's

³ De 1% dalend variabele uitkering is afhankelijk van fiscale vereisten; bij hogere rentestanden kan dit ertoe leiden dat de daling geen 1% kan zijn. Er is dus sprake van een daling op basis van maximaal 1%.

maakt de uitkeringen voor pensioengerechtigden stabiel. Bovendien kan door de risico's samen te delen risicovoller worden belegd, ook op oudere leeftijd, wat naar verwachting leidt tot een hoger pensioen. Daarnaast biedt een collectieve fase betere en efficiëntere beleggingsmogelijkheden. Ook biedt een collectieve variant voor alle pensioengerechtigden spreidingsmogelijkheden en leidt de systematiek tot gelijke aanpassingen in de hoogte van uitkeringen wat beter uitlegbaar is en past bij de solidariteit binnen de groep pensioengerechtigden in de ogen van SPF en DPF.

7.4 Spreidingsperiode en hoogte risicodelingsreserve

SPF heeft ervoor gekozen om de spreidingsperiode te bekijken in combinatie met de risicodelingsreserve. Uit onderzoek van Ortec is immers gebleken dat met een beperkte risicodelingsreserve, de schokken op de pensioenuitkering behoorlijk gedempt kunnen worden. Als schokken beperkter van omvang zijn, dan kan de spreidingsperiode van die schokken relatief kort worden gehouden. Dit is in de ogen van SPF en DPF beter uitlegbaar aan de deelnemer. De keuze tussen de spreidingstermijn gaat tussen 3 en 5 jaar, zoals ook al in een vroeg stadium met het VO en DPF is besproken.

Een belangrijk uitgangspunt van SPF en DPF bij de voorbereiding op de transitie luidde: “Nog één keer herverdelen, om daarna te stoppen met herverdelen”. Op grond van dit uitgangspunt hebben partijen gekozen voor de FPR, ook omdat deze regeling geen verplichte reserves kende. Toen uit de consultatiewetgeving bleek dat voor verplicht gestelde beroepspensioenfondsen wel een reserve van toepassing moest zijn, hebben SPF en DPF de keuze voor het flexibele contract heroverwogen. Dit heeft niet tot een andere keuze geleid, maar wel tot het bijgestelde uitgangspunt dat de reserve dan zo klein mogelijk moest worden.

De focus is er daarom vervolgens op gericht om intergenerationele herverdeling zoveel mogelijk te voorkomen. Om dit te bereiken heeft SPF intensief gelobbyd voor een risicodelingsreserve die alleen wordt ingezet om nominale verlagingen in de uitkeringsfase te beperken of zelfs voorkomen. Toen dat gelukt bleek, hebben SPF en DPF, met instemming van het VO, gekozen om een zo beperkt mogelijke risicodelingsreserve te hanteren “van, voor en door pensioengerechtigden”.

De risicodelingsreserve in de FPR van SPF is alleen voor pensioengerechtigden en wordt in de toekomstige “run” situatie betaald uit het inkooptarief bij aankoop van de pensioenuitkering. De risicodelingsreserve is alleen bedoeld om nominale verlagingen zoveel mogelijk te voorkomen. De risicodelingsreserve wordt gebruikt om eventuele verlagingen toekomstbestendig voor alle generaties te repareren; het gaat hier om de zogenoemde “ongedekte methode”.

Daarom zijn in een ALM studie varianten van 3 en 5 jaar spreidingsperiode doorgerekend in combinatie met een risicodelingsreserve ter hoogte van 0%, 3% en 5% van het vermogen in het collectief variabel pensioen. Een spreiding van bijvoorbeeld 10 jaar heeft het bestuur als onwenselijk beoordeeld, omdat het verband tussen de economische omstandigheden die leiden tot verlagingen en de verlagingen zelf dan verloren gaan als gevolg van het verstrijken van de tijd.

Uiteindelijk heeft het bestuur gekozen voor 3 jaar spreiden en een risicodelingsreserve van 3%. 3 jaar spreiden leidt in verwachting tot een aanzienlijk gunstigere koopkrachtontwikkeling dan 5 jaar spreiden. Op basis van retrospectief onderzoek vanaf 1990 is gebleken dat een risicodelingsreserve van 3% bij 3 jaar spreiden historisch gezien in een beperkt aantal jaren tot een verlaging van de uitkering zou hebben geleid. Terugkijkend heeft het bestuur de conclusie getrokken dat deze verlagingen uitlegbaar zouden zijn geweest, gegeven de economische ontwikkelingen op dat moment. Een hogere risicodelingsreserve (van bijvoorbeeld 5%) zou betekenen dat een deelnemer bij aanvang meer afdraagt aan de risicodelingsreserve. Een lager percentage heeft de volgende voordelen:

- Hoe lager de vulling van de risicodelingsreserve des te hoger de initiële uitkering.

- Hoe lager de vulling van de risicodelingsreserve, hoe minder herverdelingseffecten tussen jong en oud gepensioneerden.

Voor de initiële hoogte van de risicodelingsreserve is ook het gewenste doelniveau 3%, indien de dekkingsgraad bij invaren voldoende hoog is. Hierdoor kan de uitkering bij aanvang meer omhoog bij voldoende dekkingsgraad en zijn er kleinere herverdelingseffecten dan bij een hogere initiële vulling van de reserve. Bovendien sluit dit aan bij het beleid in het nieuwe contract, wat de uitvoering en uitlegbaarheid eenvoudiger maakt.

Gelet op de doelstelling van de risicodelingsreserve (het zoveel mogelijk voorkomen van nominale verlagingen en het opvangen van schokken in de uitkeringsfase) dienen de beleggingen in de risicodelingsreserve bij voorkeur veilig te zijn, in rendement niet te veel te verschillen van het rendement van de CVP, maar hiermee wel een lage correlatie te hebben. SPF heeft daarom besloten op basis van een kwalitatieve en stochastische analyse de risicodelingsreserve in te vullen met 100% deelname in de Module Rente.

Het bestuur zal de risicodelingsreserve jaarlijks monitoren. Het beleid wordt elke 5 jaar geëvalueerd, tenzij de monitoring eerder leidt tot evaluatie. Bij evaluatie wordt ook doorgerekend of de risicodelingsreserve nog binnen de risicohouding past. Afhankelijk van de impact van eventuele wijzigingen van het beleid, wordt de aanpassing van de risicodelingsreserve afgestemd met de daarvoor bestemde gremia.

7.5 Invaren

Bij het vaststellen van de bouwstenen van de nieuwe pensioenregeling hebben SPF en DPF vastgesteld dat invaren van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in het nieuwe stelsel voor SPF essentieel was:

- Onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is het afschaffen van de doorsneesystematiek. Deze systematiek wijzigt in een vlakke premie. Landelijk leidt dit tot lagere pensioenvooruitzichten voor een specifieke groep deelnemers, die moet worden gecompenseerd. Vanuit de wetgeving moet een zodanig adequate compensatie plaatsvinden dat de vervangingsratio's voor en na aanpassing minimaal gelijkwaardig zijn. Het invaren kan leiden tot verbeterde pensioenvooruitzichten. De gelijktijdige overgang naar het nieuwe stelsel en invaren wordt een dubbele transitie genoemd. Deskundigen spreken van een driedubbele transitie als sprake is van een lage premiedekkingsgraad. Bij SPF kan compensatie van deelnemers voor de transitie enkel plaatsvinden via invaren. Er is geen werkgever die de compensatielast kan dragen.
- Op het moment dat SPF zou besluiten om niet in te varen, dan blijven de opgebouwde aanspraken tot de transitiedatum achter in het oude FTK-stelsel. Gezien de (destijds) lage dekkingsgraad van SPF leidt dit voor de in het huidige stelsel opgebouwde aanspraken mogelijk tot verlagingen.
- Gevolg van het niet invaren is dat er twee afzonderlijke regelingen geadministreerd zijn en beheerd moeten worden. Dit leidt tot een groter risico op fouten, een ingewikkelder beleggingsbeleid, een zwaardere bestuurlijke last, ingewikkeldere communicatie en daarmee tot een verhoging van de uitvoeringskosten. Niet invaren zorgt er ook voor dat het bijna niet meer mogelijk is het fonds elders onder te brengen.

Op basis van deze argumenten heeft het bestuur van SPF geconcludeerd dat invaren in het voordeel is van alle belanghebbenden van SPF.

7.6 Wijze van vaststelling evenwichtigheid transitieplan

Het bestuur van SPF heeft de evenwichtigheid van de transitie beoordeeld aan de hand van het evenwichtigheidskader. Het bestuur heeft de transitie in zijn geheel beoordeeld en evenwichtig bevonden.

Het evenwichtigheidskader is ook gedeeld met het verantwoordingsorgaan (VO) en de visitatiecommissie (VC):

- Op basis van het evenwichtigheidskader en kwantitatieve onderbouwingen is het VO tot het definitieve oordeel gekomen dat alle geledingen van het VO positief kunnen adviseren over het door het bestuur uitgewerkte evenwichtigheidskader en over het op basis van dit evenwichtigheidskader invaren naar de flexibele premieregeling.
- De VC heeft vastgesteld dat sprake is van een beheerste en integere bedrijfsvoering en dat een (zeer) zorgvuldig proces is doorlopen. De VC geeft daarmee de goedkeuring aan het invaarverzoek (met daaraan de voorwaarde verbonden dat de IT-administratie aan alle vereisten moet voldoen en dat dit is goedgekeurd door het bestuur).

7.7 Wijze van vaststelling uitvoerbaarheid transitieplan

SPF heeft gedurende het gehele traject korte lijnen gehad met de pensioenuitvoeringsorganisatie als het gaat om de inrichting van de pensioenregeling:

- Daar waar dit passend is binnen de opdracht van DPF, heeft SPF zoveel als mogelijk aangesloten bij de standaard van APS. Dat brengt voordelen met zich mee bij de inregeling in het nieuwe pensioenadministratiesysteem, levert daardoor kostenvoordelen op en vergemakkelijkt eventuele toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld een fusie met (een) ander(e) beroepspensioenfond(s)).
- Daar waar SPF in het verleden al afwijkende afspraken had gemaakt met APS die van belang zijn voor de pensioenadministratie en -communicatie van een beroepspensioenfonds heeft SPF vastgehouden aan deze afspraken.

In alle gevallen heeft SPF de flexibele premieregeling ingericht conform de wensen van de deelnemersvereniging (DPF).

7.8 Financiële grenzen transitieplan

Op basis van de verplichte, wettelijke onderdelen, randvoorwaarden en doelen van DPF en SPF is een zogenoemd evenwichtigheidskader vastgesteld:

Dekkingsgraad bij invaren	90%	95%	100%	105%	110%	115%	120%	125%	130%	135%	140%
MVEV	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Operationele reserve	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Voorziening voor liquidatiekosten	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
DG na vullen reserves	88%	93%	98%	102%	107%	112%	117%	122%	127%	132%	137%
Standaardmethode	Spreidingsperiode 10 jaar										
Actieven											
45 jaar en jonger	86%	92%	98%	103%	108%	114%	120%	126%	131%	137%	143%
55 jaar	86%	92%	98%	103%	108%	114%	120%	125%	131%	137%	142%
65 jaar	89%	94%	98%	102%	106%	111%	115%	119%	124%	128%	133%
Slapers											
45 jaar en jonger	86%	92%	98%	104%	110%	115%	121%	127%	133%	138%	144%
55 jaar	86%	92%	98%	104%	109%	115%	121%	127%	132%	138%	144%
65 jaar	89%	94%	98%	103%	107%	112%	116%	121%	125%	129%	134%
Pensioengerechtigden	exclusief eventuele toekomstige bijdrage aan risicodelingsreserve										
allen	90%	94%	98%	103%	107%	112%	116%	120%	125%	129%	133%
Uitkering bij start	Afgezien van omzetting onvoorwaardelijke indexatie.										
	Uitkering gespreid over 3 jaar en indien nodig aangevuld tot 100% vanuit Risicodelingsreserve										
pensioengerechtigden	100%	100%	100%	100%	101%	102%	104%	105%	107%	108%	109%

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

- De dekkingsgraad bij invaren moet minimaal 90% zijn om in te kunnen varen. Indien de dekkingsgraad lager is dan 90% en SPF toch wil invaren dan is een korting nodig. In een dergelijke situatie zal SPF niet invaren, maar eerst met DPF in overleg treden om het vervolgtraject vast te stellen.
- Iedere deelnemer moet na afzondering van het MVEV en de operationele reserve, minimaal 95% van de uitkomst van de standaardregel meekrijgen. Indien deze uitkomst boven de technische voorziening ligt, dan geldt de technische voorziening als ondergrens.
- Als een deelnemer bij invaren meer dan de technische voorziening meekrijgt, mag geen andere deelnemer minder dan de technische voorziening meekrijgen.
- Bij een dekkingsgraad tot 105% mag maximaal 5% van de voorziening gebruikt worden voor van de risicodelingsreserve. Deze aanwending moet opgenomen zijn in het transitieplan en moet goedkeuring krijgen van het verantwoordingsorgaan.
- Bij een dekkingsgraad (na vulling van de risicodelingsreserve) tussen de 105% en 110% mag 5% van het vermogen verschoven worden.
- Bij een dekkingsgraad (na vulling van de risicodelingsreserve) boven de 110% kunnen de uitkomsten worden aangepast, mits iedere deelnemer tenminste 95% van de standaardregel meekrijgt.
- Vervolgens mag het pensioenfonds afwijken van de uitkomsten uit de standaardmethode indien dit nodig is om gelijke aanpassingen van pensioenuitkeringen mogelijk te maken.

Naast de ondergrens van een dekkingsgraad van 90%, waarin het bestuur zich kan vinden, heeft het bestuur geconcludeerd dat bij hogere rentes of een verandering van de vorm van de rentetermijnstructuur compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek immers alsnog gewenst zijn. In de netto profijt berekeningen wordt dit beperkt zichtbaar bij de doorrekening van de RTS per 30 juni 2023 + 200 basispunten. De verhouding in de inkoop van de pensioenaanspraken bij deze rente tussen de leeftijden 30 en 60 is net iets kleiner dan 2:3. Als deze verhouding kleiner wordt dan 2:3 gaan DPF en SPF daarom opnieuw om tafel om eventuele compensatie voor het afschaffen

van de doorsneesystematiek te bespreken. Dit is dus eerder dan dat de grens van het scenario RTS per 30 juni 2023 + 200 basispunten wordt bereikt.
